

Kontraktsdokument for Løkeberggrenda



Kjøpekontraktens vedlegg:

Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha mottatt og satt seg inn i ovennevnte dokumenter, samt hatt anledning til å stille spørsmål vedr. disse.

1. Bustadoppføringslova
2. Plantegning av leiligheten (eget vedlegg)
3. Grunnbokutskrift
4. Sameiebudsjet
5. Digital beboerportal – generelle vilkår
6. Salgsoppgave (prospekt) med vedlegg:
 - Etasjeplaner
 - Salgstegninger
 - Leveransebeskrivelse
 - Nøkkelopplysninger og nøkkeltall
 - Vedtekter
 - Utomhusplan
 - Reguleringsplan
7. Rammegodkjennelse (eget vedlagt)
8. Garasjekontrakt (eget vedlegg)

Sted/dato:

Innhold

Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).	3
Kapittel I. Verkeområde m.m.	3
§ 1. Verkeområde	3
§ 1a. Burettslagbustader	4
§ 2. Partane	4
§ 3. Avtalen	4
§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving	4
§ 5. Vågnaden for sending av melding	4
§ 6. Skadebotansvar	4
§ 6a. Bruk av elektronisk kommunikasjon	5
Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren	5
§ 7. Utføring og materialar	5
§ 8. Plikt til fråråding	5
§ 9. Endringar og tilleggsarbeid	5
§ 10. Tida for utføring	6
§ 11. Tilleggsfrist	6
§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen	6
§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtaler	7
§ 14. Overtaking	7
§ 15. Overtakingsforretning	8
§ 16. Seinare synfaring	8
Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side	8
§ 17. Forseinking	8
§ 18. Dagmulkt	9
§ 19. Skadebot	9
§ 20. Heving	9
§ 21. Verknadene av heving	10
§ 22. Skadebot ved heving	10
§ 23. Lemping av ansvar	10
§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag	10
Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting	11

§ 25. <i>Mangel</i>	11
§ 26. Manglande opplysningar	11
§ 27. Urette opplysningar	11
§ 28. Tidspunktet for mangelsvurderinga	11
§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel.....	11
§ 30. Reklamasjon.....	12
§ 31. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag	12
§ 32. Retting av mangel og skade	12
§ 33. Prisavslag	12
§ 34. <i>Heving</i>	13
§ 35. Skadebot ved mangel	13
§ 36. Omfanget av ansvaret	13
§ 37. Krav mot bakre ledd	14
§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysningar	14
§ 39. Rettsmangel	14
§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband	14
Kapittel V. Forbrukarens yting.....	15
§ 41. Fastsetjing av vederlaget	15
§ 42. Justering for endringar og tilleggsarbeid	15
§ 43. Tilleggsvederlag i andre tilfelle	15
§ 44. Vederlag for førebuing m.m.....	15
§ 45. Vågnaden for ytinga	15
§ 46. Betalingstid	16
§ 47. Forskotsbetaling.....	16
§ 48. Rekning, sluttoppgjær og gebyr	16
§ 49. Deponering av omtvista vederlag	17
§ 50. Forbrukarens medverknad.....	17
§ 51. Tilleggsfrist	17
Kapittel VI. Avbestilling	17
§ 52. Avbestilling.....	17
§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn	18
§ 54. Avbestillingsgebyr	18
Kapittel VII. Forseinking på forbrukarens side	18
§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking	18

§ 56. Stansing av arbeidet	19
§ 57. Heving	19
§ 58. Verknadene av heving	19
§ 59. Rente og skadebot for rentetap	19
Kapittel VIII. Langvarig avbrot	20
§ 60. Langvarig avbrot	20
Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent	20
§ 61. Verkeområdet for kapitlet	20
§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil	20
§ 63. Reklamasjon	20
Kapittel X. Tvisteløysing	21
§ 64. Tvisteløysing	21
Kapittel XI. Endringar i andre lover. Ikraftsetjing	21
§ 65. Endringar i andre lover	21
§ 66. Ikraftsetjing	21

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Jf. lover 16 juni 1989 nr. 63 (handverkartenerster), 3 juli 1992 nr. 93 (fast eigedom).

Kapittel I. Verkeområde m.m.

§ 1. Verkeområde

Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar

- a. avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og
- b. avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida. Likt med dette skal reknast avtale om vidaresal av slik rett.

Kapittel IX gjeld avtalar mellom ein konsulent og ein forbrukar om planlegging av oppføring av bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring.

Oppføring av ny eigarbustad omfattar her i lova òg oppføring av fritidshus. Eigarseksjon vert rekna som eigarbustad. Full ombygging skal reknast likt med oppføring.

Endra med lover 21 juni 2002 nr. 34 (i.kr. 1 juli 2002), 10 des 2010 nr. 74 (i.kr. 1 juli 2011, etter res. 10 des 2010 nr. 1570, med verknad for avtalar om vidaresal inngått etter 1 juli 2011).

§ 1a. Burettslagbustader

Reglane om rett til fast eigedom med eigarbustad, jf. § 1 første ledd bokstav b, gjeld tilsvarande for avtale mellom forbrukar og bustadbyggjelag eller annan yrkesutøvar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, dersom arbeid som er omfatta av avtalen, ikkje er fullført på avtaletida. Overføring eller teikning av andel i burettslaget skal reknast som heimelsoverføring dersom burettslaget har heimel til eigdommen.

Avtalen skal opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i burettslaget og den samla summen av desse beløpa.

Burettslaget kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal eller felles rettar eller plikter elles.

Føyd til med lov 6 juni 2003 nr. 39 (ikr. 15 aug 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 603), endra med lov 3 sep 2010 nr. 54 (ikr. 1 jan 2011, etter res. 3 sep 2010 nr. 1238).

§ 2. Partane

Som forbrukar vert rekna ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd.

Lova gjeld berre dersom entreprenøren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd mot godtgjersle står for yting som er ledd i oppføring av ny eigarbustad.

Endra med lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).

§ 3. Avtalen

Det kan ikkje avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er dårlegare for forbrukaren enn det som følgjer av føresegnene i lova her.

Partane kan krevje at avtalen vert sett opp skriftleg.

§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving

Føresegnene i lova her gjeld berre så langt ikkje anna følgjer av lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

For avtale om rett til fast eigedom som ikkje er omfatta av § 1 første ledd bokstav b, gjeld lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom eller lov av 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste om ikkje anna går fram av lova her.

§ 5. Vågnaden for sending av melding

Dersom ein part gjev melding i samsvar med lova og sender ho på forsvarleg måte, og ikkje anna framgår, kan sendaren gjere gjeldande at meldinga er gjeven i tide sjølv om ho vert forseinka eller på annan måte ikkje kjem fram slik ho skulle.

§ 6. Skadebotansvar

Føresegnene om skadebotansvar for entreprenøren og konsulenten gjeld ikkje for tap som følgje av personskade eller for tap i næring. For slikt tap og for tap som ikkje er følgje av avtalebrot, gjeld allmenne skadebotreglar.

Ein entreprenør kan ikkje fråskrive seg ansvar for tap utanfor næring som forbrukaren lir på grunn av tingskade.

§ 6a. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i lova her om at avtale eller melding mv. skal vere skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon om forbrukaren uttrykkeleg har godtatt dette.

Føyd til med lov 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475).

Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren

§ 7. Utføring og materialar

Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren.

Entreprenøren skal halde dei materialane som trengst, om ikkje anna går fram av avtalen eller tilhøva. Materialane skal ha vanleg god kvalitet med mindre annan kvalitet er avtalt.

§ 8. Plikt til fråråding

Må entreprenøren ut frå sin fagkunnskap sjå at forbrukaren ikkje er tent med å få arbeidet utført etter avtalen, skal entreprenøren seie frå om det. Arbeidet skal stansast til entreprenøren får samrådd seg med forbrukaren, dersom det må reknast å gagne forbrukaren.

Har entreprenøren ikkje sagt frå til forbrukaren eller ikkje stansa arbeidet i samsvar med første ledd, skal entreprenørens krav på vederlag ikkje vere større enn det sannsynleg ville ha vore dersom entreprenøren hadde oppfylt plikta etter første ledd. Entreprenøren kan likevel få dekt kostnader ut over dette så langt det er rimeleg, når berre det samla vederlaget ikkje blir større enn verdien det utførte har for forbrukaren.

§ 9. Endringar og tilleggsarbeid

Forbrukaren kan krevje endringar i arbeidet og påleggje entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som står i samanheng med den ytinga som er avtalt, og som ikkje i omfang eller karakter skil seg vesentleg frå denne ytinga.

Forbrukaren kan likevel ikkje krevje endringar eller tilleggsarbeid dersom dette ville føre til ulemper for entreprenøren som ikkje står i høve til forbrukarens interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.

Det kan avtalast på førehand at forbrukaren ikkje kan krevje endringar eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 prosent eller meir.

Entreprenøren kan krevje at tinging på endringar eller tilleggsarbeid blir gjord skriftleg.

Føresegner om vederlaget i samband med endringar eller tilleggsarbeid står i § 42.

§ 10. Tida for utføring

Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelseoverføring.

Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknytning til arbeidet.

Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot.

§ 11. Tilleggsfrist

Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom

- a. forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet,
- b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller
- c. arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd.

Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde omstenda har medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvast til ei anna årstid.

Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging.

§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen

Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Ei slik plikt gjeld likevel ikkje dersom ein på avtaletida kan rekne med at vederlaget ikkje vil overstige to gonger grunnsommen i folketrygda.

Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til ti prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande på eit seinare tidspunkt enn i samband med overtakinga, kan garantisommen likevel vere fem prosent av vederlaget.

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), skal garantien gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til fem prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande før overtakinga, kan

garantisummen likevel vere tre prosent av vederlaget. Dessutan gjeld § 47 andre og tredje ledd om garanti for forskotsbetaling.

Ved avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, jf. § 1 a, skal garantisummen i andre og tredje ledd reknast på grunnlag av den samla summen av kontantvederlag og andel fellesgjeld i burettslaget.

Garantisten kan ikkje ta atterhald om avgrensing av ansvaret på grunn av manglande premiebetaling eller anna mishald frå entreprenørens side. Det kan ikkje setjast frist for melding til garantisten om krav som er gjorde gjeldande i tide overfor entreprenøren. Har forbrukaren svart på førespurnad frå garantisten om kva krav som er gjorde gjeldande innan fristane, gjeld ansvaret berre krav som er nemnde i svaret frå forbrukaren.

Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan ikkje ta atterhald som avgrensar denne retten.

Garanti skal gjevast i form av sjølvskuldgaranti eller tilsvarande frå ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg. Likt med garanti skal reknast deponering av pengesum i finansinstitusjon som nemnd i første punktum på tilsvarande vilkår.

Til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.

Endra med lov 10 des 2010 nr. 74 (ikr. 1 juli 2011, etter res. 10 des 2010 nr. 1570, med verknad for garantiavtalar inngått etter 1 juli 2011).

§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar

Dei krava til entreprenørens yting som følgjer av paragrafen her, gjeld for avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), og elles når entreprenøren står for det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Dersom eigedomsdelar eller faste innretningar som trengst for å ta bustaden i vanleg bruk, ikkje høyrer med til det entreprenøren skal yte, skal desse delane eller innretningane nemnast særskilt i avtaledokumentet eller i eit vedlegg. Er ikkje det gjort, skal slike delar og innretningar reknast å høyre med til det entreprenøren skal yte, med unntak for delar og innretningar som forbrukaren måtte skjønne ikkje høyrde med.

Er ikkje anna avtalt, skal entreprenøren syte for tilkomst til byggjeplassen, for opplagsplass, byggjestraum, oppvarming og snørydding i byggjetida, fjerning av restar og avfall og for liknande tiltak som trengst for fullføringa av arbeidet.

Er ikkje anna avtalt, skal entreprenøren halde arbeid på forbrukarens eigedom trygda fram til overtakinga. Trygdeavtalen skal òg omfatte materialar som er tilførte eigedomen. Forbrukarens rettar som medtrygda etter lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 7-1 andre ledd kan ikkje fråvikast i trygdeavtalen. Til det er dokumentert at det ligg føre trygd i samsvar med føresegnene her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.

§ 14. Overtaking

Overtaking skjer ved overtakingsforretning.

Er arbeidet fullført, og forbrukaren har flytta inn i bustaden, er ytinga overteke sjølv om det ikkje er halde overtakingsforretning.

Ved overtakinga

- a. går vågnaden for ytinga over frå entreprenøren til forbrukaren, jf. § 45,
- b. tek reklamasjonsfristane til, jf. § 30,
- c. stansar eventuell dagmulkt, jf. § 18,
- d. får entreprenøren krav på sluttoppgjer, jf. § 46.

§ 15. Overtakingsforretning

Etter at entreprenøren har meldt frå til forbrukaren om når arbeidet blir fullført, kan kvar av partane med minst sju dagars varsel kalle inn til overtakingsforretning med synfaring av entreprenørens yting.

Let den eine parten vere å møte til overtakingsforretning utan gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakingsforretning åleine. Er det forbrukaren som uteblir etter innkalling frå entreprenøren, gjeld dette likevel berre dersom det i skriftleg innkalling er gjort merksam på

- a. føresegna i første punktum i leddet her,
- b. føresegnene i § 30 andre ledd om at manglar som forbrukaren burde ha oppdaga ved overtakingsforretninga, må gjerast gjeldande så snart råd er, og
- c. at overtaking har dei verknader som elles er nemnde i § 14 tredje ledd.

Forbrukaren kan nekte å overta ytinga dersom det ligg føre mangel som gjev rimeleg grunn til nektinga.

Ved overtakingsforretninga bør det førast protokoll som begge partane får eit underskrive eksemplar av.

§ 16. Seinare synfaring

Kvar av partane kan krevje at det blir halde ei synfaring av entreprenørens yting når det er gått om lag eitt år etter overtakinga.

Vert synfaring etter krav frå entreprenøren ikkje gjennomført fordi forbrukaren let vere å medverke, gjeld føresegnene i § 30 tredje ledd likevel, dersom forbrukaren i skriftleg melding på førehand er gjort særskilt merksam på dette.

Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side

§ 17. Forseinking

Ytinga er forseinka dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11. Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført eller heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje.

Er ytinga forseinka, kan forbrukaren

- a. krevje dagmulkt etter § 18,
- b. heve avtalen etter § 20,

- c. krevje skadebot etter § 19 eller § 22,
- d. halde attende vederlag etter § 24.

Dersom entreprenøren ikkje i tide oppfyller andre plikter etter avtalen, gjeld føresegnene om forseinking tilsvarande så langt dei høver, likevel ikkje føresegnene om dagmulkt.

§ 18. Dagmulkt

Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer.

Dersom ikkje høgare mulkt er avtalt, skal dagmulkta vere 1 promille av det samla vederlaget entreprenøren skal ha. Omfattar avtalen eigedomsrett til grunnen, skal lågaste sats likevel vere 0,75 promille. Dagmulkta skal ikkje i noko tilfelle vere mindre enn ein halv prosent av grunnsummen i folketrygda på det tidspunktet forseinkinga oppstod. Dagmulkt kan ikkje krevjast for meir enn 100 dagar.

Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap.

§ 19. Skadebot

Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, dersom tapet kjem av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

I tidsrom når det ikkje vert rekna dagmulkt, kan forbrukaren krevje skadebot

- a. for tap som følgjer av at arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført til den tida forbrukaren kan krevje,
- b. for tap som følgjer av at heimelsoverføring ikkje skjer til den tida forbrukaren kan krevje.

Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

For skadebot i hevingstilfella gjeld § 22.

§ 20. Heving

Forbrukaren kan heve avtalen dersom forseinkinga inneber eit vesentleg avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå forseinking som nemnd i første punktum. Forbrukaren kan berre heve avtalen dersom det er gjeve melding til entreprenøren om hevingskravet før overtaking.

Vert avtalen med entreprenøren heva fordi entreprenørens yting er forseinka, kan forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

- a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og
- b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om rett til grunnen blir heva på grunn av forseinking. Blir begge avtalane heva, skal hevingsoppgjøret skje etter § 21 tredje ledd.

§ 21. Verknadene av heving

Vert avtalen heva, har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført i samsvar med avtalen. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.

Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen. Forbrukaren har rett til å gjere seg nytte av utstyr og materialar som finst på byggjeplassen, og som trengst til fullføringa av arbeidet. For den bruken skal det betalast eit rimeleg vederlag.

Ved avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), kan forbrukaren krevje at hevingsoppgjøret, i staden for etter første og andre ledd, skal skje ved at kvar parts plikt til å oppfylle fell bort. Er avtalen heilt eller delvis oppfylt, har kvar part krav på å få att det som er ytt. Entreprenøren kan krevje vederlag for verdireduksjon som forbrukaren svarer for. Ein part kan likevel halde attende det som er motteke, til den andre parten gjev frå seg det mottekne. Det same gjeld når parten har krav på skadebot eller rente, og det ikkje blir gjeve fullgod trygd for kravet.

Fører hevinga til at ein bustad som er teken over, skal tilbakeførast til entreprenøren, skal forbrukaren føre slikt forsvarleg tilsyn med bustaden som er rimeleg etter tilhøva. Forbrukaren kan krevje dekt nødvendige kostnader med tilsynet.

§ 22. Skadebot ved heving

Ved heving kan forbrukaren krevje dekt nødvendige meirkostnader som følgjer av at andre må fullføre arbeidet. I tillegg kan forbrukaren krevje bøtt anna økonomisk tap som forseinkinga fører til, så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

Forbrukaren kan ikkje krevje dagmulkt for tida etter hevinga, og pådregen dagmulkt går til frådrag i skadebot etter første ledd andre punktum.

§ 23. Lemping av ansvar

Dagmulkt eller skadebot kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren ut frå omfanget av arbeidet, storleiken av tapet og tilhøva elles.

§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Har forbrukaren krav som følgje av forseinkinga, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting

§ 25. Mangel

Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.

§ 26. Manglande opplysningar

Mangel ligg òg føre dersom forbrukaren før avtalen vart gjord ikkje har fått opplysningar om arbeidet, materialane eller eigedomen som entreprenøren kjende eller måtte kjenne til, og som forbrukaren hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gjevne.

§ 27. Urette opplysningar

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje svarer til opplysningar om eigenskapar eller bruk som er gjevne i samband med avtaleinngåinga eller ved marknadsføring

- a. av entreprenøren eller på entreprenørens vegner, eller
- b. av nokan annan i eigenskap av eller på vegner av materialleverandør eller tidlegare salsledd.

Første ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og opplysningane ikkje er retta i tide på ein tydeleg måte.

§ 28. Tidspunktet for mangelsvurderinga

Om ytinga frå entreprenøren har mangel eller ikkje, skal avgjerast ut frå tilhøva på overtakingstidspunktet sjølv om mangelen viser seg først seinare.

Entreprenøren svarer òg for feil som oppstår seinare, dersom årsaka til feilen er eit avtalebrot frå entreprenøren. Det same gjeld dersom entreprenøren ved garanti eller på annan måte har teke på seg ansvar for eigenskapar eller anna ved ytinga fram til eit seinare tidspunkt.

§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel

Ligg det føre mangel, kan forbrukaren

- a. halde attende vederlag etter § 31,
- b. krevje mangelen retta etter § 32, krevje prisavslag etter § 33 eller heve etter § 34,
- c. krevje skadebot etter § 35.

For andre feil ved entreprenørens oppfylling gjeld føresegnene om manglar så langt dei høver.

§ 30. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom det ikkje er gjeve melding til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Ein mangel kan ikkje gjerast gjeldande seinare enn fem år etter overtakinga. Entreprenøren kan likevel ha teke på seg å svare for manglar i lengre tid.

Vil forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved overtakinga, må dette gjerast så snart råd er dersom overtakinga skjer ved overtakingsforretning.

Når det blir halde seinare synfaring etter § 16, må forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga, så snart råd er.

Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

Retten til å gjere ein mangel gjeldande kan òg bli mista etter reglane om forelding i foreldingslova.

Endra med lov 15 juni 2007 nr. 36.

§ 31. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Har forbrukaren krav som følgje av mangelen, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

§ 32. Retting av mangel og skade

Forbrukaren kan krevje at entreprenøren rettar ein mangel om ikkje rettinga vil føre til kostnader eller ulemper som ikkje står i rimeleg høve til det forbrukaren oppnår. Skade som mangelen har ført til på arbeid eller eigedom som er omfatta av avtalen mellom forbrukaren og entreprenøren, skal òg rettast dersom skaden er ei nærliggjande og pårekneleg følgje av mangelen.

Vil forbrukaren gjere gjeldande ein mangel, har entreprenøren krav på å få rette mangelen dersom rettinga kan skje utan vesentleg ulempe for forbrukaren, og forbrukaren heller ikkje elles har særleg grunn til å setje seg imot retting.

Retting skal skje innan rimeleg tid etter at forbrukaren har gjort mangelen gjeldande og har gjort det mogleg for entreprenøren å rette. Skal det vere synfaring etter § 16, kan retting utstå til etter synfaringa dersom det ikkje er til ulempe for forbrukaren.

Retting skjer for entreprenørens rekning. Entreprenøren skal bere tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er ei direkte og nødvendig følgje av rettinga. Entreprenøren kan likevel krevje pristillegg for arbeid og materialar som ikkje er omfatta av prisen, og som ville ha vore nødvendige jamvel om ytinga hadde vore utan mangel frå først av.

§ 33. Prisavslag

Dersom ein mangel ikkje blir retta i samsvar med § 32, kan forbrukaren krevje prisavslag. Dette gjeld likevel ikkje dersom forbrukaren avslår retting som entreprenøren har rett til å utføre etter § 32 andre ledd.

Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting.

§ 34. Heving

Forbrukaren kan heve avtalen dersom mangelen inneber eit vesentleg avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen før overtakingstidspunktet dersom det er klårt at ytinga kjem til å få ein slik mangel som nemnd i første punktum.

Om verknadene av heving gjeld § 21 tilsvarande.

Vert avtalen med entreprenøren heva på grunn av mangel ved entreprenørens yting, kan forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

- a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og
- b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om rett til grunnen blir heva på grunn av mangel. Blir begge avtalane heva, skal hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd.

§ 35. Skadebot ved mangel

Økonomisk tap som kjem av ein mangel, og som ikkje er dekt ved prisavslag etter § 33, kan forbrukaren krevje bøtt utan at det ligg føre skyld på entreprenørens side. Dette gjeld likevel ikkje så langt entreprenøren godtgjer at mangelen oppstod på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren kunne ha overvunne eller unngått følgjene av hindringa.

Ligg årsaka til mangelen hos ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, er entreprenøren ansvarsfri berre dersom underentreprenøren òg ville vere ansvarsfri etter føresegnene i første ledd.

Forbrukaren kan jamvel krevje skadebot for skade på ting som ikkje står i nokon nær og direkte samband med entreprenørens yting. Men dette skadebotansvaret fell bort dersom entreprenøren godtgjer at tapet ikkje kjem av feil eller forsøming på entreprenørens side.

§ 36. Omfanget av ansvaret

Skadebota skal svare til det økonomiske tapet forbrukaren har hatt (utlegg, prisskilnad, tapt arbeidsforteneste, tingskade m.m.). Dette gjeld likevel berre tap som ein rimeleg kunne ha rekna med som ei mogleg følgje av mangelen.

Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, må forbrukaren sjølv bere den tilsvarande delen av tapet.

Ansvarer kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren. Ved vurderinga legg ein vekt på storleiken av tapet samanlikna med tap som til vanleg oppstår i liknande tilfelle, og tilhøva elles.

§ 37. Krav mot bakre ledd

Forbrukaren kan gjere sitt krav som følgje av mangel gjeldande mot ein tidlegare avtalepart som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, i same mon som mangelen kan gjerast gjeldande av entreprenøren eller annan avtalepart.

Avtale som innskrenkar det kravet entreprenøren eller ein annan avtalepart har, kan ikkje gjerast gjeldande mot forbrukaren i større mon enn det som kunne ha vore avtalt mellom forbrukaren og entreprenøren.

Ved krav mot tidlegare avtalepart gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande for tilhøvet mellom forbrukaren og den tidlegare avtaleparten.

I den mon forbrukaren gjer gjeldande krav mot entreprenøren som òg kunne ha vore gjort gjeldande mot ein tidlegare avtalepart, gjeld reklamasjonsfristen i § 30 første ledd andre punktum for vidare mangelskrav frå entreprenøren mot den tidlegare avtaleparten, dersom ikkje anna følgjer av avtalen mellom entreprenøren og den tidlegare avtaleparten. Føresegna her gjeld tilsvarande for vidare krav mellom tidlegare avtalepartar som følgjer av at forbrukaren har gjort gjeldande mangelskrav.

§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysningar

Ein person som ikkje har mangelsansvar etter § 37, svarer andsynes forbrukaren etter reglane i § 35 dersom vedkomande har gjeve slike opplysningar om ytinga som § 27 nemner, på vegner av entreprenøren eller i eigenskap av eller på vegner av tidlegare leverandørledd.

For krav som nemnt i første ledd, gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande.

§ 39. Rettsmangel

Har ein tredjeperson eigedomsrett, panterett eller annan rett i det entreprenøren skal yte, gjeld føresegnene om manglar tilsvarande, om ikkje forbrukaren etter avtalen skal overta heftet. Forbrukaren kan likevel ikkje krevje retting etter § 32.

Forbrukaren kan likevel alltid krevje skadebot for tap som følgje av at det som entreprenøren skal yte, tilhørde ein annan enn entreprenøren da avtalen vart inngått, dersom forbrukaren ikkje kjende eller burde kjenne til det.

Gjer ein tredjeperson krav på å ha rett i det som entreprenøren skal yte, og dette vert motsagt frå entreprenøren, gjeld føresegnene i første og andre ledd tilsvarande når kravet ikkje er klårt ugrunna.

§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), gjeld føresegnene om manglar tilsvarande i høve til offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege tyngsler på eigedomen.

Kapittel V. Forbrukarens yting

§ 41. Fastsetjing av vederlaget

Forbrukaren skal betale det vederlaget som er avtalt.

I den mon det ikkje er avtalt kva vederlag entreprenøren har krav på, skal forbrukaren betale eit vederlag som dekkjer nødvendige kostnader og eit rimeleg påslag.

Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 prosent. Denne føresegna gjeld likevel ikkje dersom det uttrykkeleg er avtalt ei anna grense for vederlaget, og heller ikkje i den mon entreprenøren har krav på tilleggsvederlag etter §§ 42 eller 43.

Det er entreprenøren som må godtgjere ein påstand om at vederlaget er oppgjeve som eit prisoverslag eller som ei ikkje bindande prisopplysning.

Vederlaget skal reknast å vere oppgjeve med meirverdiavgift innrekna, om ikkje forbrukaren må ha visst at avgifta ikkje var innrekna.

Entreprenøren har ikkje krav på tillegg for prisstiging utan at det er avtalt skriftleg.

§ 42. Justering for endringar og tilleggsarbeid

Partane kan krevje justering av vederlaget som følgje av endringar og tilleggsarbeid i den mon det følgjer av den opprinnelege avtalen eller er fastsett i særskilt skriftleg avtale om endringane eller tilleggsarbeidet.

Elles kan justering av avtalt vederlag berre krevjast

- a. dersom krav på tillegg eller frådrag er framsett i samband med kravet om endringar eller tilleggsarbeid, eller
- b. i den mon den andre parten måtte skjønne at endringane eller tilleggsarbeidet ville føre til eit slikt krav.

Justering av vederlaget etter andre ledd skal skje på grunnlag av nødvendig kostnadsauke eller oppnåeleg innsparing for entreprenøren med tilsvarande endring av entreprenørens påslag.

§ 43. Tilleggsvederlag i andre tilfelle

Entreprenøren kan krevje tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kjem av forhold på forbrukarens side, med tilsvarande endring av entreprenørens påslag. Entreprenøren kan likevel ikkje krevje tilleggsvederlag på grunn av manglande medverknad dersom forbrukaren har krav på tilleggsfrist etter § 51.

§ 44. Vederlag for førebuing m.m.

For utgreiingar, teikningar, utarbeiding av pristilbod og for liknande førebuing før ytinga er bestilt, skal forbrukaren berre betale vederlag dersom det er opplyst eller teke atterhald om det på førehand.

§ 45. Vågnaden for ytinga

Forbrukaren skal ikkje betale for arbeid eller materialar som blir skadde eller går tapt ved ei hending før overtakinga som ikkje kjem av forhold på forbrukarens side.

Entreprenøren har òg vågnaden for materialar som forbrukaren har skaffa, dersom dei er overlatne til entreprenøren.

§ 46. Betalingstid

Er ikkje betalingstida avtalt, skal forbrukaren betale når entreprenøren krev det etter overtaking. Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan entreprenøren berre krevje betaling mot heimelsoverføring.

Det kan avtalast at forbrukaren skal stille garanti eller gje trygd på annan måte for rett betaling. Blir ikkje trygd gjeven i samsvar med avtalen, skal dette reknast likt med manglande betaling.

§ 47. Forskotsbetaling

Avtale om at forbrukaren skal betale avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag, gjeld berre så langt

- a. verdien av arbeid som er utført på eigedomen, saman med materialar som er tilførte eigedomen, minst svarer til det som til kvar tid er betalt,
- b. det ikkje kviler salspant eller andre hefte på materialar som er innbygde eller tilførte eigedomen, og som skal betalast ved avdraget, og
- c. minst ein tiandedel av vederlaget ikkje skal betalast før overtakinga.

Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan det berre avtalast forskotsbetaling etter første ledd dersom betalinga skal skje etter at forbrukaren har fått overført heimelen til eigedomen utan andre hefte enn dei som forbrukaren skal overta, eller det er stilt garanti som nemnd i tredje ledd.

Sjølv om vilkåra i første ledd bokstav a og b ikkje er oppfylte, kan det avtalast at forbrukaren skal betale avdrag mot sjølvskuldgaranti frå ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg. § 12 femte og sjette ledd gjeld tilsvarende.

Endra med lov 10 des 2010 nr. 74 (ikr. 1 juli 2011, etter res. 10 des 2010 nr. 1570, med verknad for garantiavtalar inngått etter 1 juli 2011).

§ 48. Rekning, sluttoppgjer og gebyr

Forbrukaren kan setje som vilkår for betaling av avdrag og sluttoppgjer at entreprenøren legg fram rekning som kan kontrollerast. Tillegg for prisstiging, justering av vederlaget etter § 42 og tillegg etter § 43 skal gå fram særskilt.

Har forbrukaren fått rekning for sluttoppgjer, kan entreprenøren ikkje seinare krevje retting av sluttoppgjeret. Dette gjeld likevel ikkje dersom det er teke særskilt atterhald eller forbrukaren måtte forstå at det var feil i rekninga.

Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken. Dette gjeld likevel ikkje dersom lågare vederlag følgjer av avtalen, eller dersom kravet er urimeleg.

Entreprenøren kan ikkje krevje bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skiving av rekning e.l. i tillegg til vederlaget.

§ 49. Deponering av omtvista vederlag

Er det avtalt at sluttoppgjeret skal vere betalt før overtaking eller før heimsoverføring, og noko av vederlaget er omtvista, skal betalinga likevel reknast for å vere skjedd dersom den omtvista delen er deponert etter føresegnene i andre og tredje ledd og resten er betalt.

Deponering skal skje ved å setje pengesummen inn på ein konto i ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg. Pengane, renter medrekna, skal berre kunne disponerast av forbrukaren og entreprenøren i lag. Finansinstitusjonen skal likevel utbetale frå kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller anna avgjerd som har verknad som rettskraftig dom.

Er det sett vilkår om deponering av ein større sum enn entreprenøren har krav på, kan forbrukaren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m. frå deponeringstidspunktet for den overskytande delen. Renteinntekt på den tilsvarende delen av den deponerte summen skal gå til frådrag i kravet. Om forbrukarens plikt til å betale rente og skadebot for rentetap gjeld § 59.

§ 50. Forbrukarens medverknad

Skal forbrukaren eller nokon forbrukaren svarer for, levere teikningar, skaffe materialar eller medverke på anna vis, skal medverknaden ytast til den tida som er avtalt, og elles til slik tid at det blir teke rimeleg omsyn til utføringa av entreprenørens arbeid.

§ 51. Tilleggsfrist

Forbrukaren kan krevje lenging av fristar for betaling og medverknad dersom

- a. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av entreprenørens forhold, eller
- b. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av ei hindring utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir betalinga eller medverknaden seinka på grunn av ein tredjeperson som forbrukaren svarer for, har forbrukaren krav på tilleggsfrist dersom tredjepersonen ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter andre leddet.

Kapittel VI. Avbestilling

§ 52. Avbestilling

Forbrukaren kan avbestille ytinga eller delar av den før overtaking.

For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.

Entreprenøren kan vidare krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følge av avbestillinga. Dette gjeld òg tapt

forteneste så langt det blir godtgjort at det ikkje var mogleg å oppnå ei tilsvarande fortенeste ved oppdrag frå andre. Ved utmålinga gjeld elles føresegnene i § 36 tilsvarande.

Skadebot etter tredje ledd kan likevel ikkje krevjast dersom avbestillinga kjem av at forbrukaren ikkje kan gjere seg nytte av arbeidet, yte nødvendig medverknad eller betale på grunn av ei hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn

§ 52 andre til fjerde ledd gjeld ikkje når avbestillinga omfattar rett til grunn (jf. § 1 første ledd bokstav b). I slike tilfelle kan entreprenøren krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Ved utmålinga gjeld føresegnene i § 36 tilsvarande.

Dersom heile ytinga etter avtalen med entreprenøren vert avbestilt, kan forbrukaren òg avbestille ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

- a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og
- b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Retten til avbestilling gjeld utan omsyn til om avtalen om grunnen er oppfylt, men entreprenøren kan setje som vilkår for avbestilling at ytingane etter avtalen om rett til grunnen blir førte attende. Skadebot kan krevjast etter føresegnene i første ledd.

§ 54. Avbestillingsgebyr

I staden for skadebotansvar etter § 52 eller § 53 kan avtalen fastsetje ei normalskadebot (avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Normalskadebota lyt verke rimeleg i lys av føresegnene i § 52 og § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52 fjerde ledd gjeld tilsvarande.

Kapittel VII. Forseinking på forbrukarens side

§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking

Dersom betaling eller medverknad frå forbrukarens side ikkje blir ytt til dei tider entreprenøren kan krevje etter §§ 46, 47, 50 og 51, kan entreprenøren

- a. stanse arbeidet og krevje tilleggsvederlag etter § 56, jf. § 43,
- b. heve avtalen og krevje skadebot etter §§ 57 og 58,
- c. krevje rente og skadebot for rentetap etter § 59.

Omfattar avtalen rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), har forbrukaren ikkje krav på overtaking eller heimelsoverføring før betaling og medverknad er ytt i samsvar med avtalen, sjå likevel § 49 om høve til deponering av omtvista beløp.

§ 56. Stansing av arbeidet

Betaler forbrukaren ikkje avtalt avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag til rett tid, kan entreprenøren gje forbrukaren varsel om stansing. Betaler ikkje forbrukaren snarast råd etter at han har motteke eit slikt varsel, kan entreprenøren stanse arbeidet. Entreprenøren skal likevel i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggeplassen. § 58 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Blir arbeidet stansa, kan entreprenøren krevje tilleggsvederlag etter § 43.

Føresegnene i første og andre ledd gjeld tilsvarande dersom det er klårt at betalinga kjem til å bli forseinka, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for betalinga.

§ 57. Heving

Entreprenøren kan heve avtalen dersom forseinking med forbrukarens betaling eller medverknad inneber vesentleg avtalebrot. Entreprenøren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå slik forseinking, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for oppfyllinga.

Entreprenøren kan ikkje heve avtalen etter overtaking eller etter at skøyte eller festedokument er tinglyst eller gjeve forbrukaren. Hevingsretten står ved lag om entreprenøren har teke atterhald om det, eller om forbrukaren ikkje held fast ved avtalen.

Når forbrukaren har betalt, kan entreprenøren ikkje heve avtalen med mindre det er gjeve melding til forbrukaren om hevingskravet før eller straks entreprenøren fekk vete om betalinga eller medverknaden.

§ 58. Verknadene av heving

Blir avtalen heva, har entreprenøren krav på oppgjer som om forbrukaren hadde avbestilt på hevingstidspunktet (§ 52 eller § 53).

Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggeplassen.

Entreprenøren har ikkje krav på å få attende delar av arbeid som er utført på forbrukarens eigedom, eller betalte materialar som er tilførte eigedomen, om ikkje anna følgjer av gyldig atterhald.

Er avtale om rett til grunnen gjort med nokon annan enn entreprenøren, og oppføringa av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, kan entreprenøren krevje at ytingane etter den avtalen blir førte attende dersom avtalen mellom entreprenøren og forbrukaren blir heva på grunn av mishald frå forbrukaren.

§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Ved forseinka betaling kan entreprenøren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kapittel VIII. Langvarig avbrot

§ 60. Langvarig avbrot

Kvar av partane kan seie seg løyst frå avtalen dersom arbeidet må avbrytast eller ikkje kan kome i gang på grunn av omstende som nemnde i § 11 første ledd bokstav c eller § 51 første ledd bokstav b, i så lang tid at føresetnadene for avtalen blir vesentleg endra. Likt med avbrot av arbeidet skal reknast utsetjing av overtaking eller heimelsoverføring.

Føresegnene i § 21 gjeld tilsvarande dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter første ledd. Partane har ikkje krav på skadebot.

Dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter første ledd, kan kvar av partane krevje at ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren, går attende dersom

- a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og
- b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent

§ 61. Verkeområdet for kapitlet

Føresegnene i dette kapitlet gjeld konsulentavtalar med forbrukar.

Med konsulentavtale er det meint ein avtale mellom ein sjølvstendig oppdragstakar (konsulenten) og ein oppdragsgjevar (forbrukaren, jf § 2) om planlegging av oppføring av bygning til bustadføre mål eller planlegging av arbeid som vart utført direkte som ledd i slik oppføring.

Føresegnene i kapitlet gjeld berre dersom konsulenten skal utføre arbeidet som ledd i næringsverksemd, medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd står for planlegging mot godtgjersle.

Endra med lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).

§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil

Konsulenten kan ikkje fråskrive seg skadebotansvar som han eller ho har etter allmenne reglar på grunn av feil.

§ 63. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å krevje skadebot på grunn av feil dersom det ikkje er gjeve melding til konsulenten om kravet innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga feilen. Kravet kan ikkje meldast seinare enn fem år etter overtakinga av den ytinga som oppdraget knyter seg til, om ikkje konsulenten har teke på seg å svare for feil i lengre tid.

Konsulenten kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen om tapet kjem av at konsulenten eller nokon konsulenten svarer for, har fare fram grovt aktaust eller i strid med heider og god tru elles.

Kapittel X. Tvisteløysing

§ 64. Tvisteløysing

Denne føresegna gjeld avtalar med forbrukar om oppføring av eigarbustad, jf. § 1, og konsulentavtalar med forbrukar, jf. § 61.

Avtale om at ein tvist skal avgjerast ved skilddom, er berre bindande dersom avtalen om skilddom er gjord etter at tvisten oppstod.

Dersom det på grunnlag av avtale mellom entreprenørane eller konsulentane sine organisasjonar og Forbrukarrådet er skipa ei nemnd for tvistar om avtalar som går inn under lova her, og vedtektene for nemnda er godkjende av Kongen, kan kvar av partane leggje fram for nemnda ein tvist der nemnda er kompetent. Så lenge tvisten er til førehaving i nemnda, kan ikkje entreprenøren reise søksmål om same tvisteemnet. Har nemnda teke realitetsavgjerd i saka, kan kvar av partane reise søksmål direkte for tingrett.

Endra med lov 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002, etter res. 14 des 2001 nr. 1416).

Kapittel XI. Endringar i andre lover. Ikraftsetjing

§ 65. Endringar i andre lover

Desse føresegnene i andre lover endrast slik: – – –

§ 66. Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.¹ Lova får berre verknad for avtalar som blir gjorde etter at ho tek til å gjelde.

§ 65 nr. 1 (endringar i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer), § 65 nr. 3 (endring i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar) og § 65 nr. 6 (endring i lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser) tek likevel til å gjelde straks. Endringane i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer gjeld også tidlegare oppkomne krav som ikkje er forelda når lova tek til å gjelde.

1 Frå 1 juli 1998, etter res. 3 okt 1997 nr. 1072.

Grunnboksinformasjon

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

1985/8348-1/100 **HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT**
18.03.1985 VEDERLAG: NOK 459 101
 KIRKEVEIEN 59 KS
 ORG.NR: 935 715 873

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1937/780-1/100 **ERKLÆRING/AVTALE**
01.03.1937 Bestemmelse om kloakkledning

1947/5416-2/100 **SKJØNN**
02.10.1947 Elektriske kraftlinjer
 Overført fra gnr 5 bnr 1
 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
 Med flere bestemmelser
 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2013/367757-2/200 **** DIVERSE PÅTEGNING**
07.05.2013 Rettigheten frafalles i gnr. 16 bnr. 190, 191, 192 og
 193 i Bærum kommune.

1948/5099-1/100 **ERKLÆRING/AVTALE**
15.09.1948 Erklæring om beboelsesrom i lagerskur.

1956/9-1/100 **BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.**
02.01.1956 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 Konverteringsfeil. Dokumentet er tinglyst 02.01.1957 med
 dagboknr. 18 iflg. pantebok. 17.01.2013, iny

1968/306152-1/100 **ERKLÆRING/AVTALE**
07.10.1968 Bestemmelse om kloakkledning

1984/29361-1/100 **BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.**
18.10.1984 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2022/1187588-1/200 **BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK**
20.10.2022 21.00 **RETTIGHETSHAVER: BÆRUM KOMMUNE**
 ORG.NR: 935 478 715
 KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: BÆRUM KOMMUNE
 ORG.NR: 935 478 715
 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/
 ledninger/kabler
 Bestemmelse om restriksjonsbelte

2022/1187605-1/200 **ERKLÆRING/AVTALE**
20.10.2022 21.00 **KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: BÆRUM KOMMUNE**
 ORG.NR: 935 478 715
 Bestemmelse om oppsetting av støyskjerm og boder i
 restriksjonsbeltet

GRUNNDATA

1918/900241-1/100 18.10.1918	REGISTRERING AV GRUNN DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:3024 GNR:8 BNR:3
1922/900033-1/100 10.03.1922	REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3024 GNR:8 BNR:64
1923/900088-1/100 16.03.1923	REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0219 GNR:8 BNR:89
1924/900148-1/100 13.06.1924	REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3024 GNR:8 BNR:106
1952/5738-1/100 15.09.1952	REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3024 GNR:8 BNR:510
1957/3550-1/100 29.04.1957	REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3024 GNR:8 BNR:673
1982/990339-1/100 13.05.1982	SAMMENSLÅING DENNE MATRIKKELENHET SAMMENSLÅTT MED: KNR:0219 GNR:8 BNR:1219
1991/12583-4/100 27.05.1991	MÅLEBREV Tilleggsareal til veigrunn. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2020/510685-1/200 01.01.2020 00.00	OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING TIDLIGERE: KNR:0219 GNR:8 BNR:50

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysningsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

LØKEBERGGRENDA BOLIGSAMEIE - DRIFTSBUDSJETT

DRIFTSINNEKTER	SUM	LEILIGHETER	REKKEHUS	GARASJE
Innkrevde felleskostnader	3 106 896	1 861 392	1 079 904	165 600
Felleskostnader brøk	1 833 696	1 190 592	643 104	0
Felleskostnader likt	1 107 600	670 800	436 800	0
Garasje	165 600			165 600
Andre inntekter	170 000	84 867	85 133	0
399 Salg av strøm fra solceller	170 000	84 867	85 133	0
SUM DRIFTSINNEKTER	3 276 896	1 946 259	1 165 037	165 600

DRIFTSKOSTNADER	SUM	LEILIGHETER	REKKEHUS	GARASJE
Personalkostnader	15 000	9 085	5 915	0
Styrehonorar	107 000	64 803	42 197	0
Revisjonshonorar	10 000	6 056	3 944	0
Forretningsførerhonorar	110 000	66 620	43 380	0
Konsulent og forvaltn.tjen	25 000	15 141	9 859	0
Drift og vedlikehold	915 000	553 129	196 871	165 000
6601 D/V bygninger	150 000	150 000	0	0
6601 D/V bygninger felles	100 000	49 922	50 078	0
6602 D/V VVS	50 000	50 000	0	0
6603 D/V elektro	50 000	50 000	0	0
6604 D/V utvendig anlegg	150 000	90 845	59 155	0
6606 D/V heiser	75 000	75 000	0	0
6608 D/V fyringsanlegg	50 000	24 961	25 039	0
6609 D/V brannsikring	100 000	49 922	50 078	0
6612 D/V ventilasjonsanlegg	25 000	12 480	12 520	0
6614 D/V garasjeanl.	165 000	0	0	165 000
Forsikringer	225 000	112 323	112 677	0
7501 Forsikring bygninger	225 000	112 323	112 677	0
Kommunale avgifter	600 000	326 134	273 866	0
7721 Vann- og avløpsavgift	350 000	174 725	175 275	0
7724 Renovasjonsavgift	250 000	151 408	98 592	0
Kostnader sameie/vel	0	0	0	0
Energi / fyring	150 000	100 000	50 000	0
620 Elektrisk energi	150 000	100 000	50 000	0
628 Fjernvarme/nærvare	0	0	0	0
Bredbånd og TV	384 000	232 563	151 437	0
Andre driftskostnader	380 000	295 790	84 210	0
655 Driftsmaterialer	25 000	12 480	12 520	0
674 Vaktmestertjenester	150 000	100 000	50 000	0
6741 Vakthold	0	0	0	0
677 Renhold ved firmaer	150 000	150 000	0	0
678 Snørydding	40 000	24 225	15 775	0
689 Andre kontorkostnader	10 000	6 056	3 944	0
694 Porto	2 000	1 211	789	0
777 Bank og kortgebyr	3 000	1 817	1 183	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 921 000	1 781 644	974 356	165 000

DRIFTSRESULTAT	SUM	LEILIGHETER	REKKEHUS	GARASJE
	355 896	164 614	190 682	600
		46,33 %	53,67 %	

FORUTSETNINGER	ANTALL	BRA	BRA %
Leiligheter	43	3 816	49,92 %
Rekkehus	28	3 828	50,08 %
		71	
Garasjeplasser	92		
MC/lastesykkel plasser	3		

FELLESKOSTNADER	
Leiligheter brøkfordelt	26 kvm / mnd
Rekkehus brøkfordelt	14 kvm / mnd
Likt fordelt	1 300 seksjon / mnd
Garasjeplass	150 p-plass / mnd
MC/lastesykkel	75 p-plass / mnd

Startkapital til sameiet 2 * kr 26,- eller kr 14,- kvm

Forbruk av varmt tappevann avregnes av Smartly og faktureres direkte til seksjonseier

Salg av strøm fra solceller stipulert til 100 000 kwh til en pris på kr 1,7 pr kwh

Forbehold:

Dette er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader.

Budsjettet er utarbeidet av OBOS basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leil. og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader.

Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret.

Situasjonsplan Blokk I, J og K




Bærum kommune

Eiendom: 8/50
 Adresse: Kirkeveien 59
 Utskriftsdato: 17.06.2022
 Målestokk: 1:500

Dato situasjonsplan: 01.02.2023



UTM-32

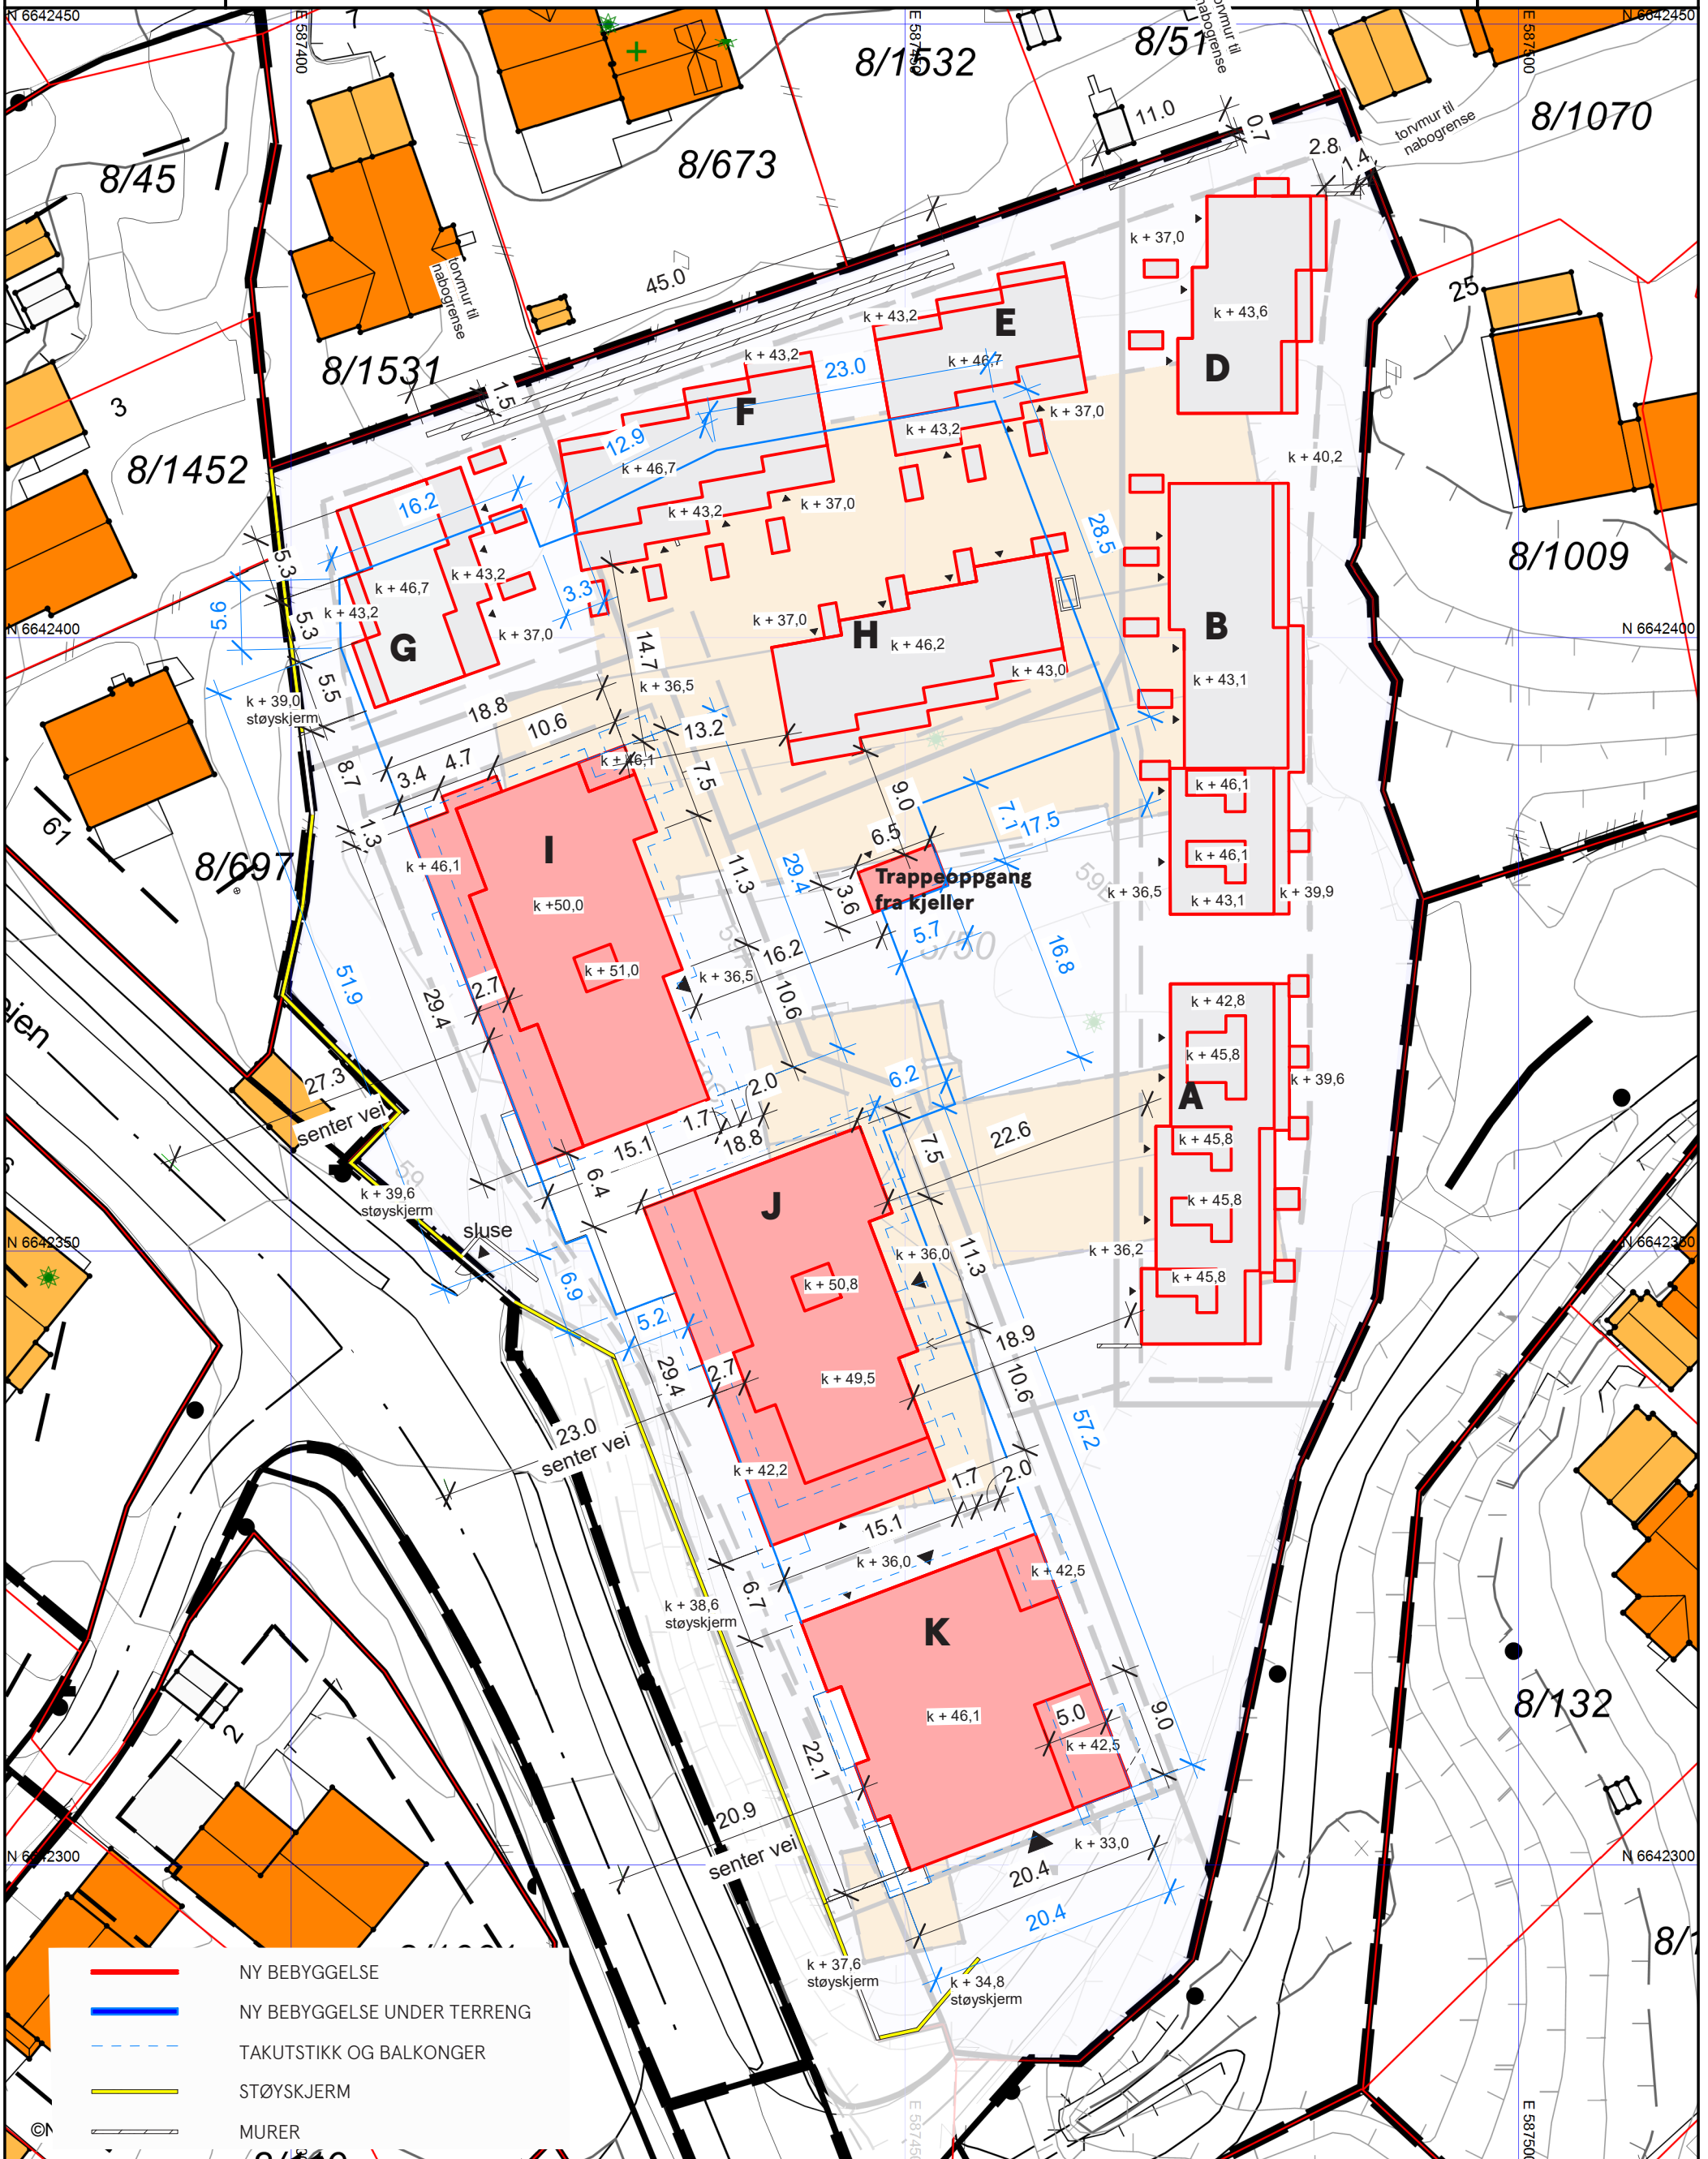

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard, spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

GENERELLE VILKÅR FOR DIGITAL BOPORTAL

Gyldighet

Når du bestiller standard utførelse eller tilvalg, bekrefter du bestillingen ved å signere elektronisk med BankID. Ved å signere elektronisk, inngår du en juridisk bindende avtale med Skanska. Du kan ikke endre bestillingen eller avbestille tilvalg i boportalen etter fristens utløp.

Bestilling

Hvis du ikke har sendt inn bestilling på standardleveranse eller tilvalg innen gitt frist, forbeholder Skanska seg retten til å ferdigstille boligen din i tråd med prosjektets leveransebeskrivelse. Denne finner du under vedlegg 7, salgsoppgaven, i kjøpekontrakten din.

Skanska tar forbehold om endringer i oppgitte priser og at produktbilder kan avvike fra den faktiske utformingen. Skanska forbeholder seg også retten til å gjøre endringer, for eksempel på grunn av endringer i modellbetegnelser eller i utvalget fra en leverandør.

Priser

Kostnaden for tilvalg utgjør forskjellen i pris fra standardutførelsen til det valgte tilvalget. Alle priser som er oppgitt, er inklusiv merverdiavgift og påslag til entreprenør og byggherre. Vær oppmerksom på at enkelte lenker i boportalen kan lede til andre nettsider der det kan forekomme prisopplysninger som ikke er aktuelle for dette prosjektet.

Betaling


Eventuelle tilvalg faktureres sammen med sluttoppgjøret for boligen din. I noen tilfeller vil du motta faktura direkte fra underentreprenør. I begge tilfeller må faktura betales innen overtakelse.

Reklamasjon

Etter overtakelse skal eventuelle reklamasjoner registreres gjennom boportalen. Se vilkårene beskrevet i kjøpekontrakten som er inngått for boligen din.

Personopplysninger


Skanska er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysningene du gir til oss slik at vi kan administrere kundeforholdet. Verken personopplysninger eller e-postadressen din vil bli utlevert til noen uavhengig tredjepart.

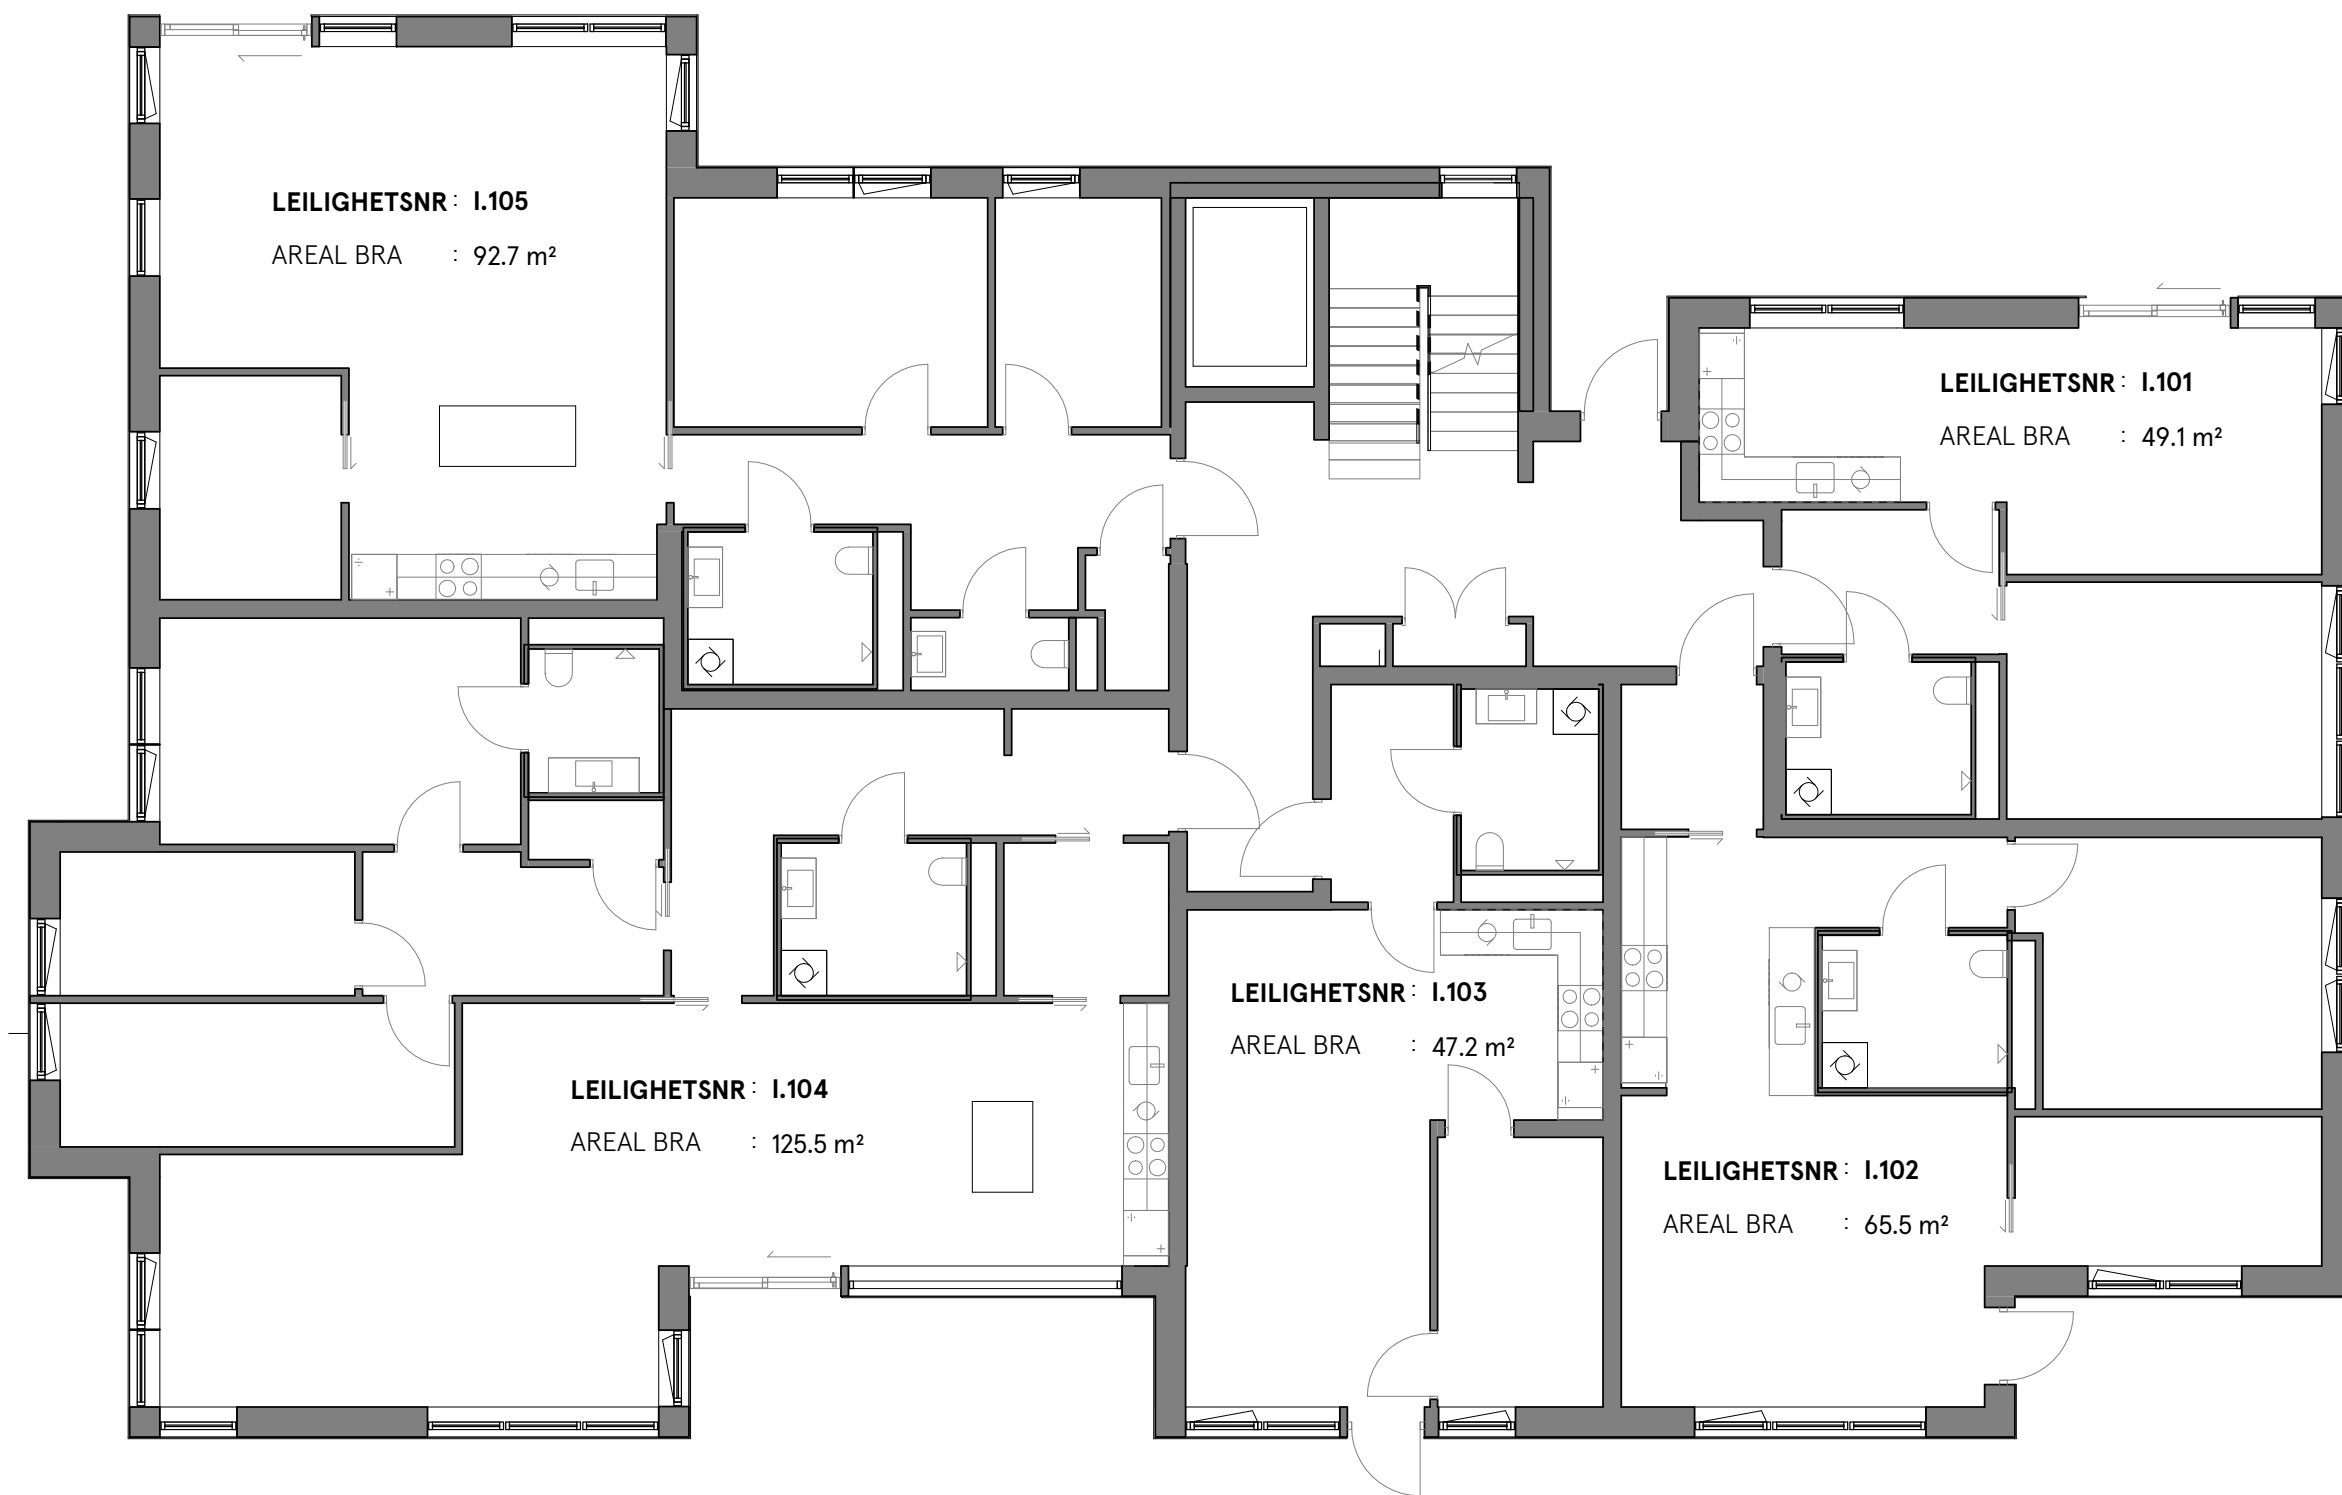


PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk I Plan 01		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-01	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk I plan 02		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-02	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR: REV.DATO:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	

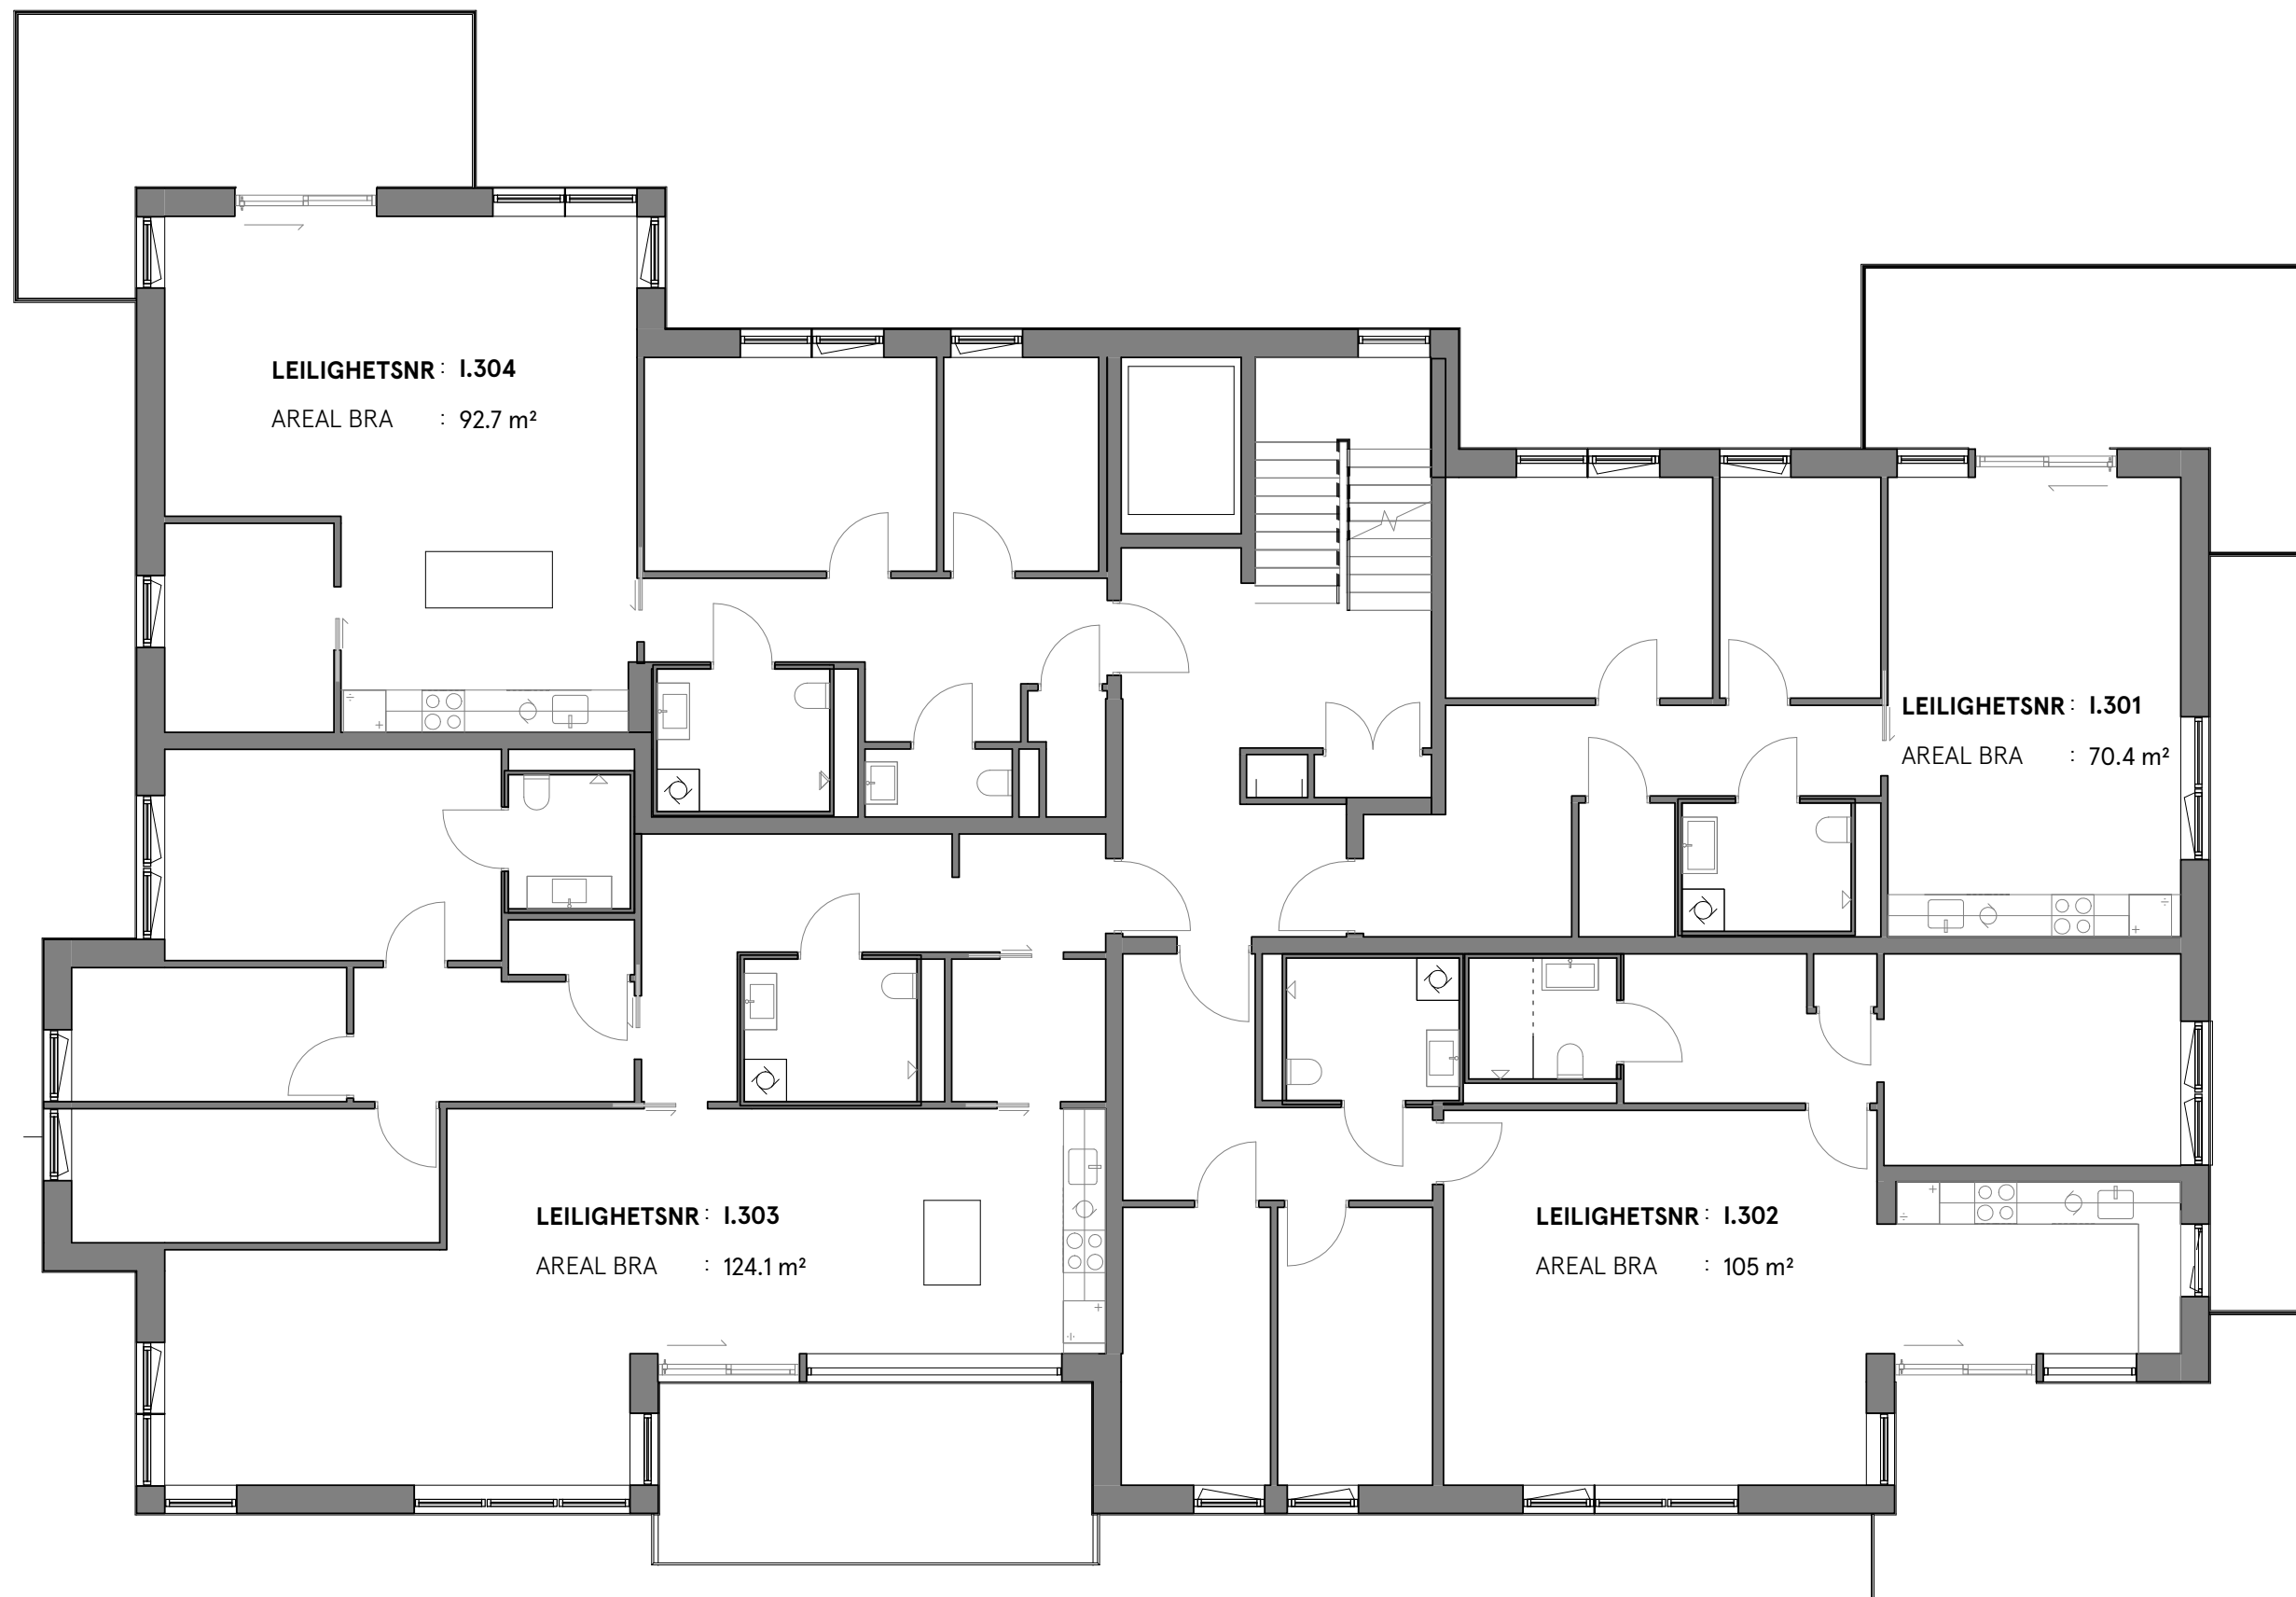


PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk I plan 03		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-03	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR: REV.DATO:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	

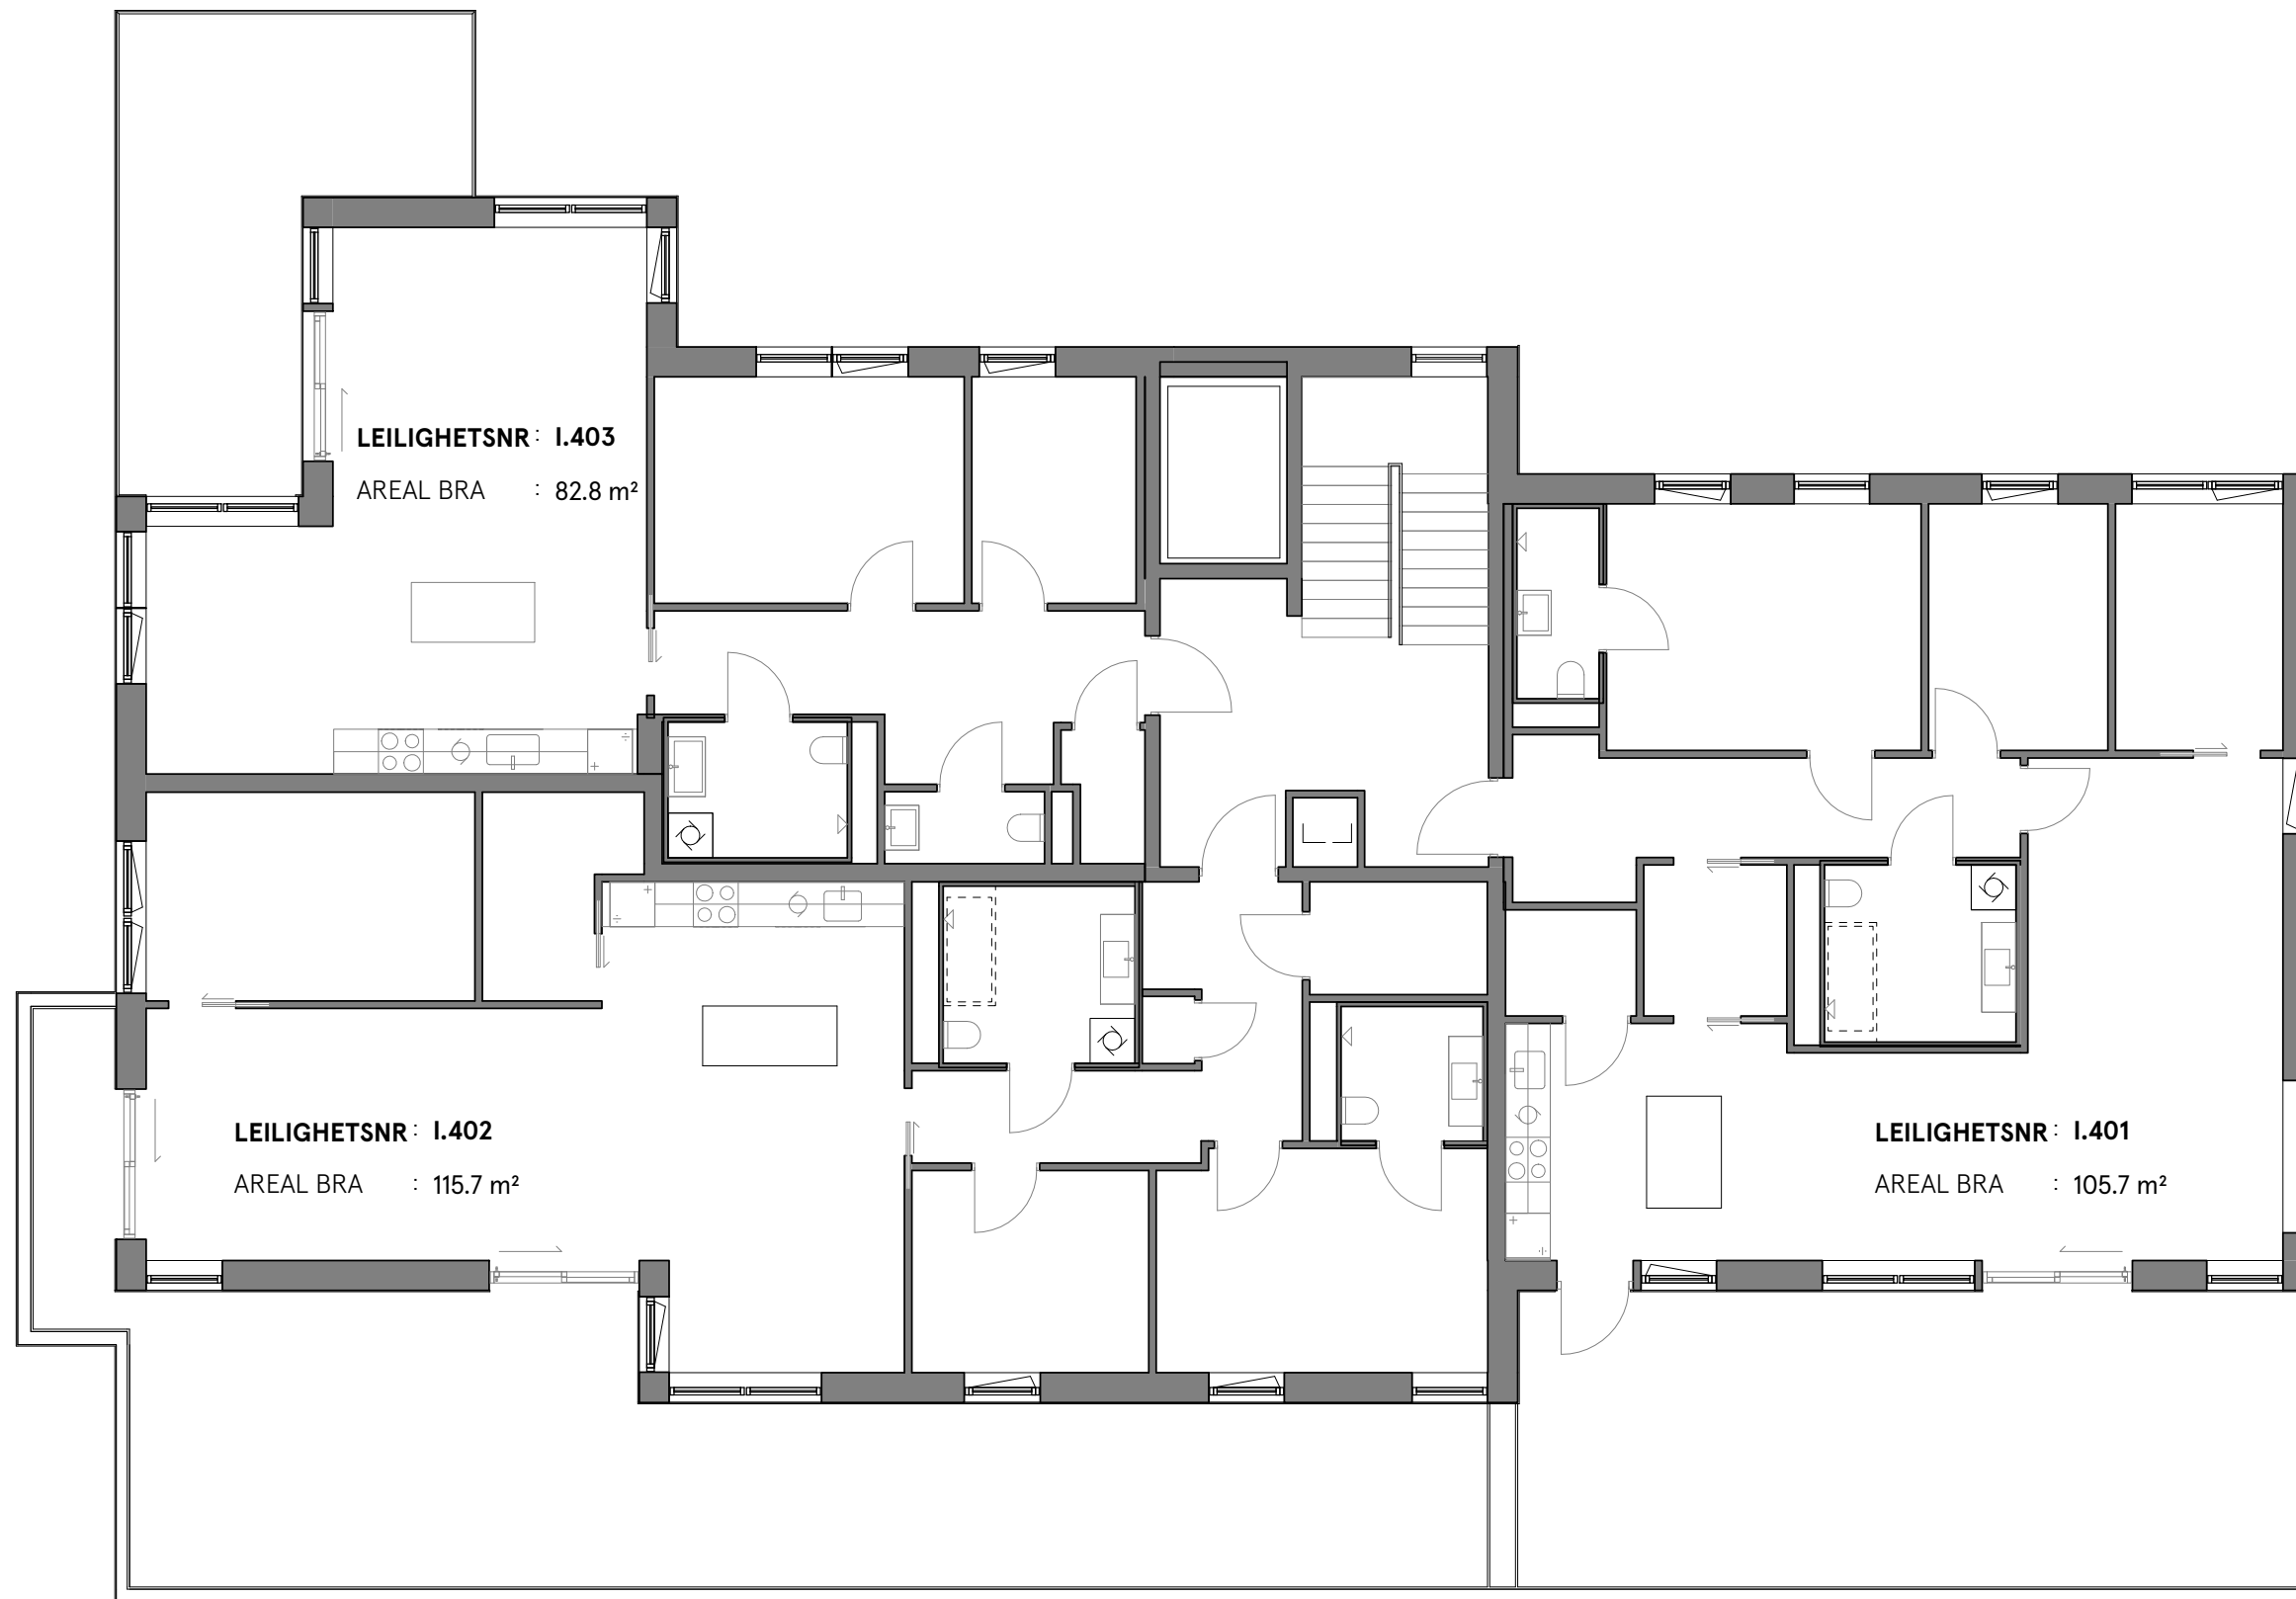

PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk I plan 04		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-04	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	




PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk J plan 01		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-05	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk J plan 02		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-06	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR: REV.DATO:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk J plan 03		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-07	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR: REV.DATO:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	

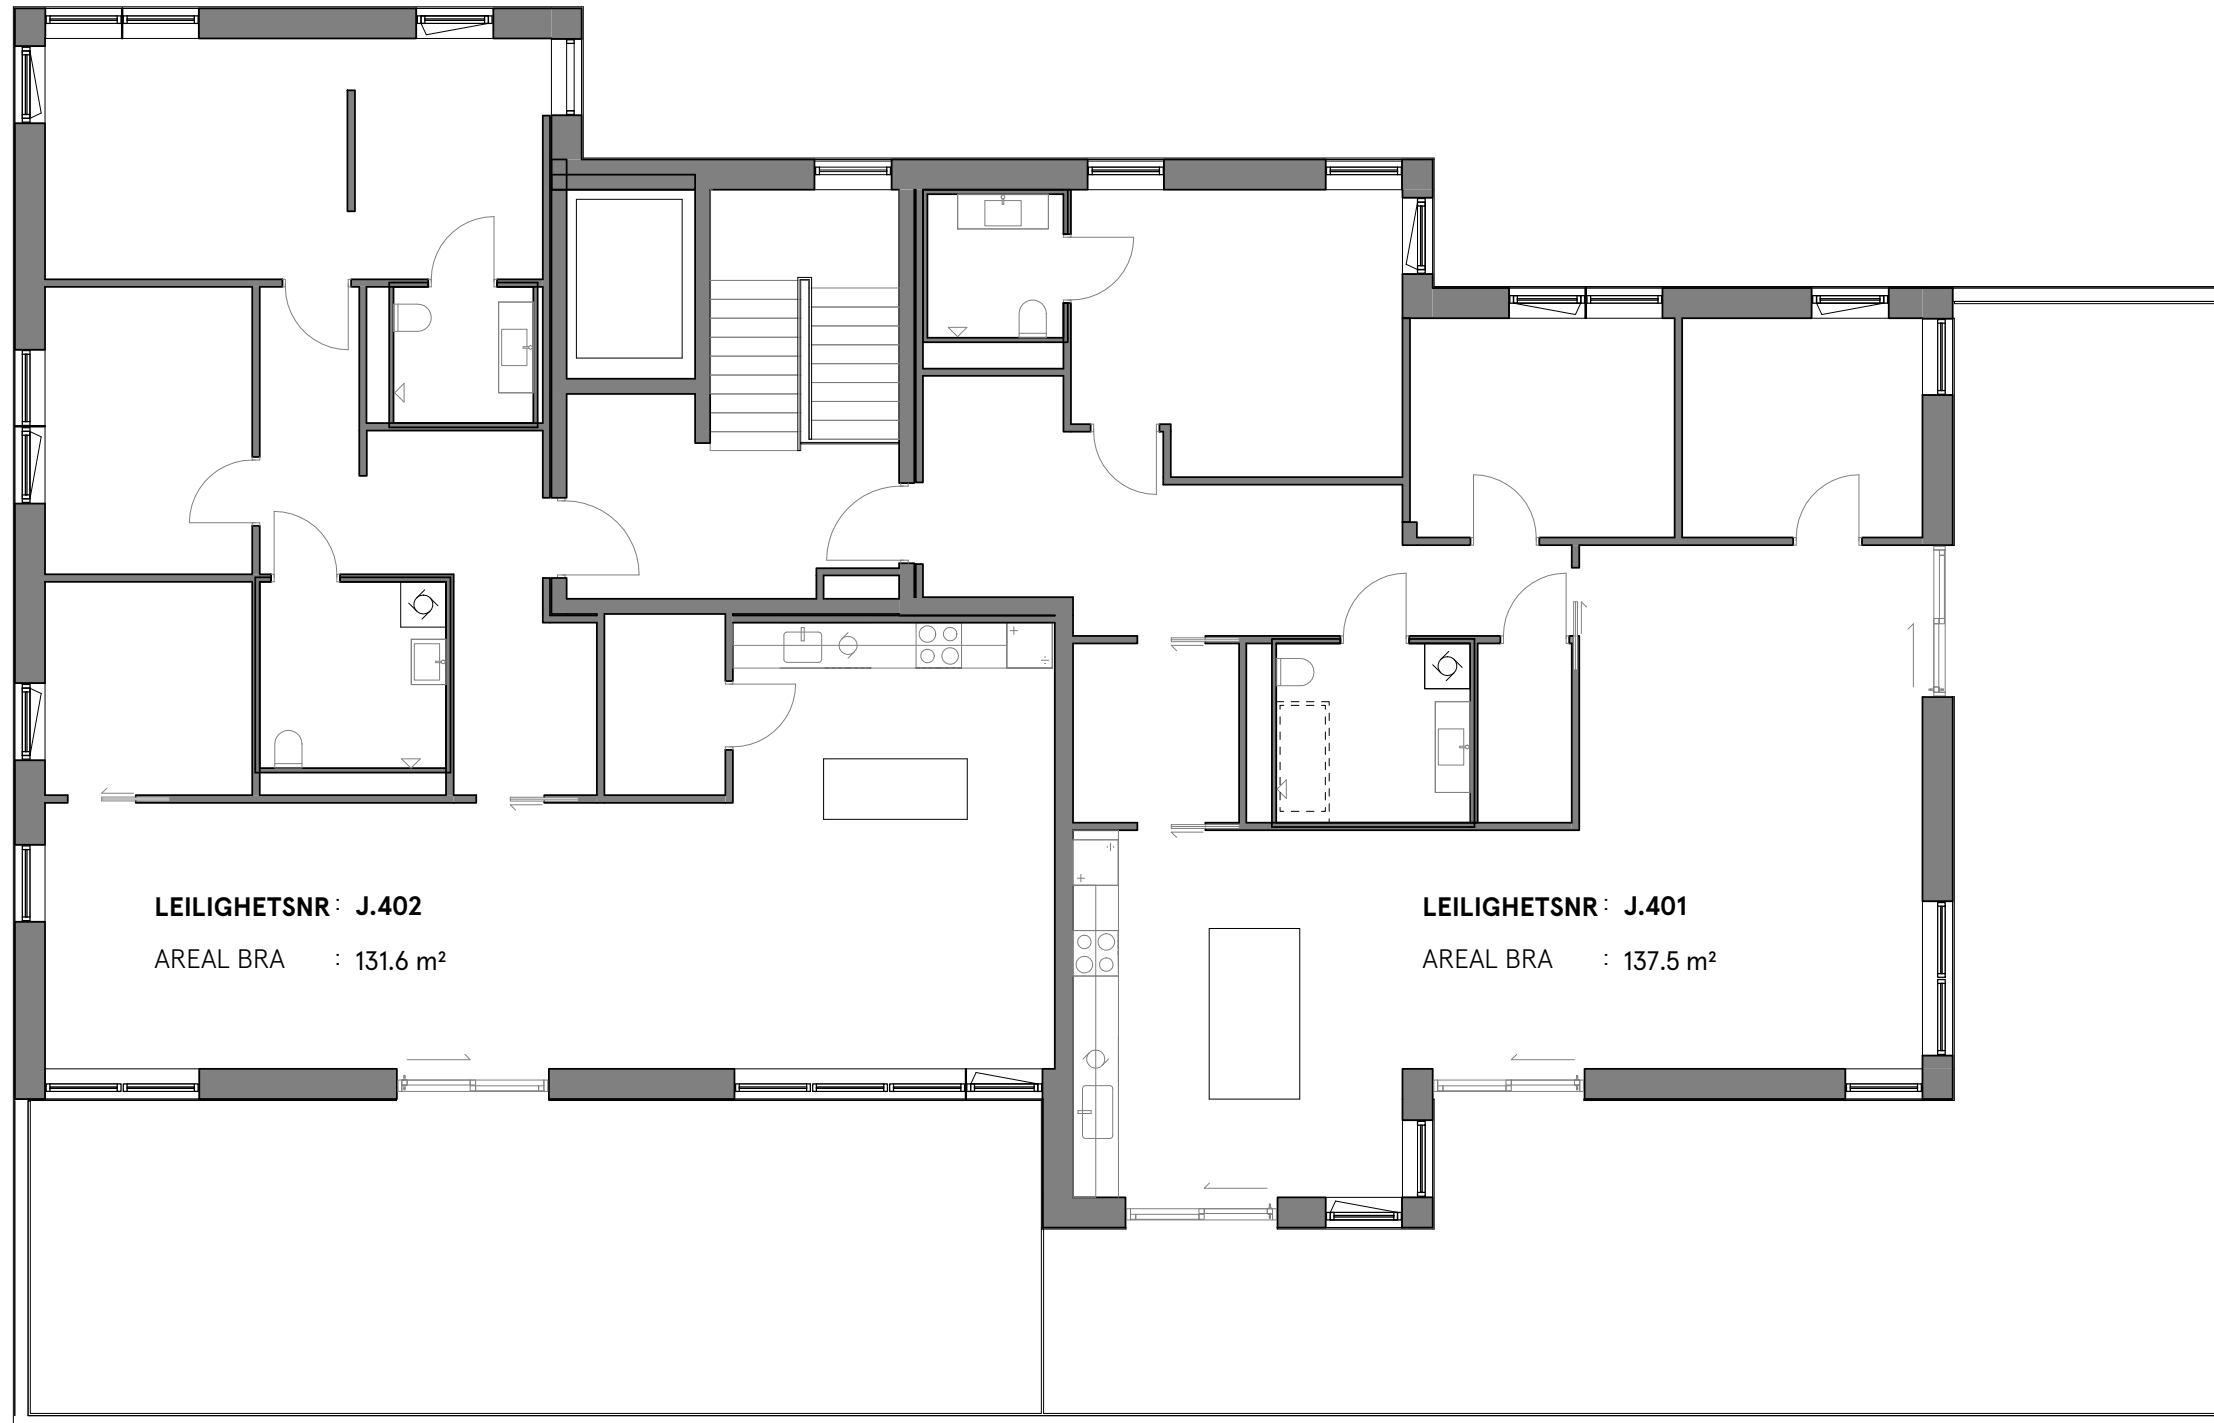

LEILIGHETSNR : J.402
AREAL BRA : 131.6 m²

LEILIGHETSNR : J.401
AREAL BRA : 137.5 m²




PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk J plan 04		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-08	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00	



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk K plan 01		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-09	TEGN./KONTR.: KMK	REV.NR.:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Blokk K plan 02		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-10	TEGN./KONTR.: KMK	REV.NR.:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00

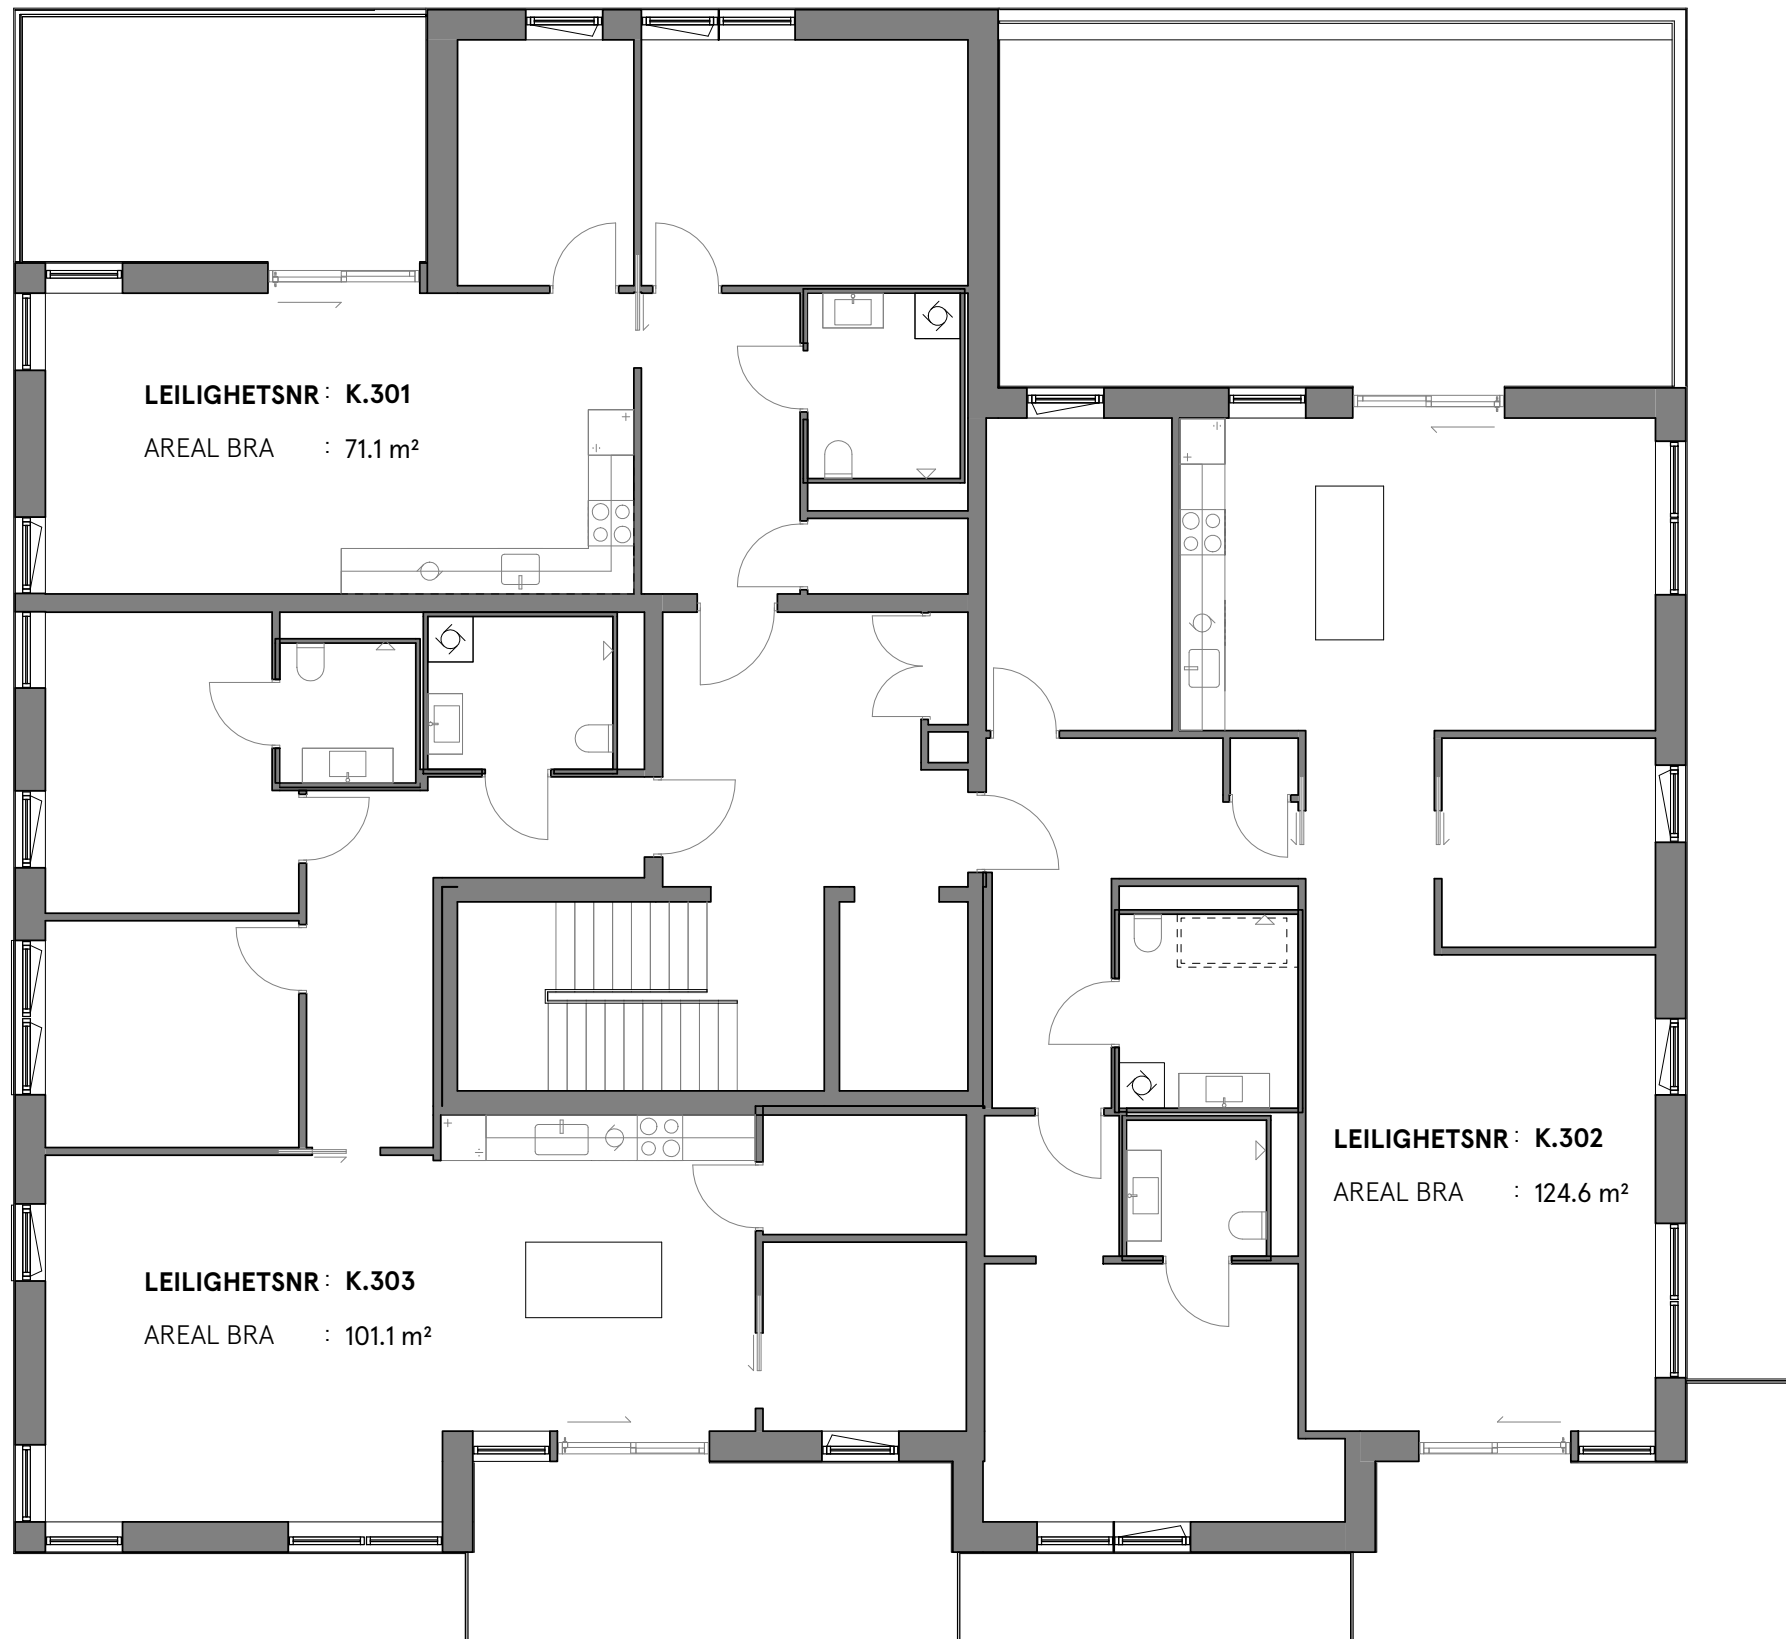



LEILIGHETSNR : K.301
AREAL BRA : 71.1 m²

LEILIGHETSNR : K.302
AREAL BRA : 124.6 m²

LEILIGHETSNR : K.303
AREAL BRA : 101.1 m²



PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50		
TEGNINGSNAVN: Blokk K plan 03		DATO: 10.02.2023	SKALA: 1:100 (A3)	
STATUS: PROSPEKT	TEGNINGS NUMMER: A-11	TEGN./KONTR: KMK	REV.NR:	REV.DATO:
TILTAKSHAVER: SKANSKA Eiendomsutvikling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER ROSENBORGATA 19C 0356 OSLO 23 32 71 00		

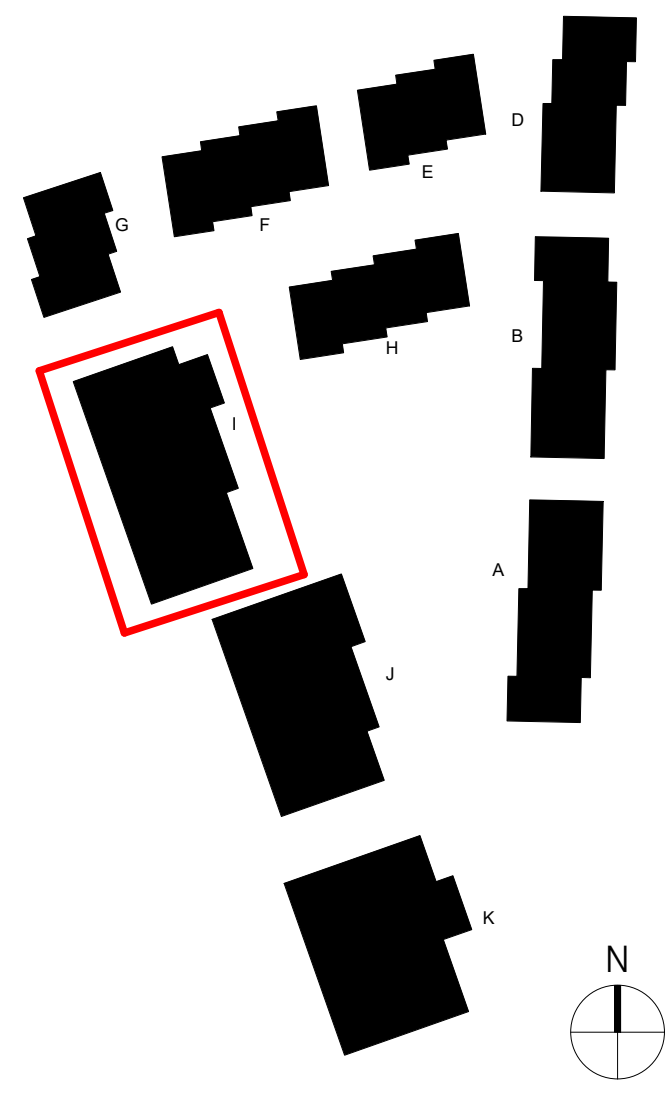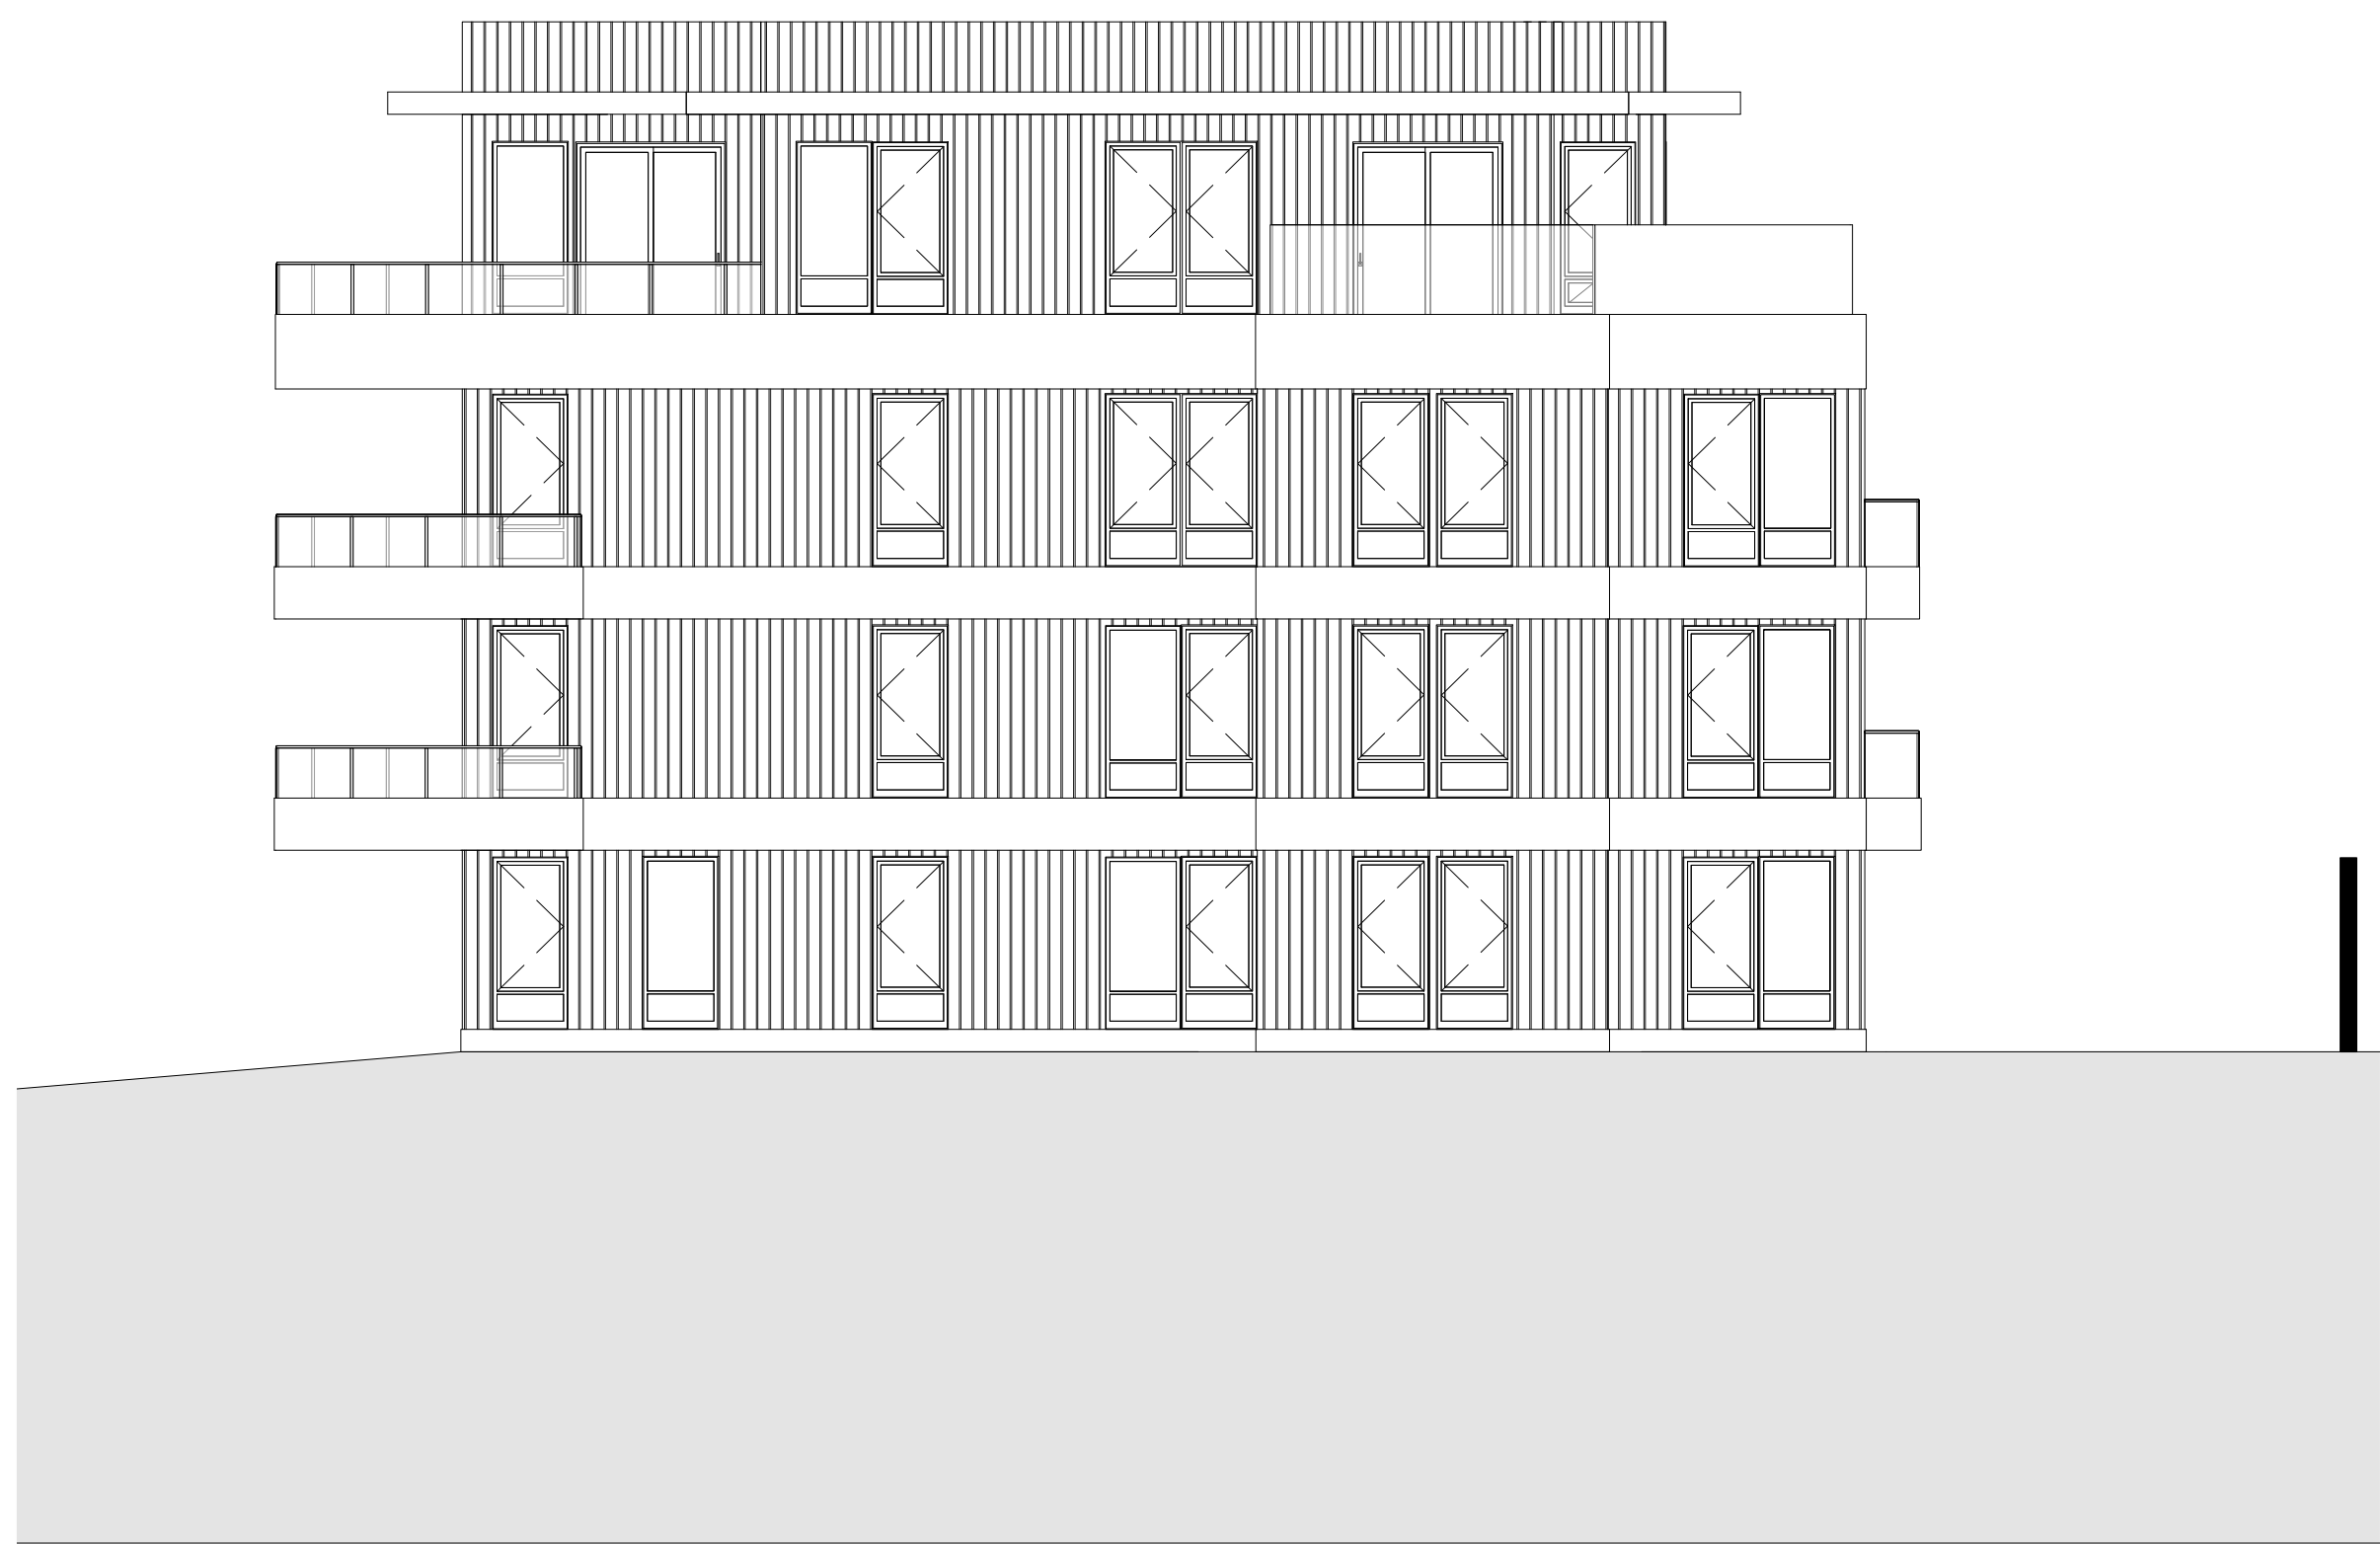

A40_BI_01 Fasade nord
1 : 100

A40_BI_01 Fasade øst
1 : 100



A40_BI_01 Fasade sør
1 : 100

A40_BI_01 Fasade vest
1 : 100

PROSJEKT: Kirkeveien 59		DOK. NR.: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Fasader - Blokk I		DATE: 01.10.2022	SKALA: 1:200 (AK) / 1:200 (AK)
STATUS: Byggesak	TEGNINGSNUMMER: A40_08	TEGN. MONTR.: AST / KMB	REV. NR.: A
UTFØRER: SKANSKA		ARKITEKT: lpo	REV. DATE: 08.12.2022
100 ØRLO		ROSENBERGATA 10C 0660 RLO 23 92 77 00	



A40_BJ_01 Fasade nord
1 : 100




A40_BJ_01 Fasade øst
1 : 100




A40_BJ_01 Fasade sør
1 : 100



A40_BJ_01 Fasade vest
1 : 100

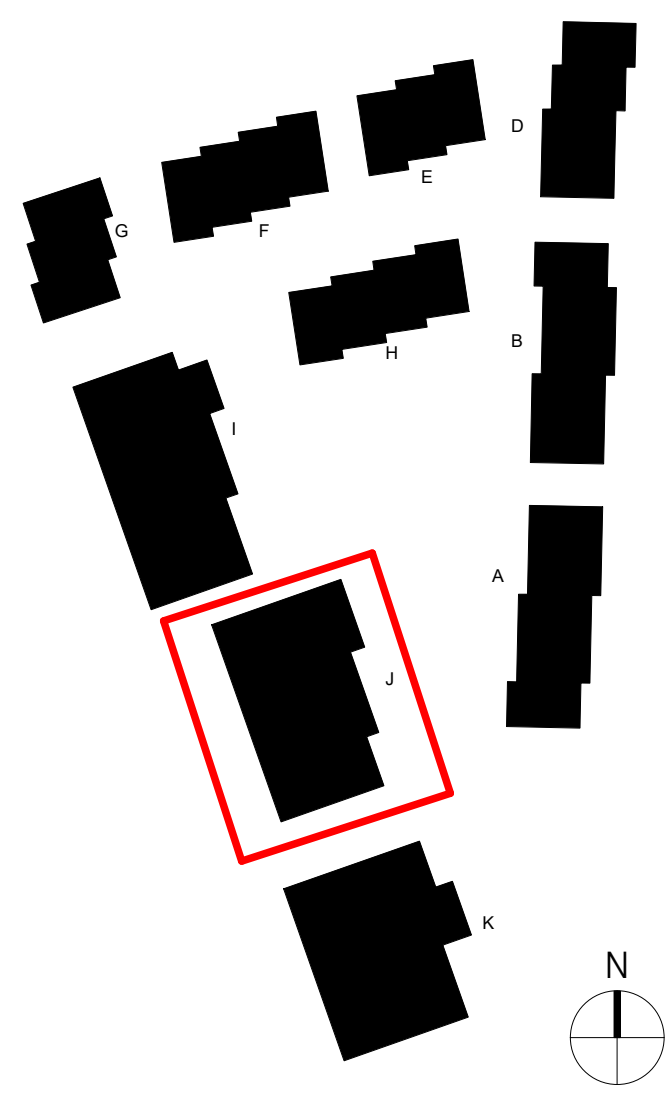

PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Fasader - Blokk J		DATE: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
STATUS: Byggesak	TEGNINGSNUMMER: A40_09	TEGN.KONTR. AST / KMK	REV.NR. A
		REV.DATG. 08.12.2022	
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 03.32.71.00

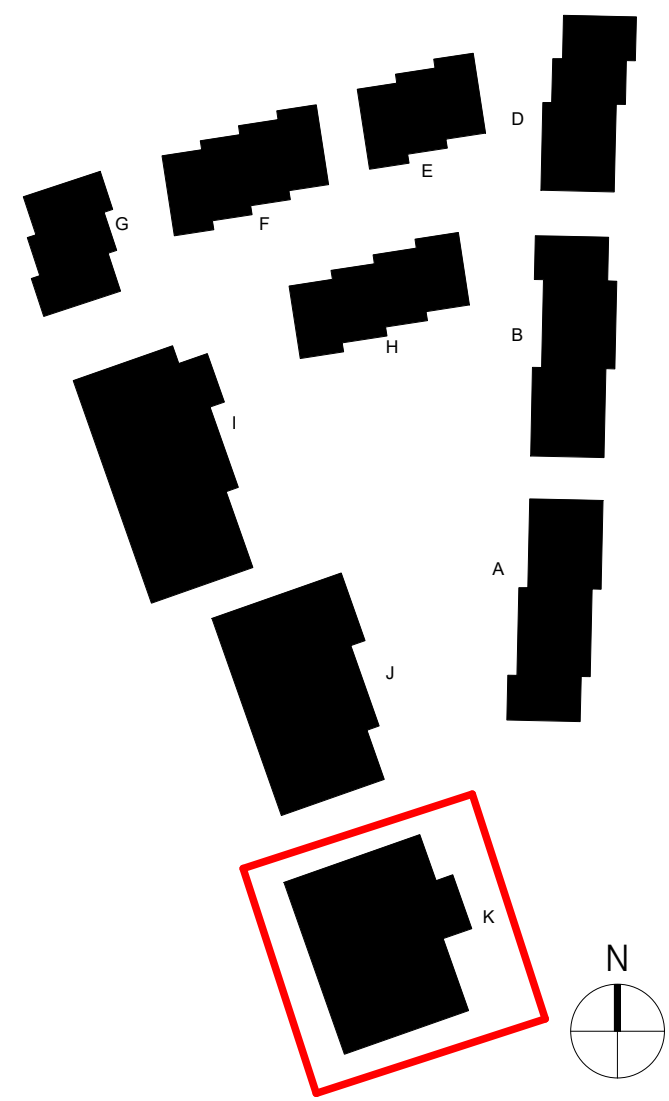

A40_BK_01 Fasade nord
1 : 100



A40_BK_01 Fasade øst
1 : 100



A40_BK_01 Fasade sør
1 : 100




A40_BK_01 Fasade vest
1 : 100

PROSJEKT: Kirkeveien 59		GNR./BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Fasader - Blokk K		DATE: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
STATUS: Byggesak	TEGNINGSNUMMER: A40_10	TEGN.KONTR. AST / KMK	REV.NR. A
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 03 32 71 00
		REV.DATG. 08.12.2022	




Fasade rekkehus A øst
1 : 100

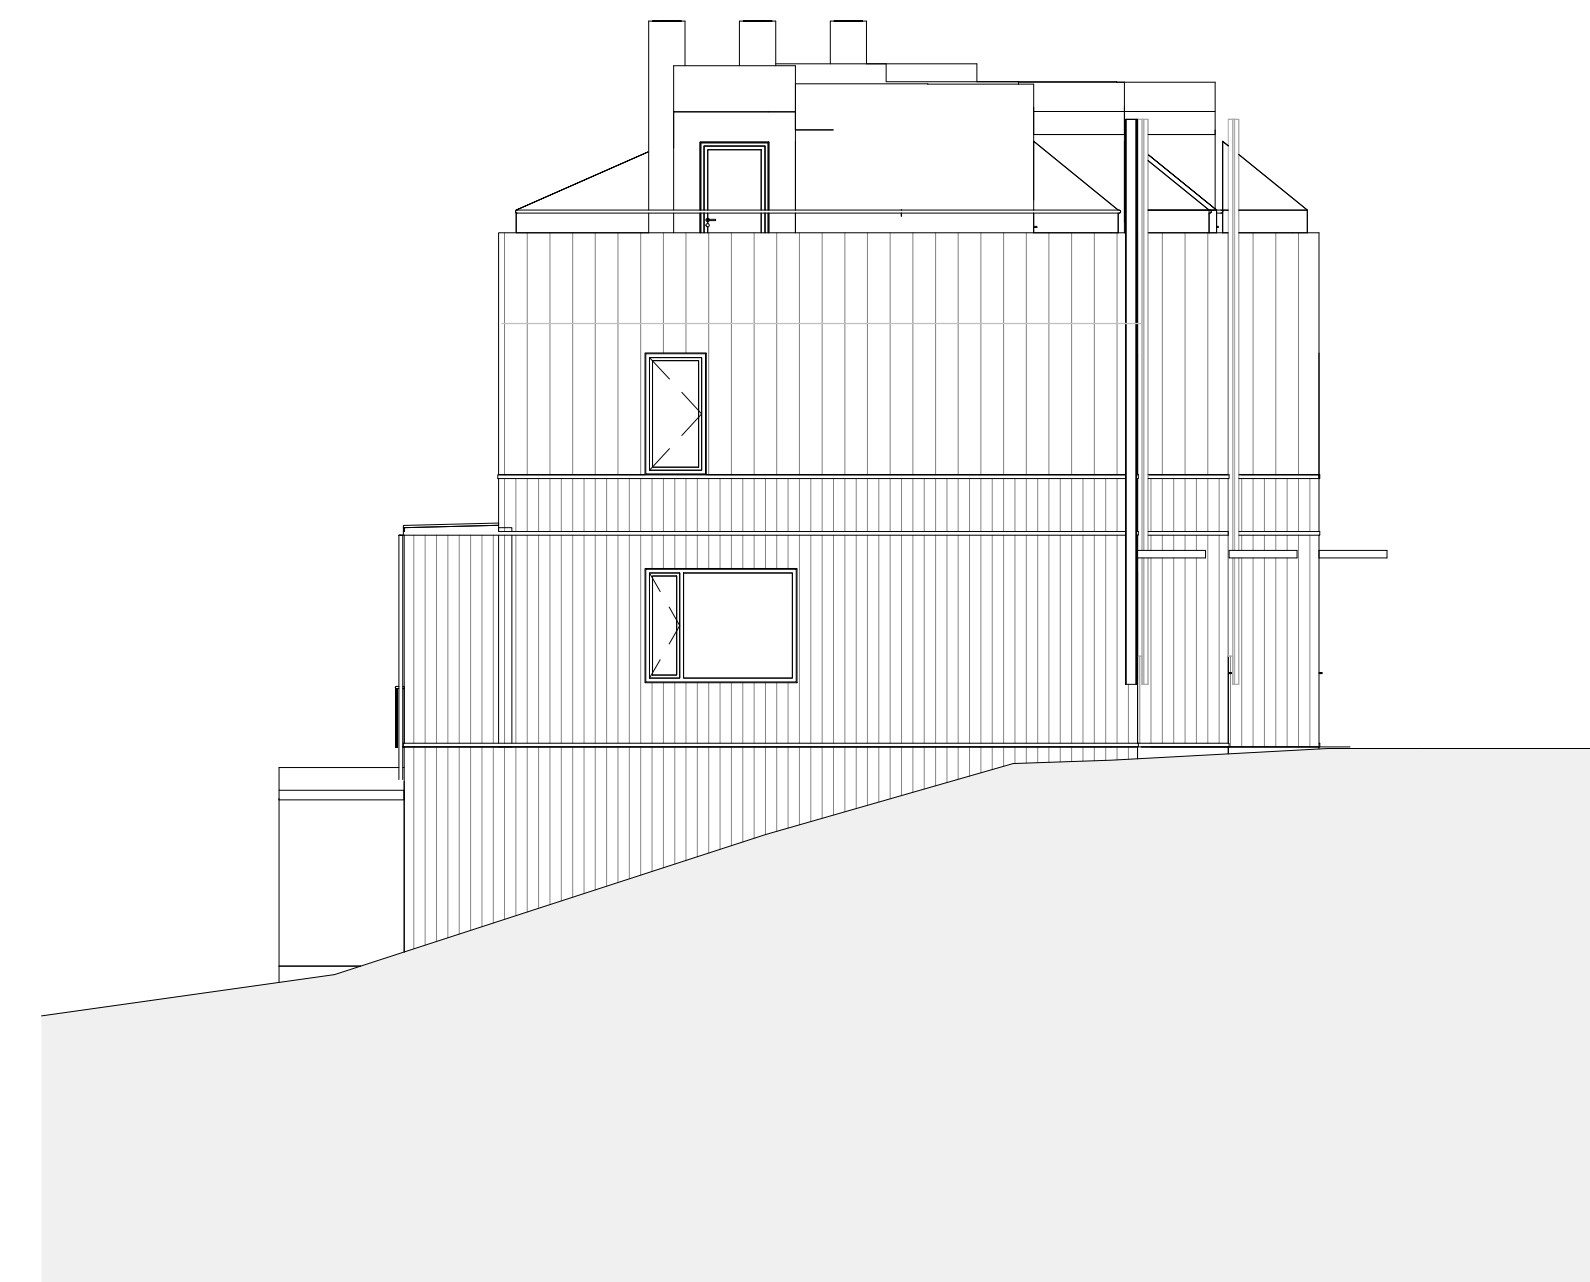


Fasade rekkehus A nord
1 : 100



Fasade rekkehus A vest
1 : 100

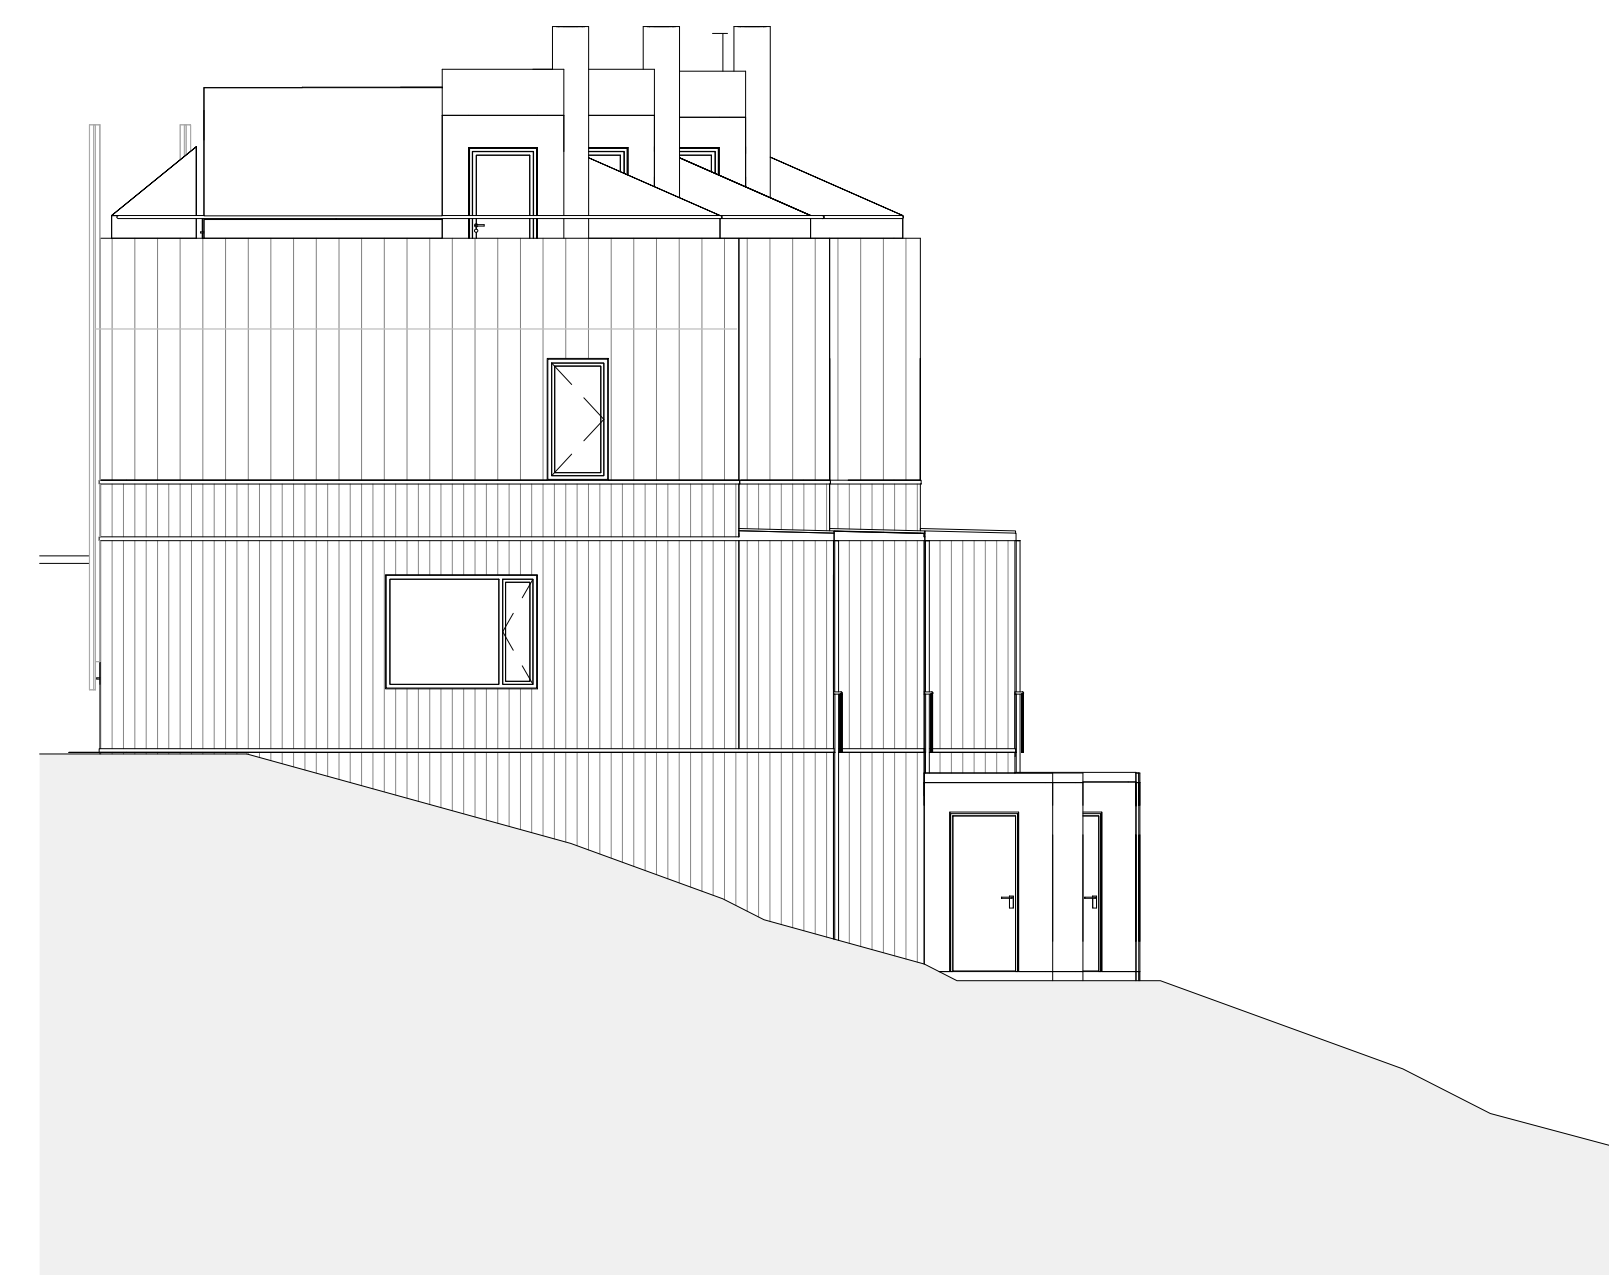


Fasade rekkehus A sør
1 : 100

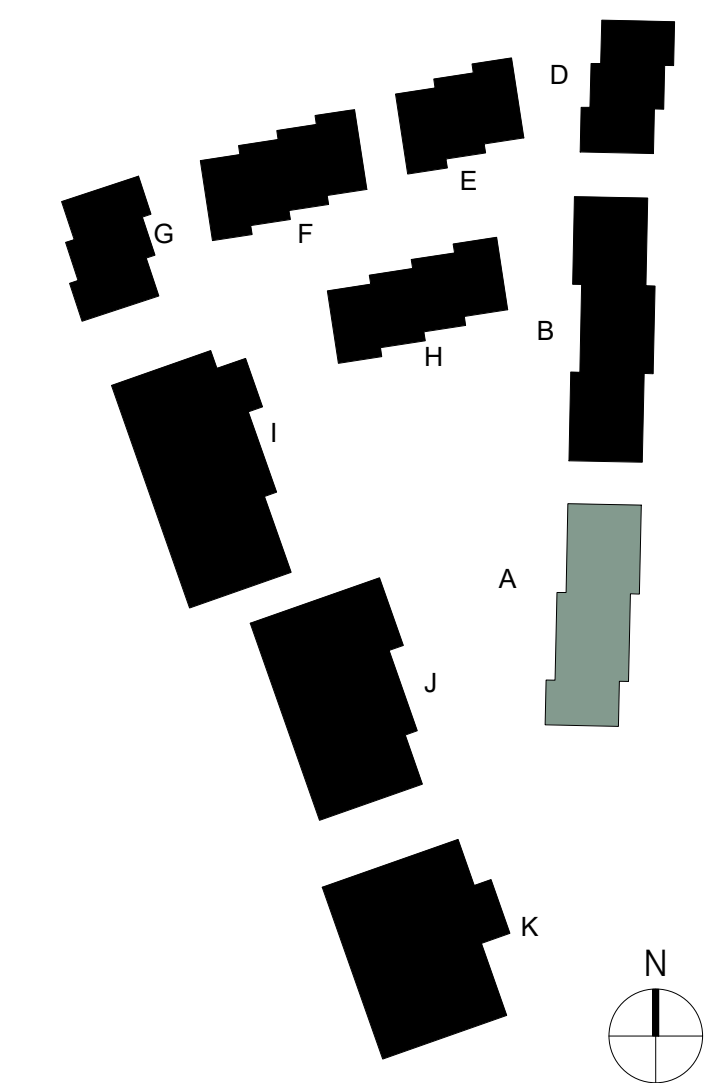

Kirkerveien 59 GNR: 8		GNR/BNR: 8/50	
BNR: 50		DATE: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
TEGNINGSNAVN: Fasader - Rekkehus A			
STATUS: Forprosjekt	TEGNINGSNUMMER: A40_01	TEGN.KONTR. SLN / KMK	REV.NR. C
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 23.32.71.00
		REV.DATO: 25.01.2023	




Fasade rekkehus B vest
1 : 100

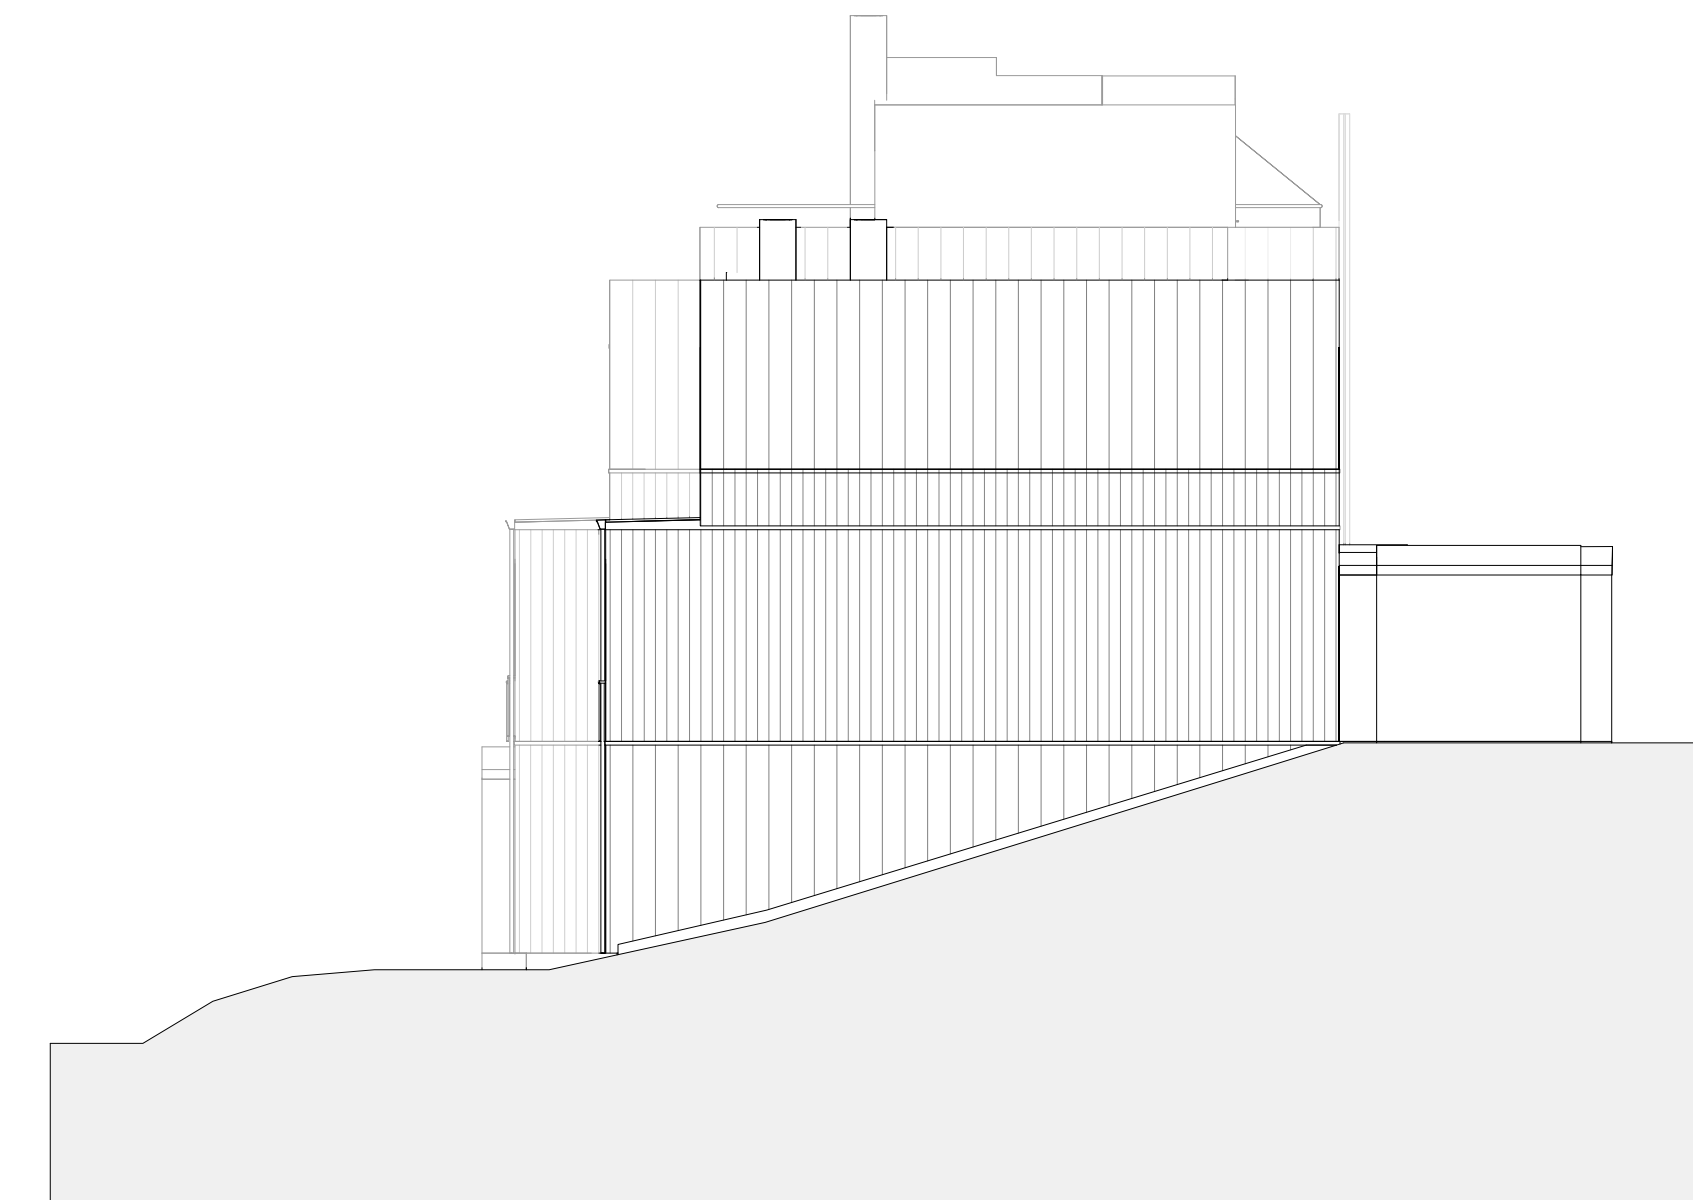


Fasade rekkehus B nord
1 : 100



Fasade rekkehus B øst
1 : 100

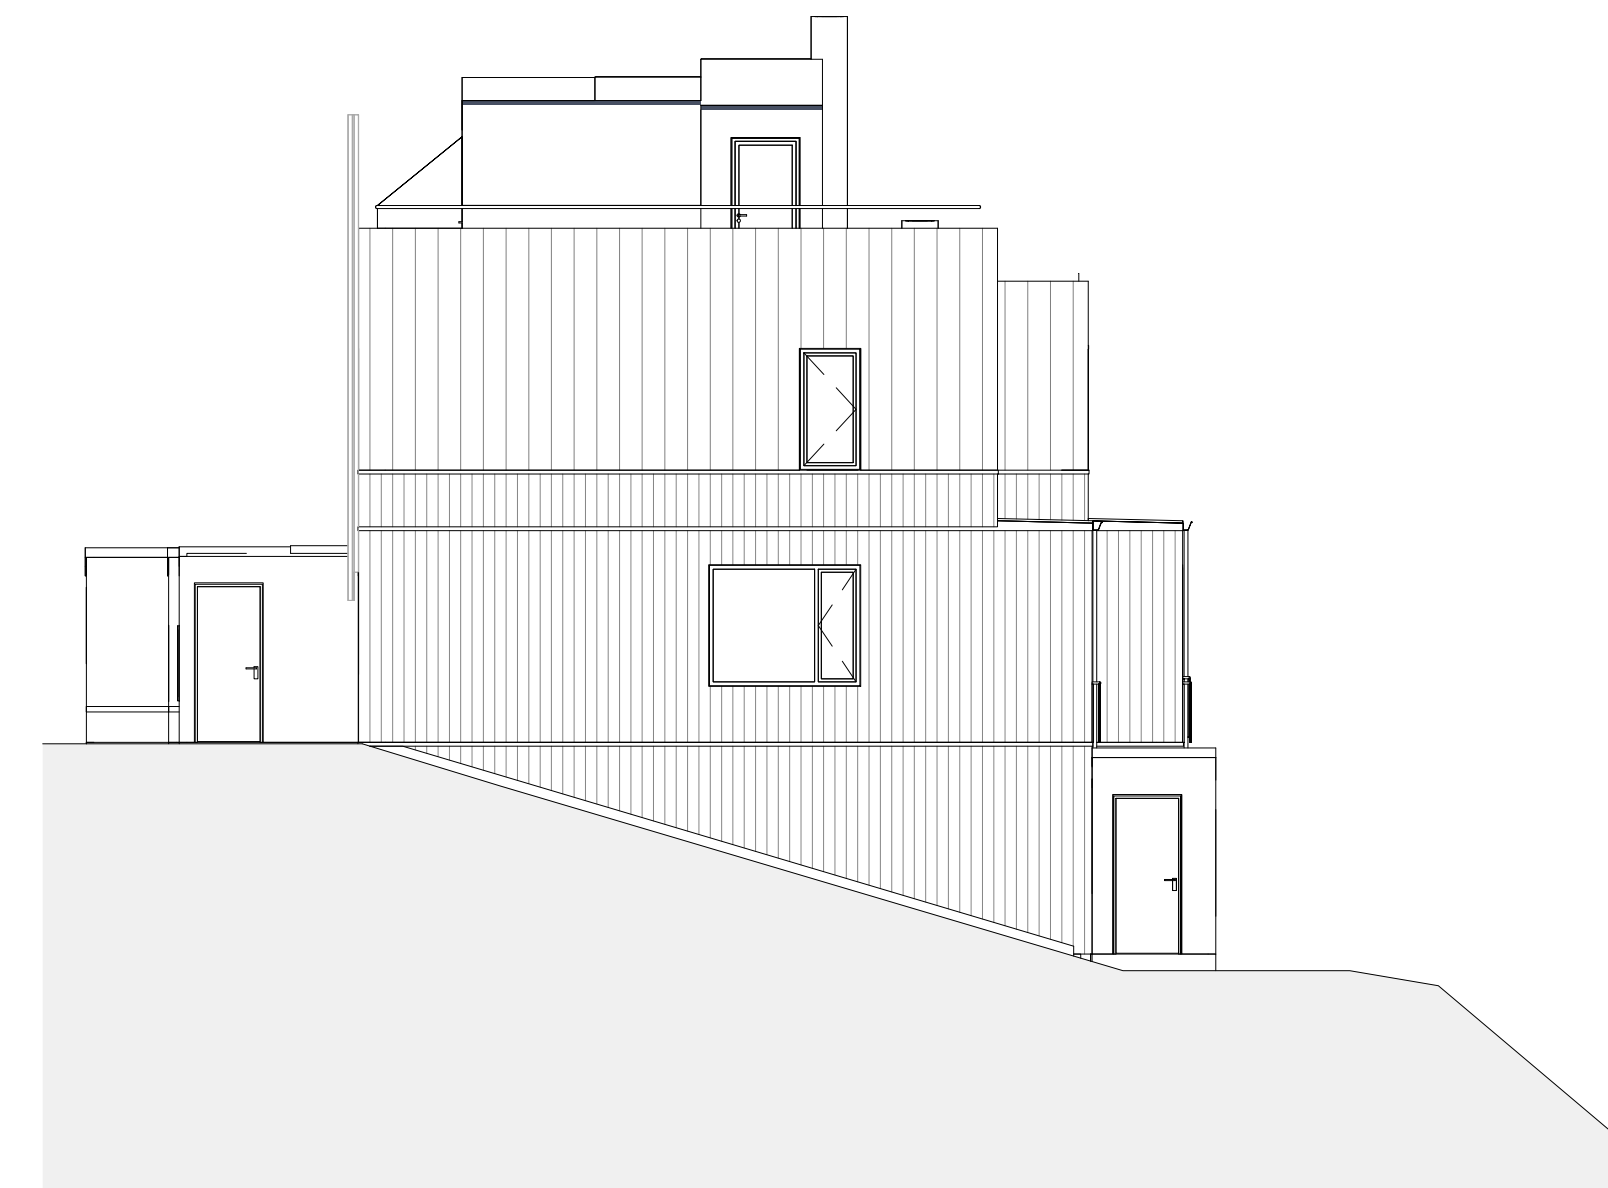


Fasade rekkehus B sør
1 : 100

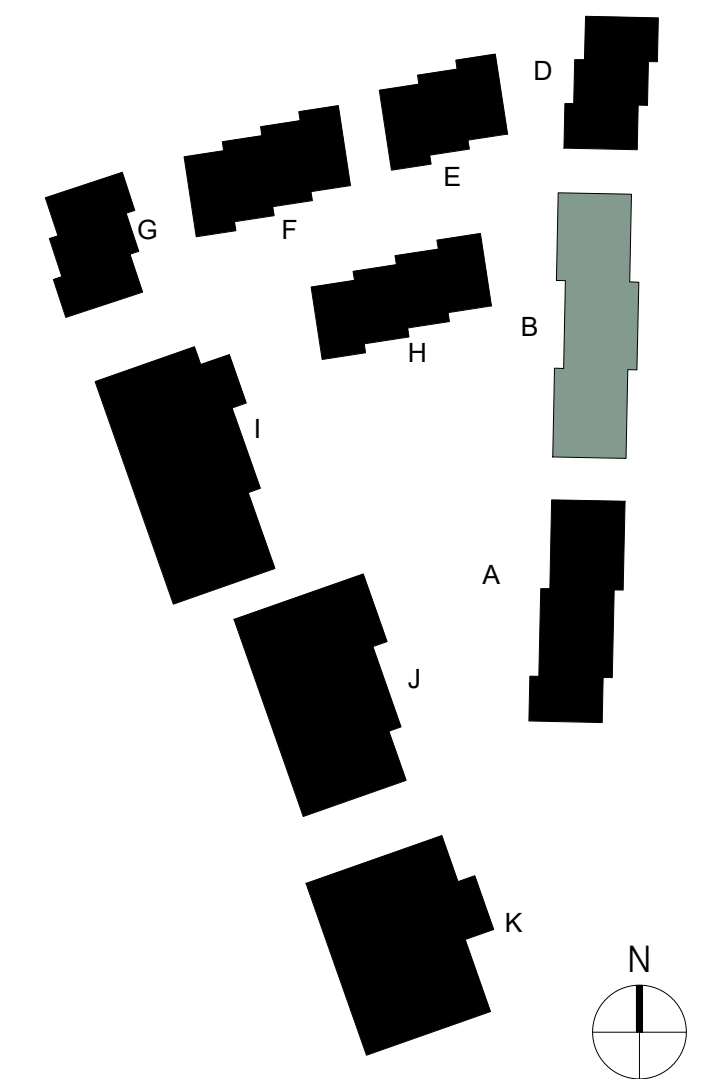

Kirkerveien 59 GNR: 8		BNR: 50		GNR/BNR: 8/50
TEGNINGSNAVN: Fasader - Rekkehus B	STATUS: Forprosjekt	TEGNINGSNUMMER: A40_02	TEGN.KONTR. SLN / KMK	REVISJON: D
DATE: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)	REV. NR. D	REV. DATO. 25.01.2023	
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBORGATA 19C 0350 OSLO 23.32.71.00	




Fasade rekkehus D øst
1 : 100

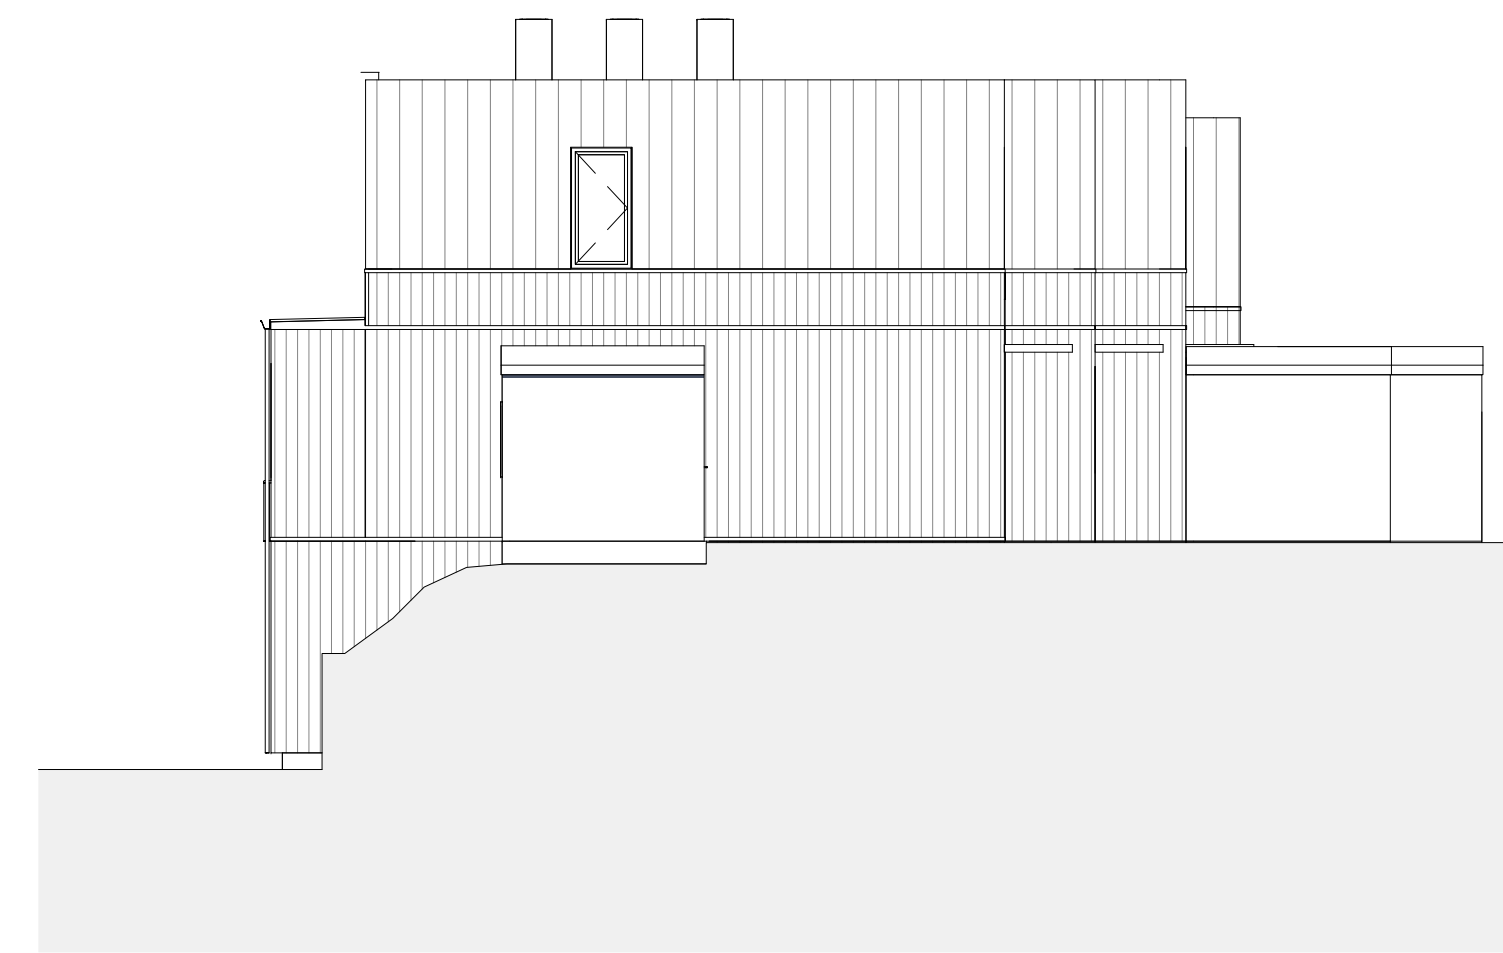


Fasade rekkehus D nord
1 : 100




Fasade rekkehus D vest
1 : 100

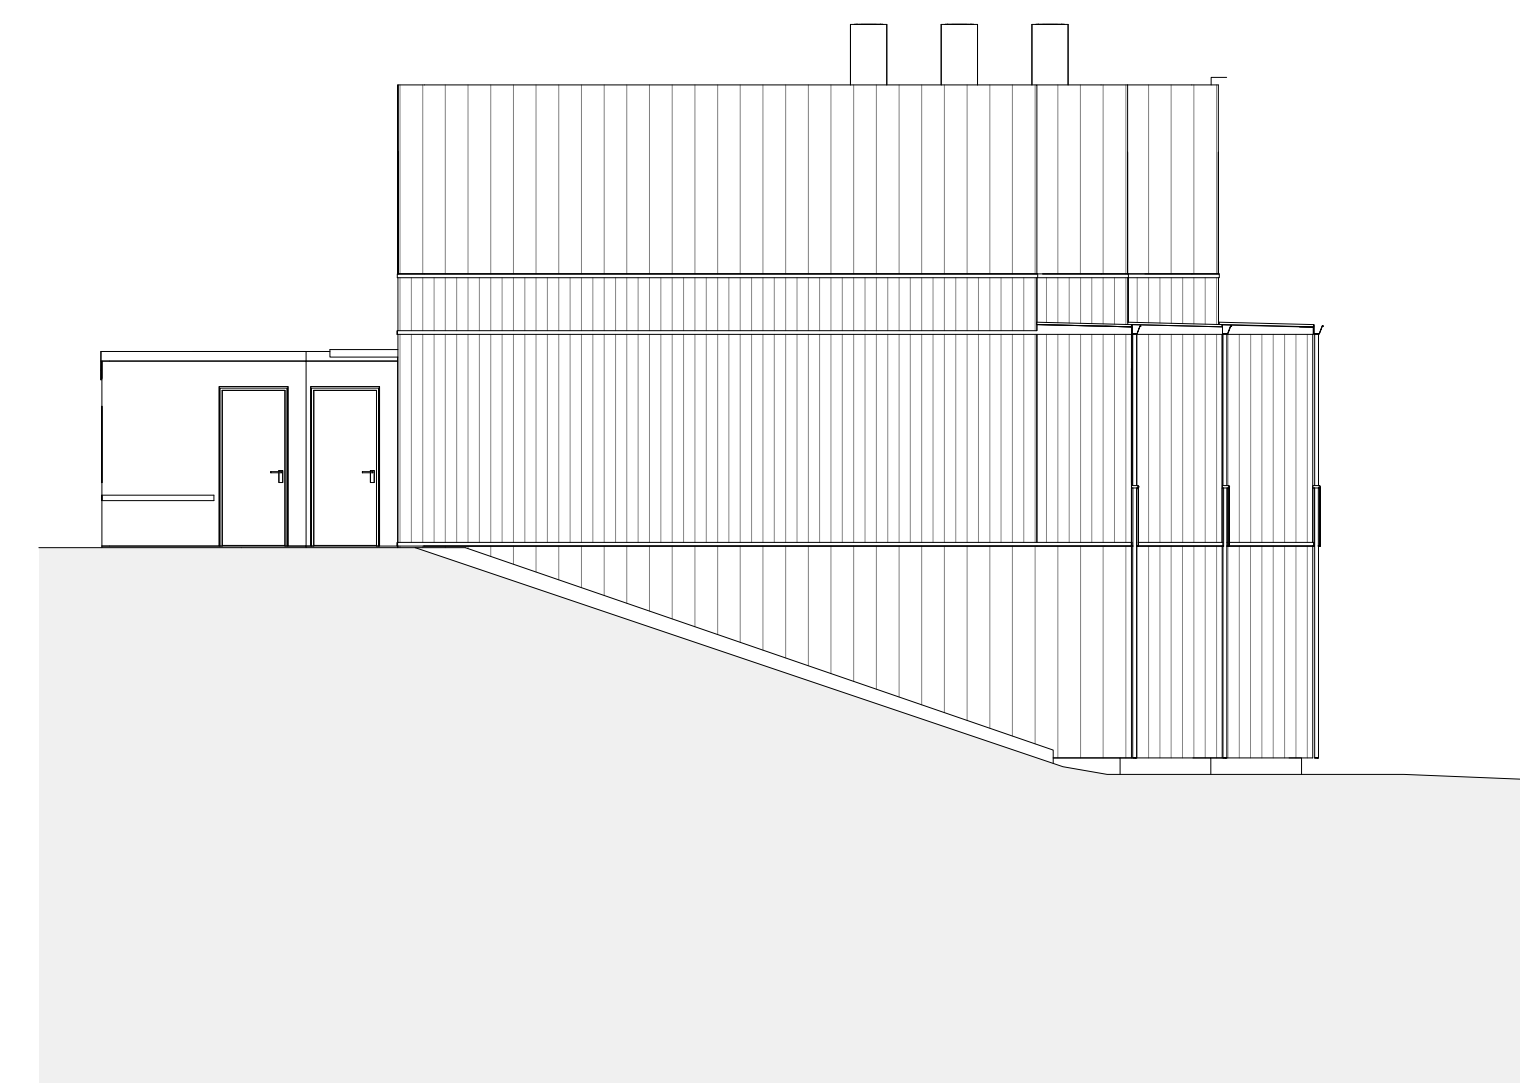


Fasade rekkehus D sør
1 : 100

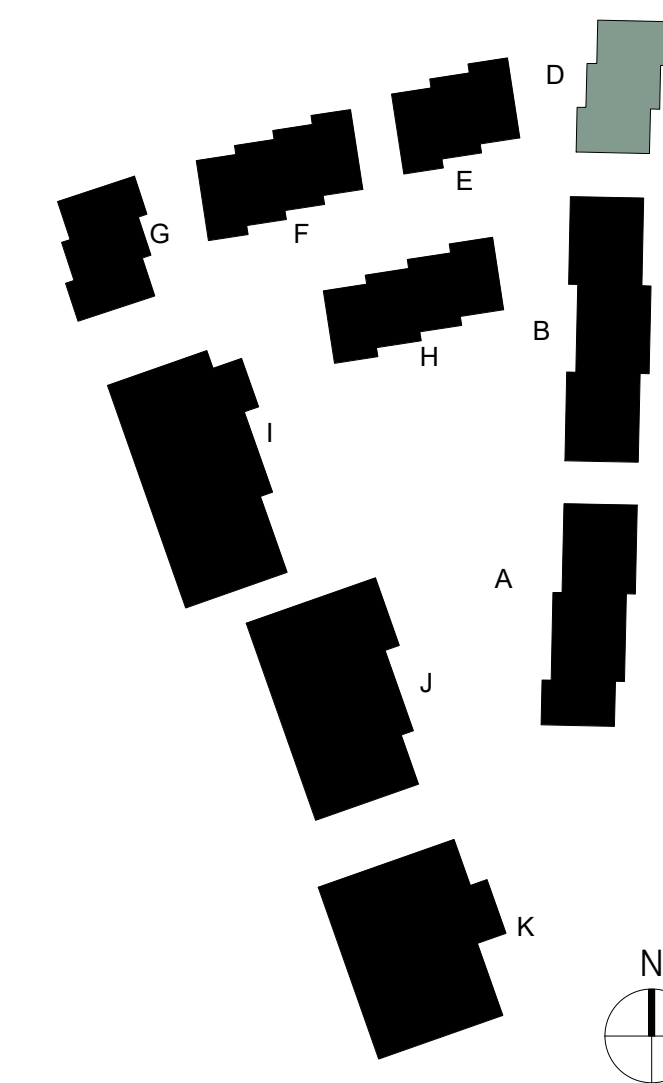


Kirkerveien 59 GNR: 8		GNR/BNR: 8/50	
BNR: 50		TEG.NAVN: Fasader - Rekkehus D	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
STATUS: Forprosjekt	TEG.NUMMER: A40_03	TEG.KONTR: SLN / KMK	REV.DATO: 25.01.2023
TILTAKSHAVER: SKANSKA		ARKITEKT: lpo	ROSENBORGATA 19C 0350 OSLO 23 32 71 00

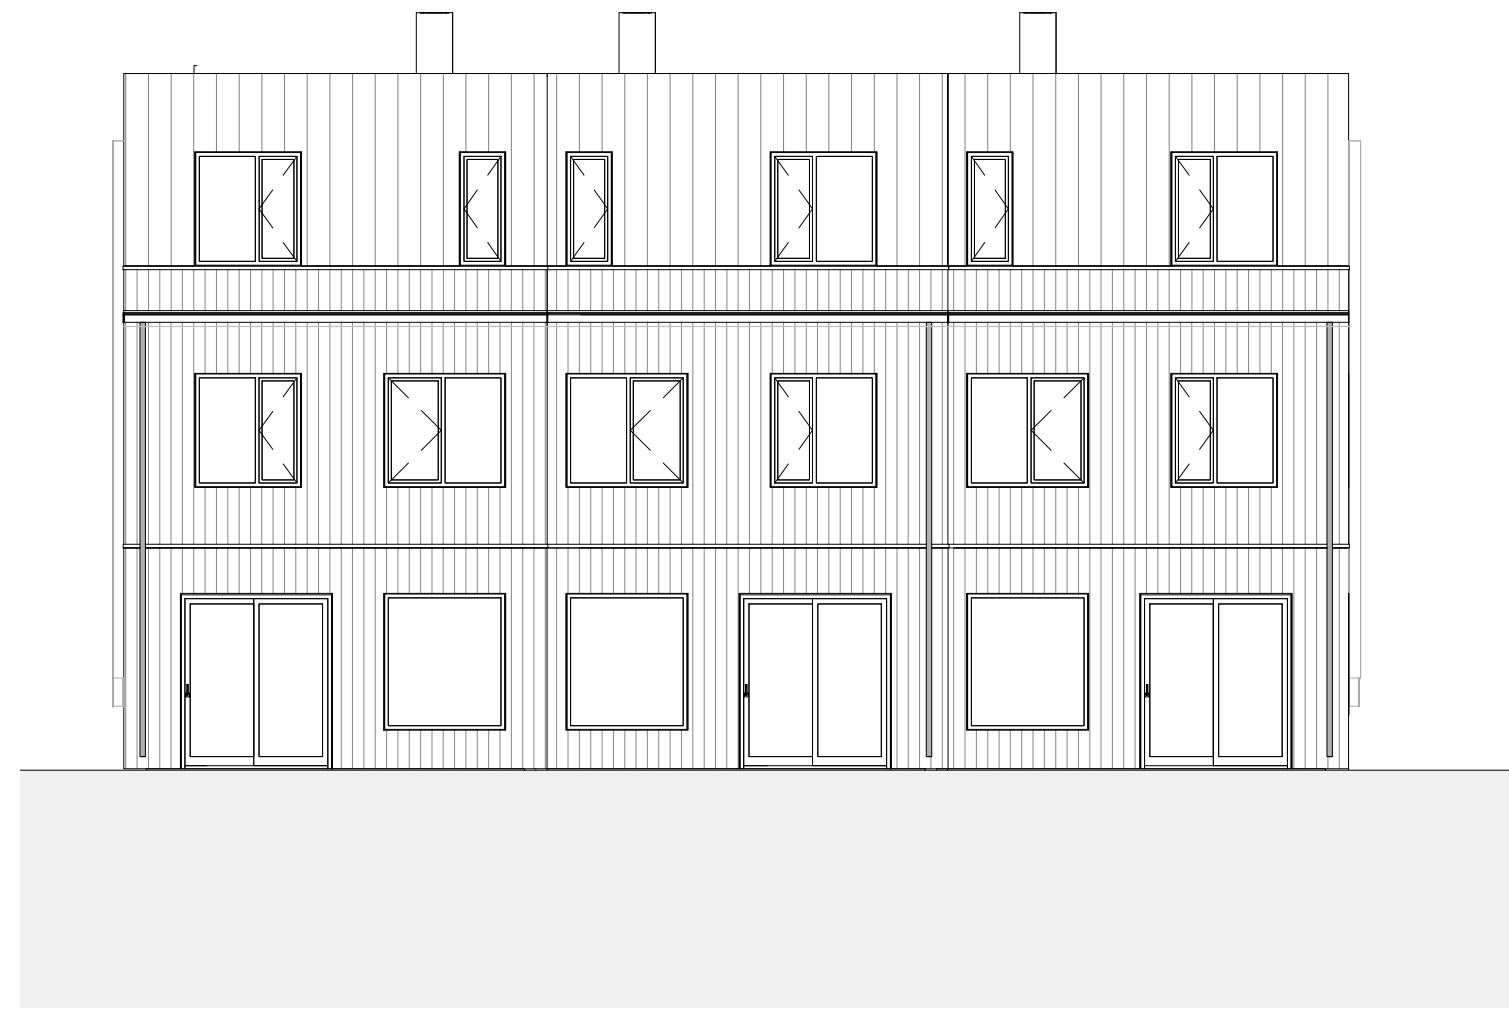


Fasade rekkehus E nord
1 : 100

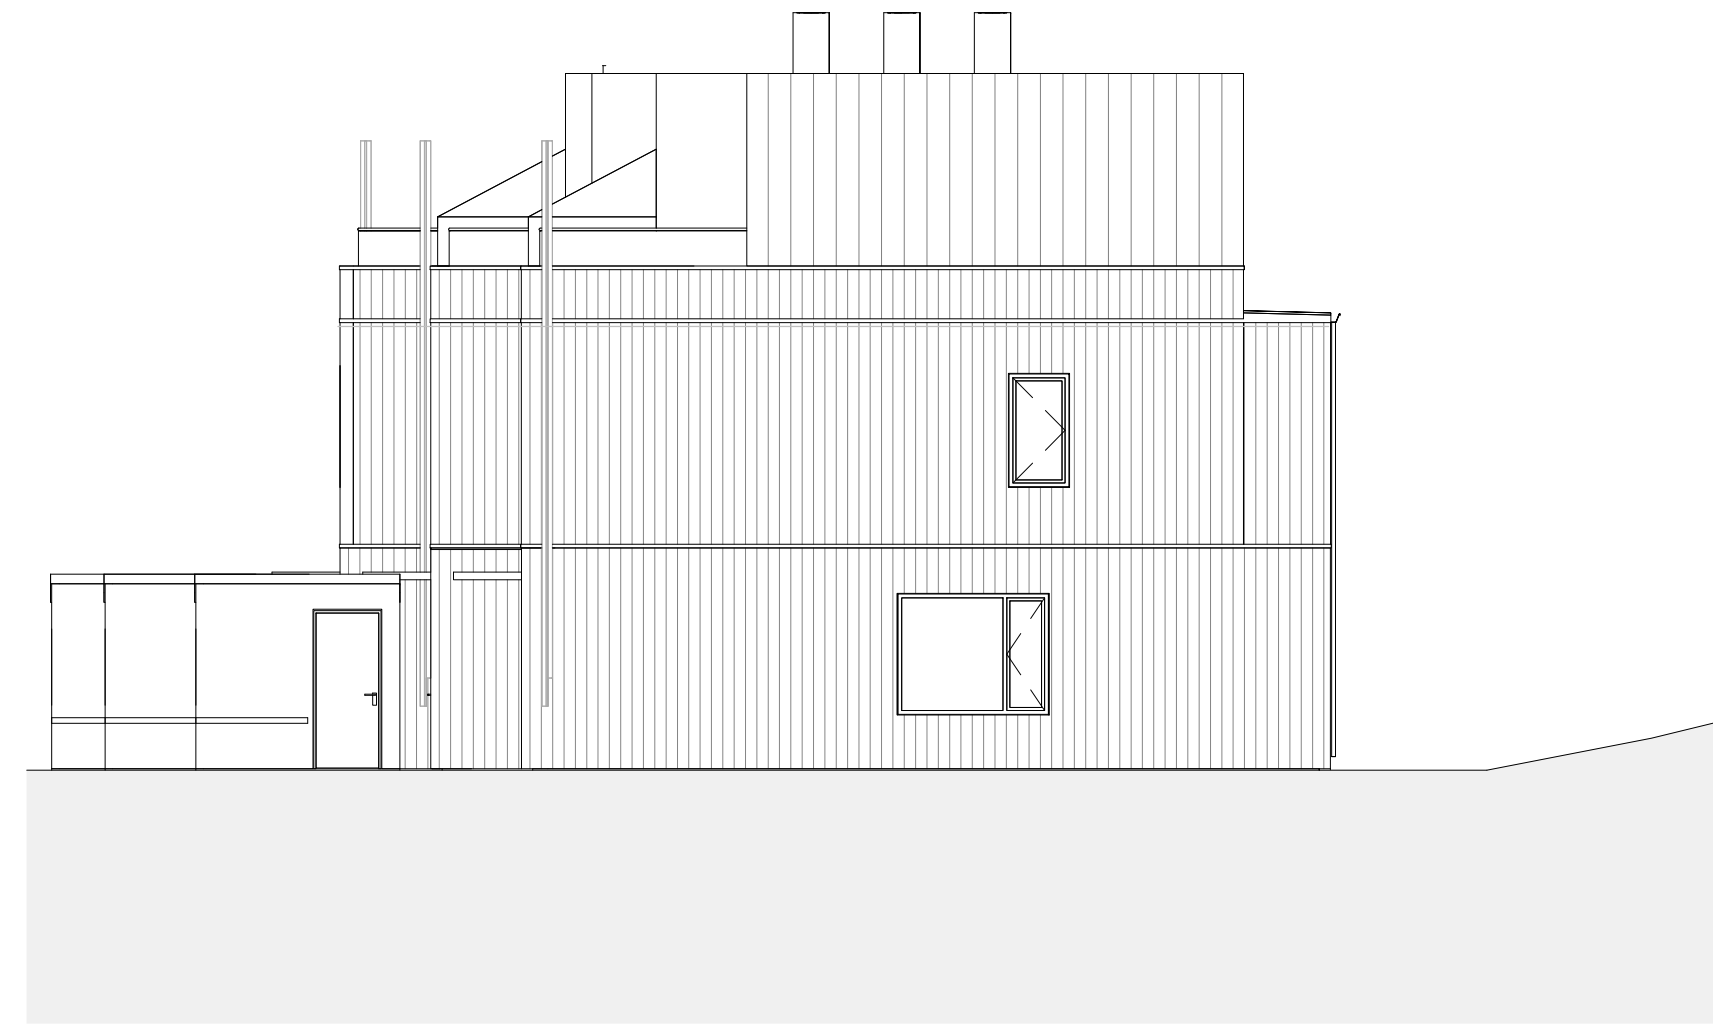


Fasade rekkehus E øst
1 : 100

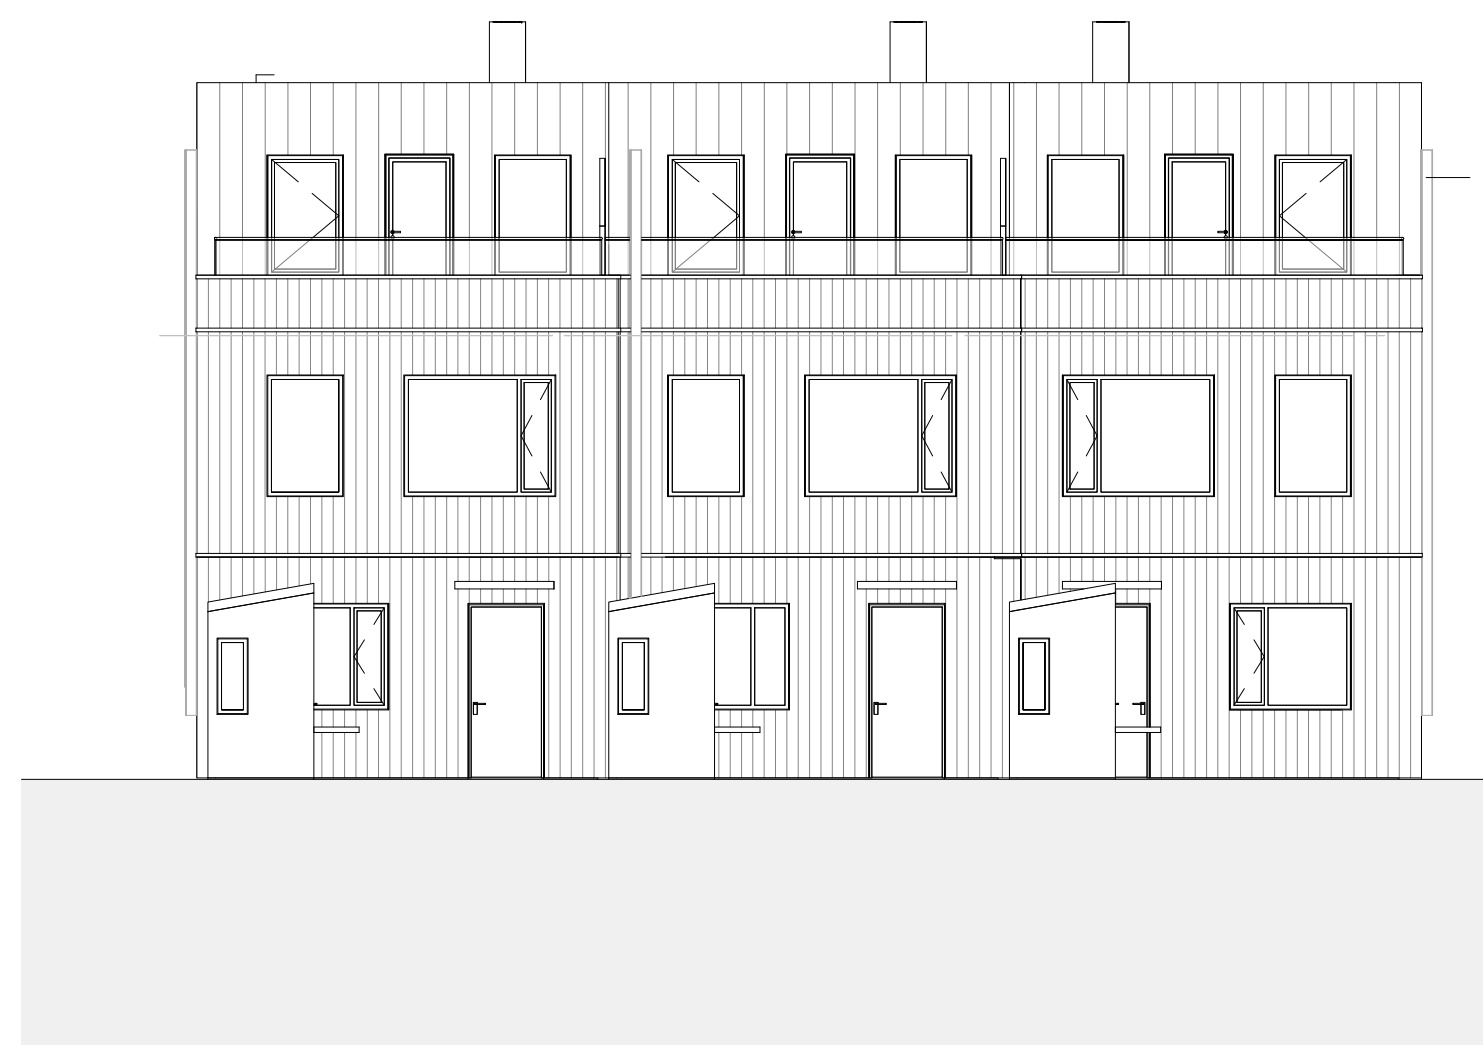


Fasade rekkehus E sør
1 : 100

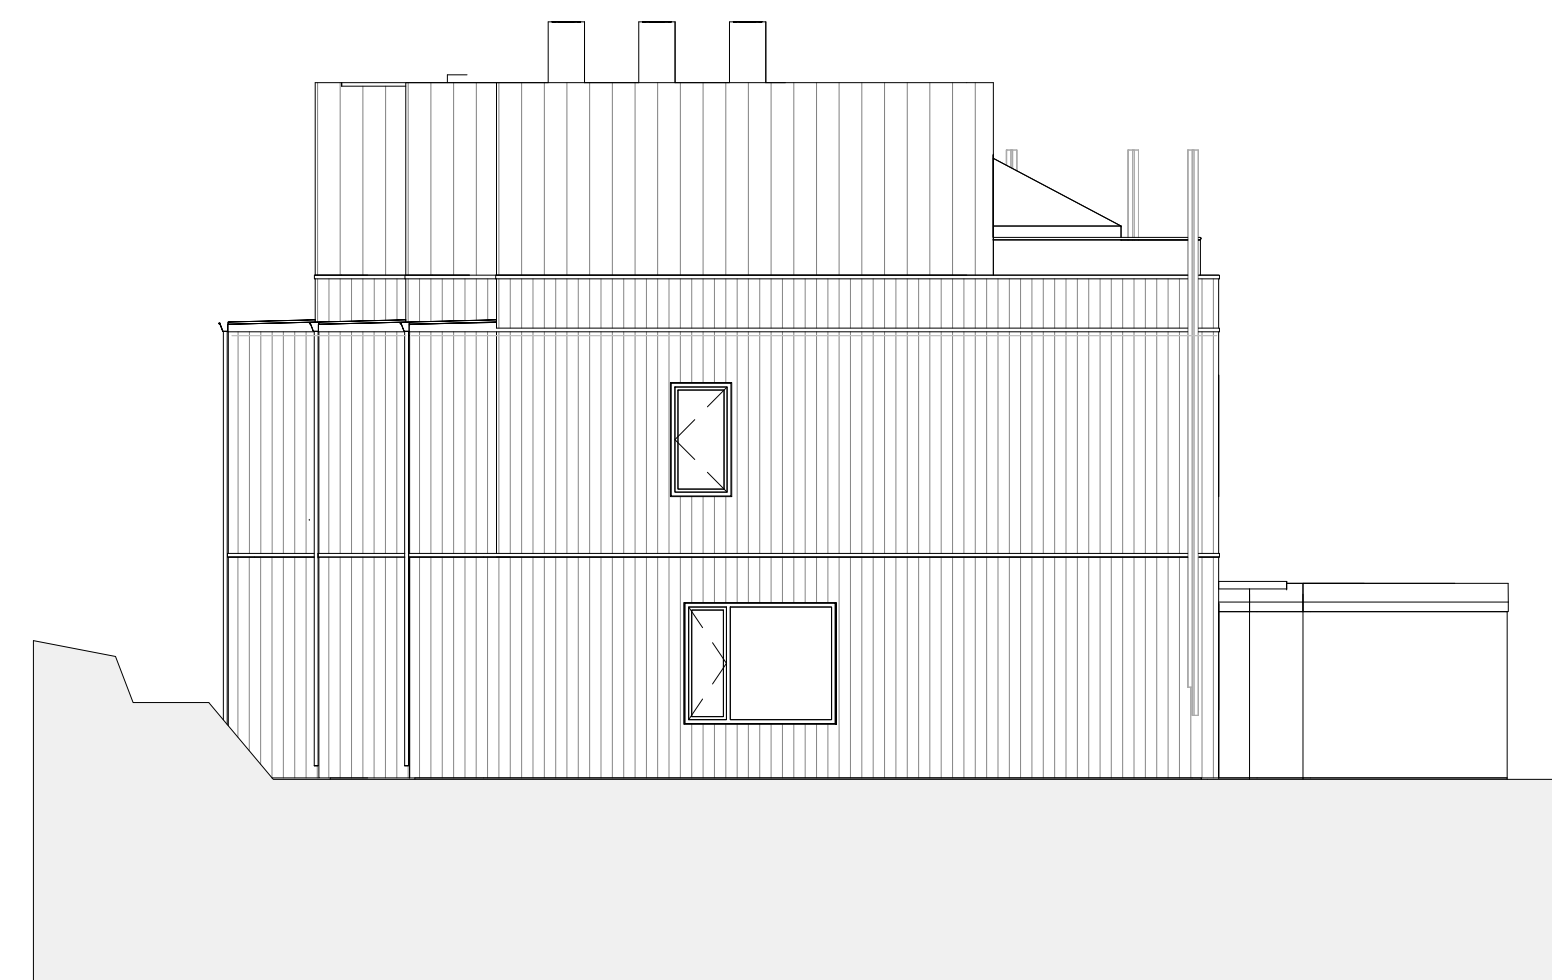


Fasade rekkehus E vest
1 : 100

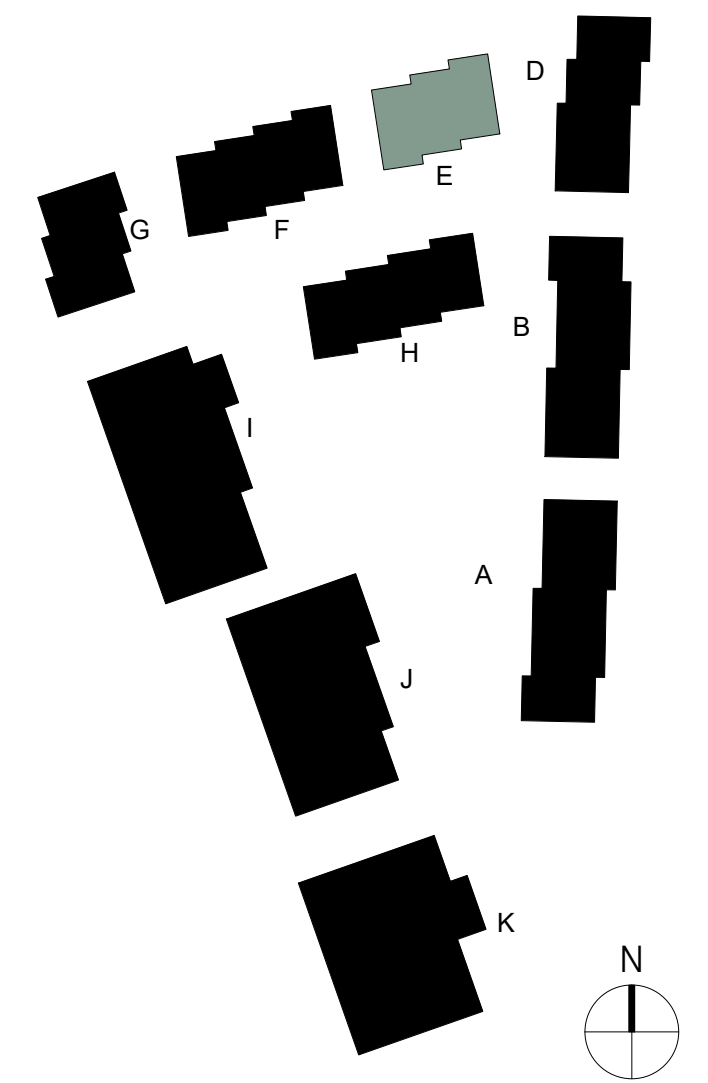


Kirkerveien 59 GNR: 8 BNR: 50		GNR/BNR: 8/50	
TEGNINGSNAVN: Fasader - Rekkehus E	DATE: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)	
STATUS: Forprosjekt	TEGNINGSNUMMER: A40_04	TEGN.KONTR. SLN / KMK	REV.NR. C
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBORGATA 19C 0350 OSLO 23.32.71.00
		REV.DATO: 25.01.2023	

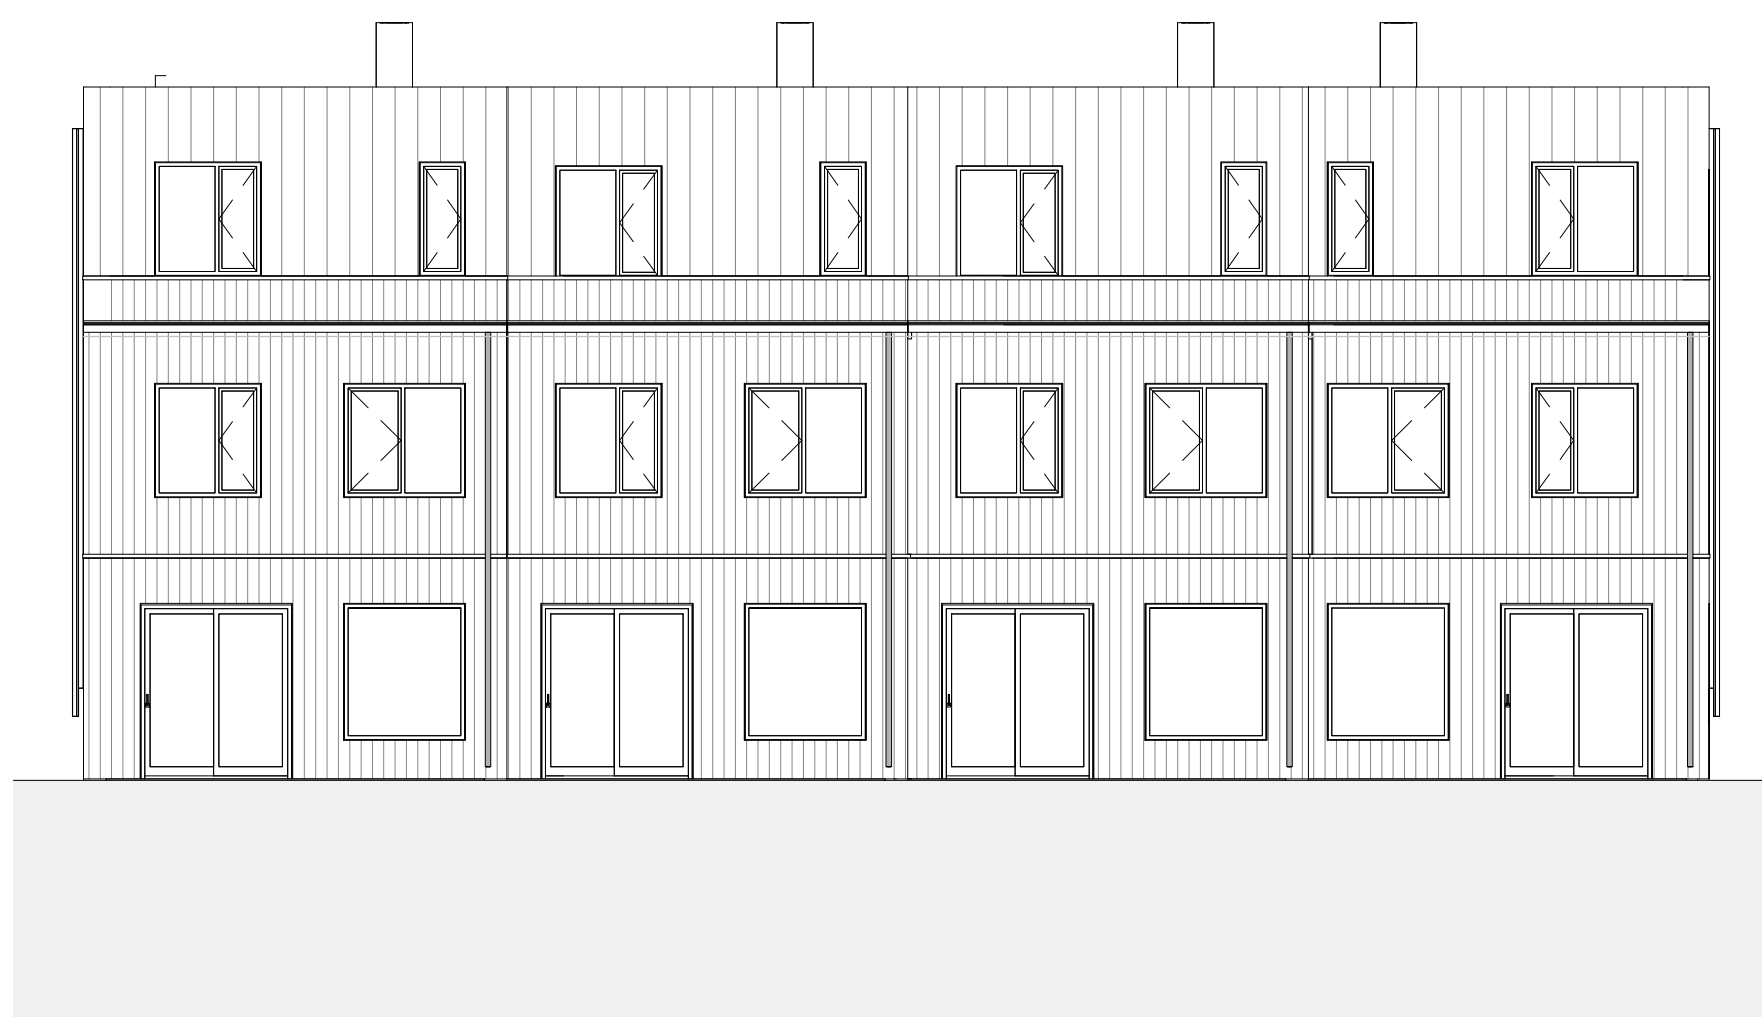


Fasade rekkehus F nord
1 : 100

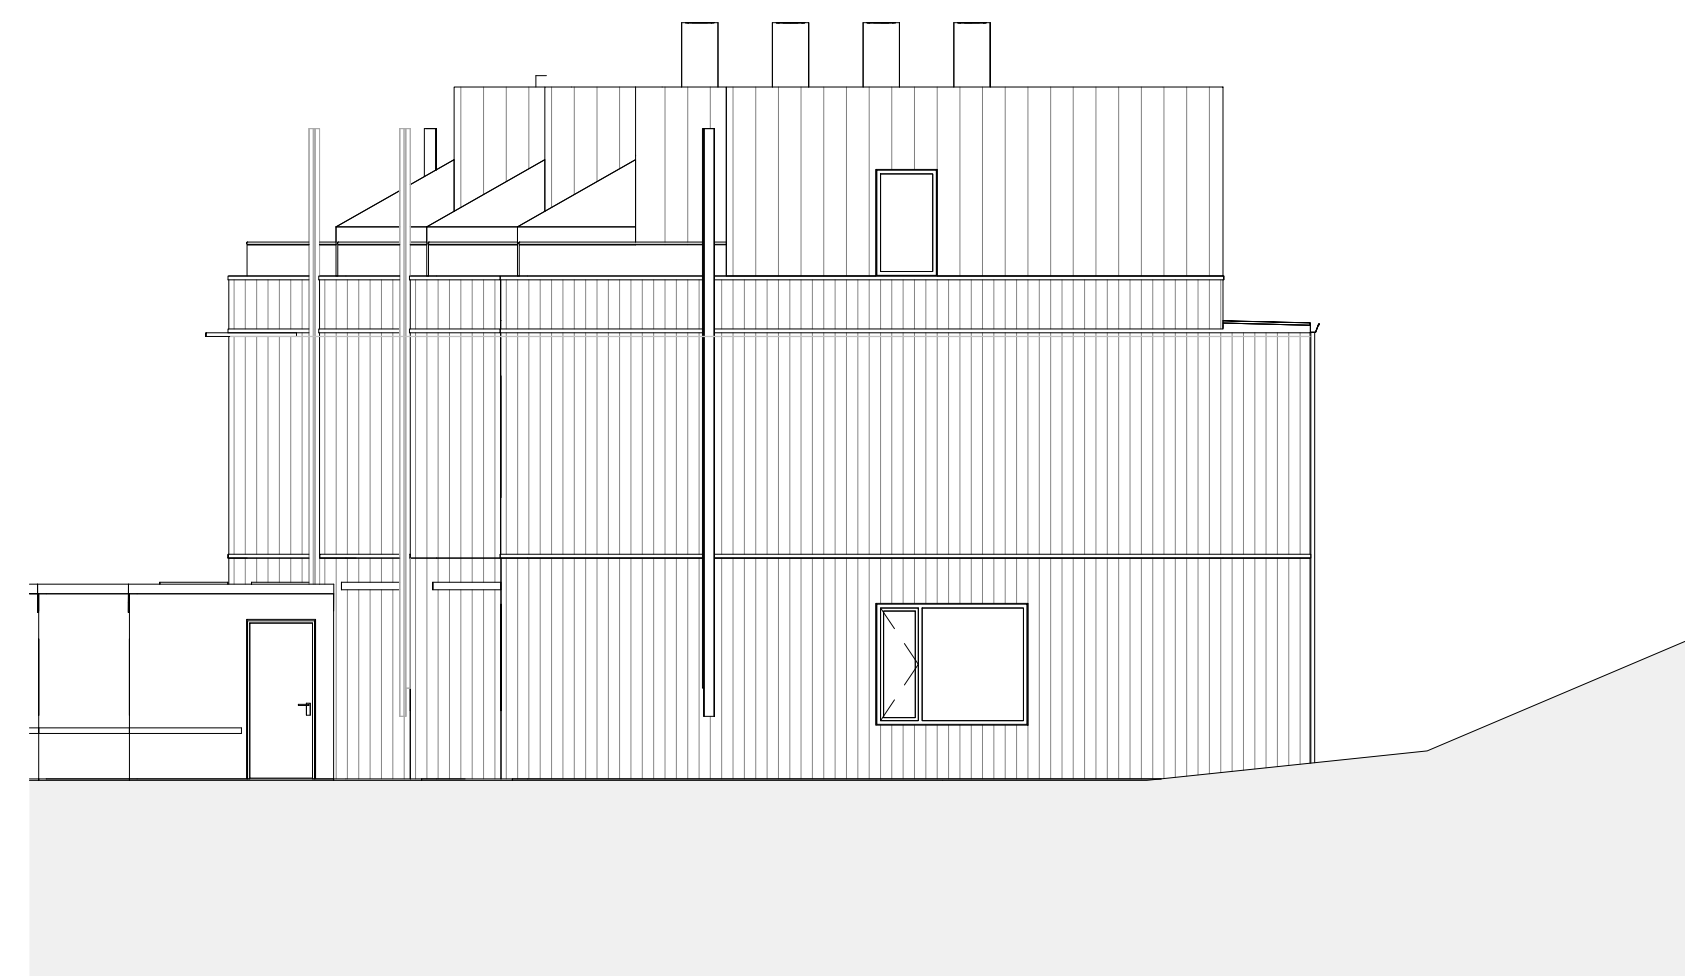


Fasade rekkehus F øst
1 : 100

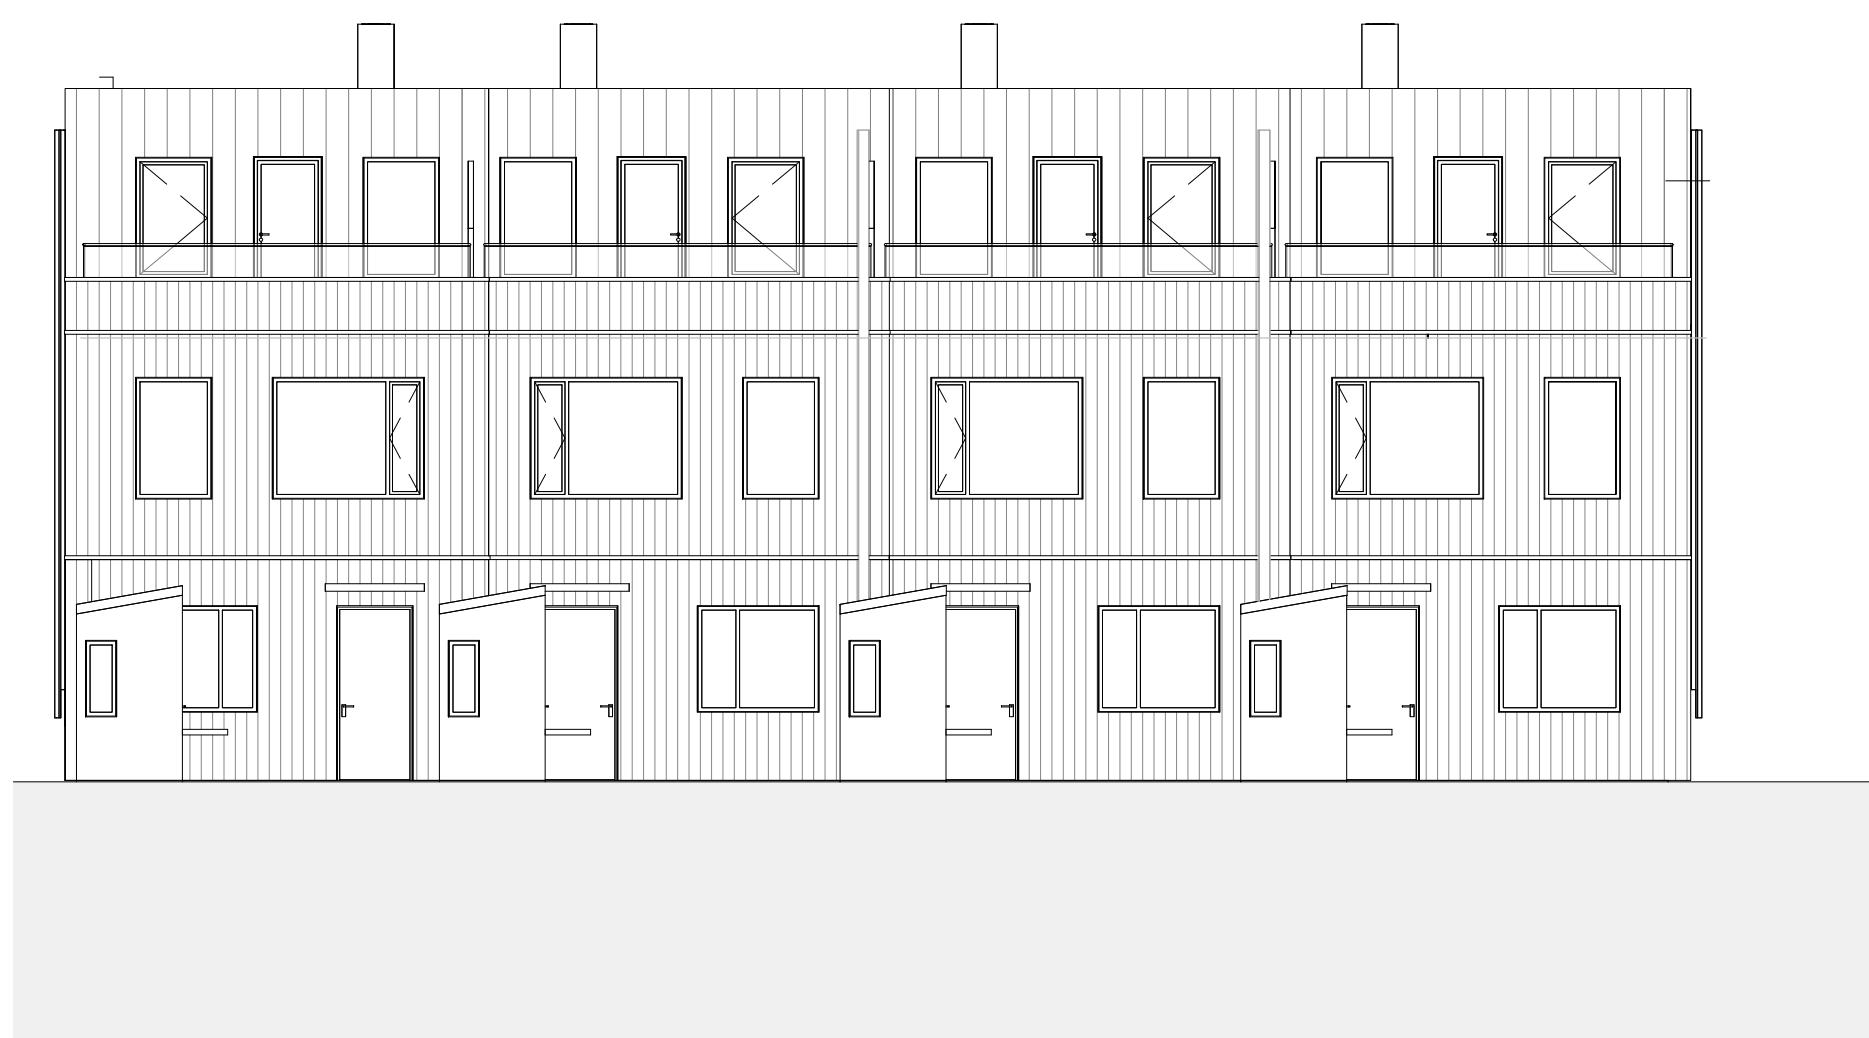

Fasade rekkehus F sør
1 : 100

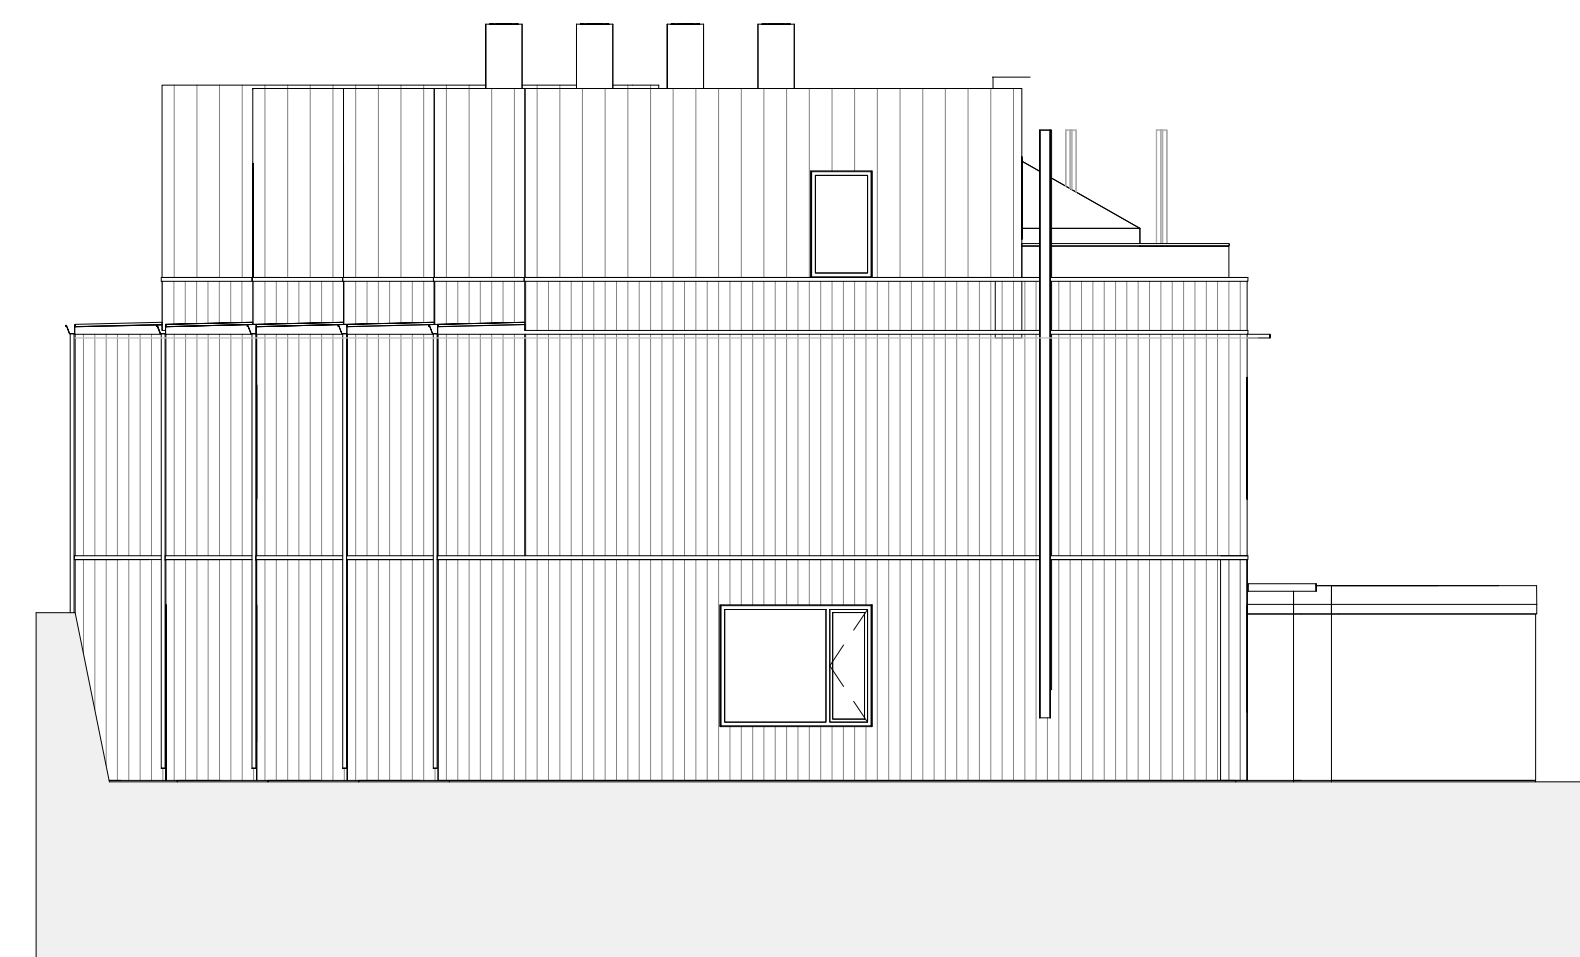


Fasade rekkehus F vest
1 : 100

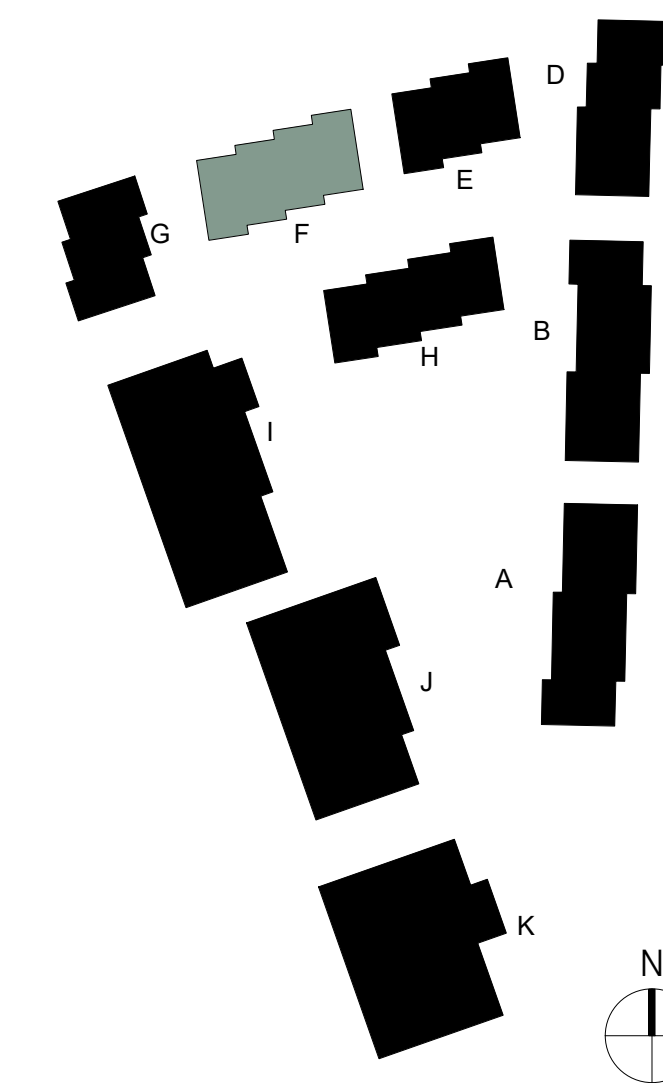

Kirkveien 59 GNR: 8		GNR/BNR: 8/50	
BNR: 50		TEG. DATO: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
TEG. NAVN: Fasader - Rekkehus F			
STATUS: Forprosjekt	TEG. NUMMER: A40_05	TEG. KONTR. SLN / KMK	REV. NR. C
		REV. DATO: 25.01.2023	
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 03 32 71 00




Fasade rekkehus G vest
1 : 100

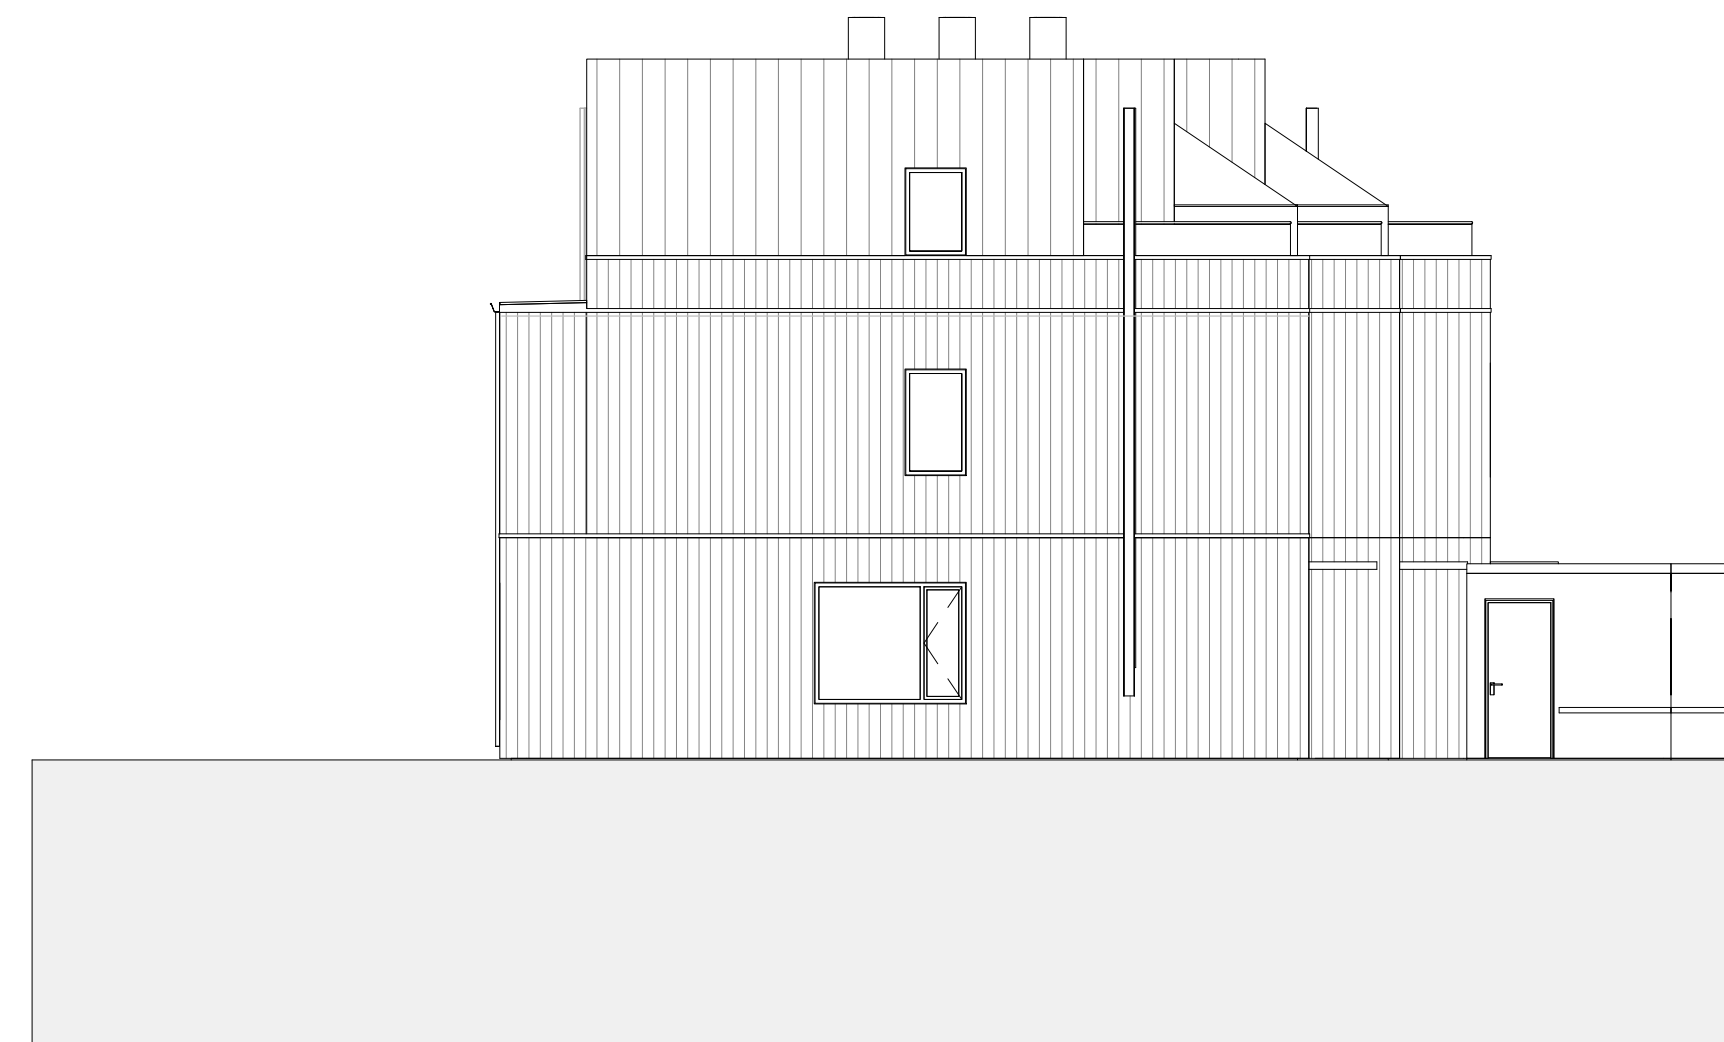


Fasade rekkehus G sør
1 : 100




Fasade rekkehus G øst
1 : 100

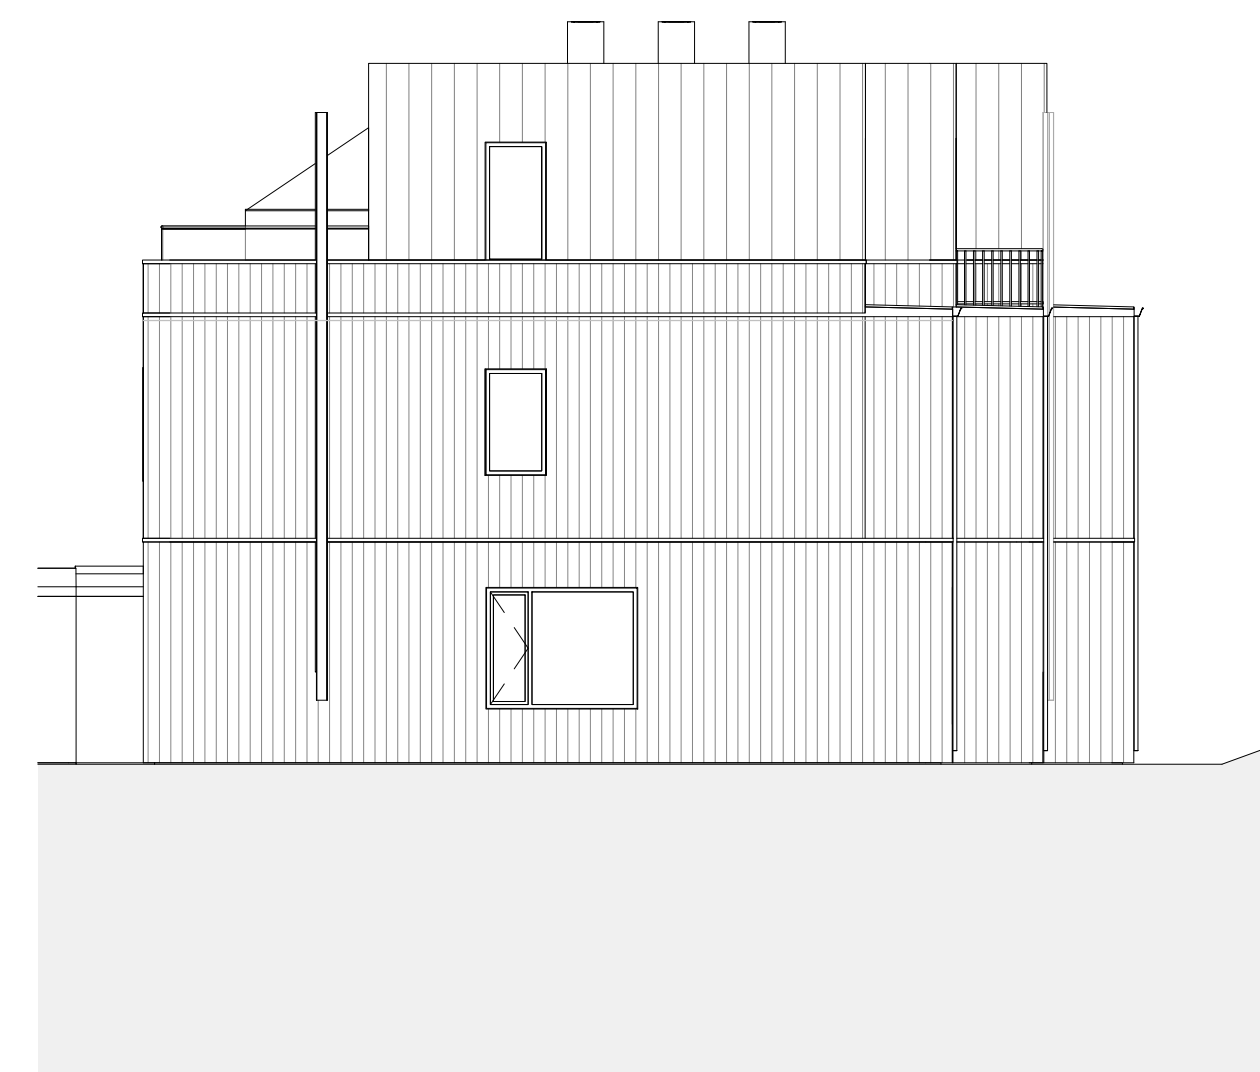


Fasade rekkehus G nord
1 : 100

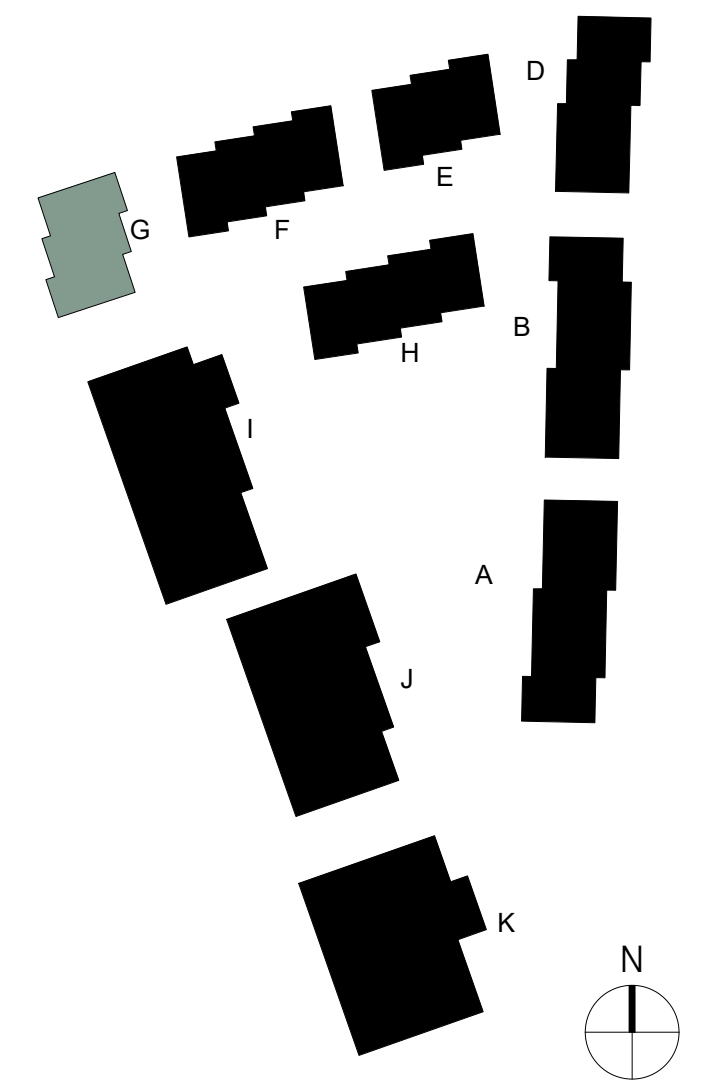


Kirkerveien 59 GNR: 8		GNR/BNR: 8/50	
BNR: 50		TEG. DATO: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
TEG. NAVN: Fasader - Rekkehus G		TEG. KONTR.:	REV. NR.:
STATUS: Forprosjekt	TEG. NUMMER: A40_06	SLN / KMK	C
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 03 32 71 00
		REV. DATO: 25.01.2023	

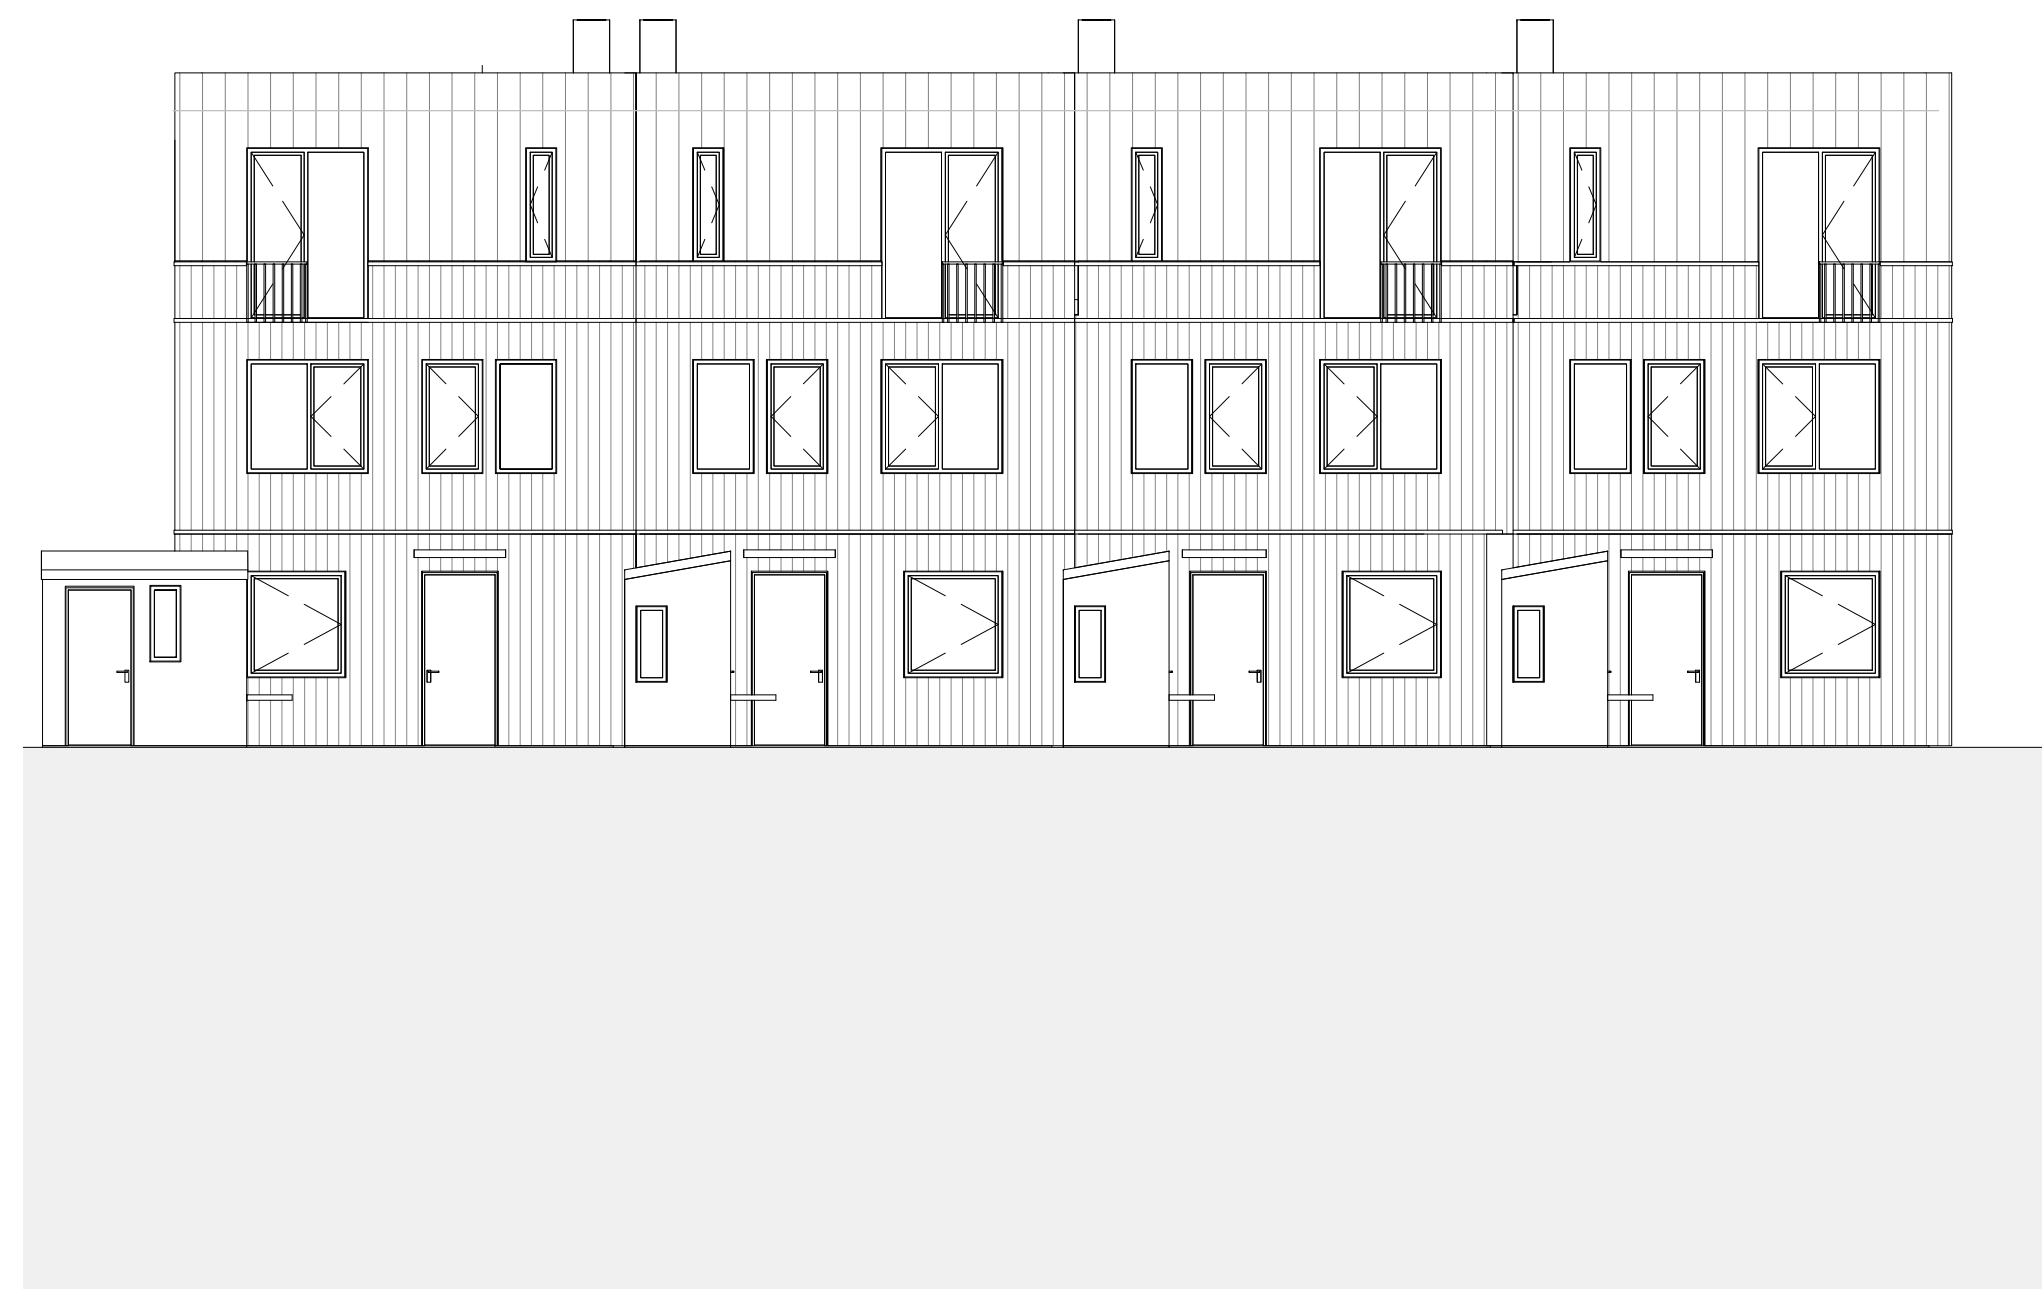


Fasade rekkehus H nord
1 : 100

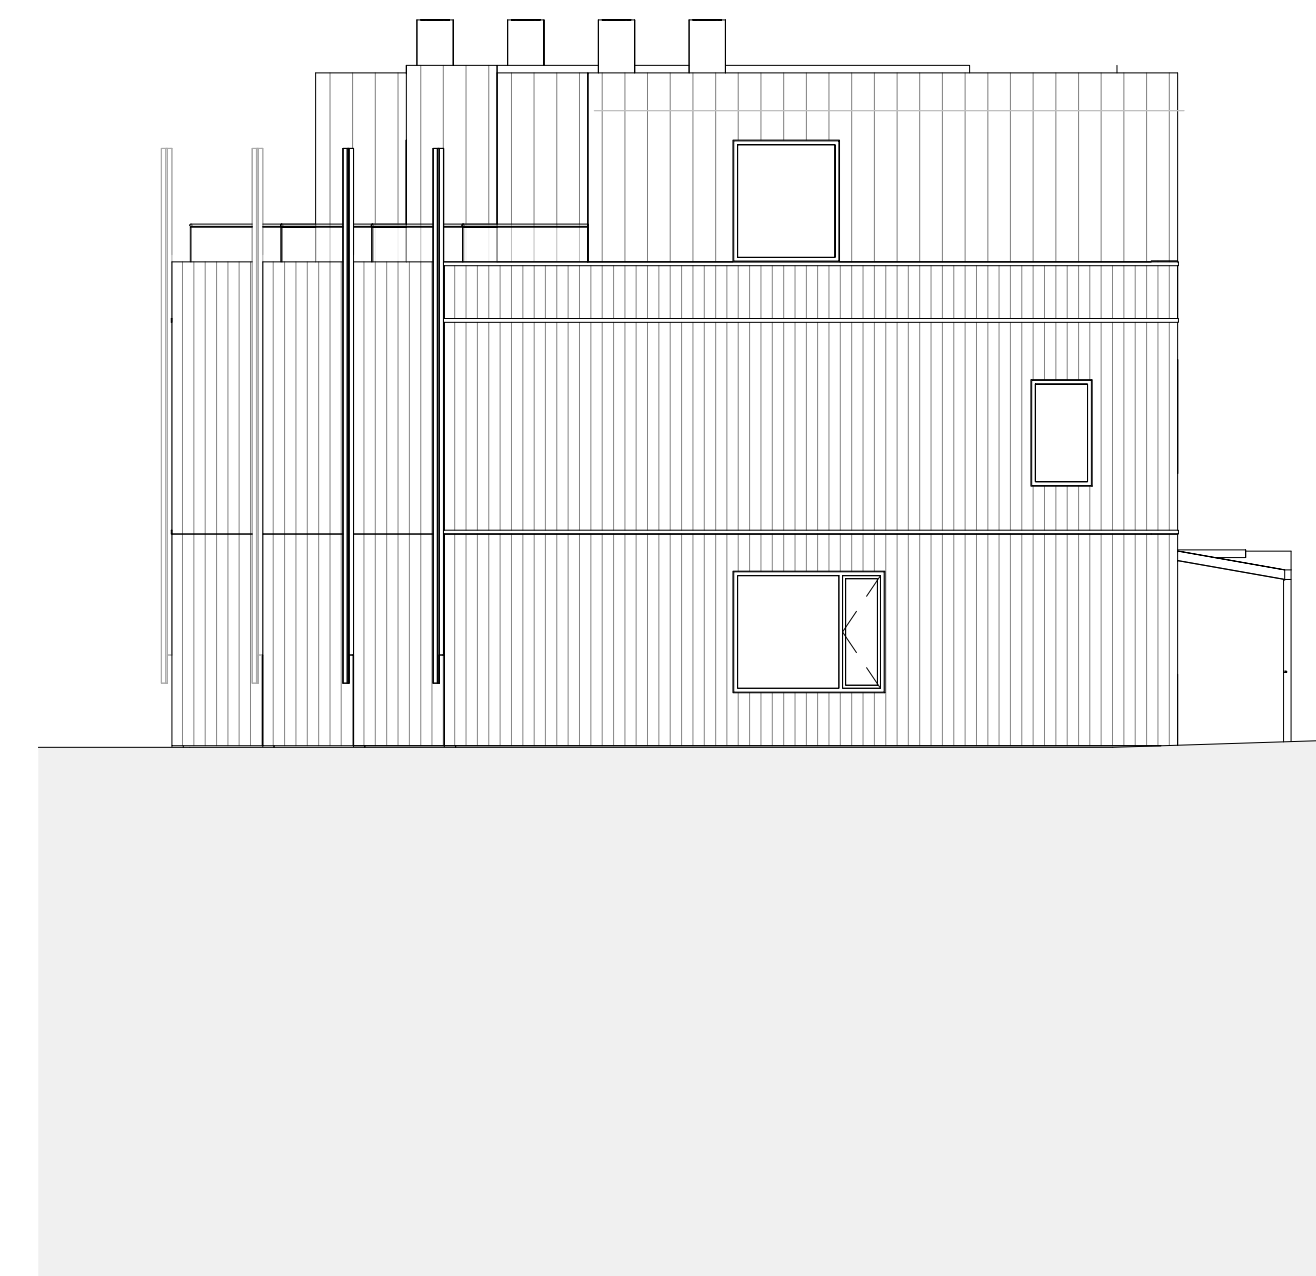


Fasade rekkehus H øst
1 : 100

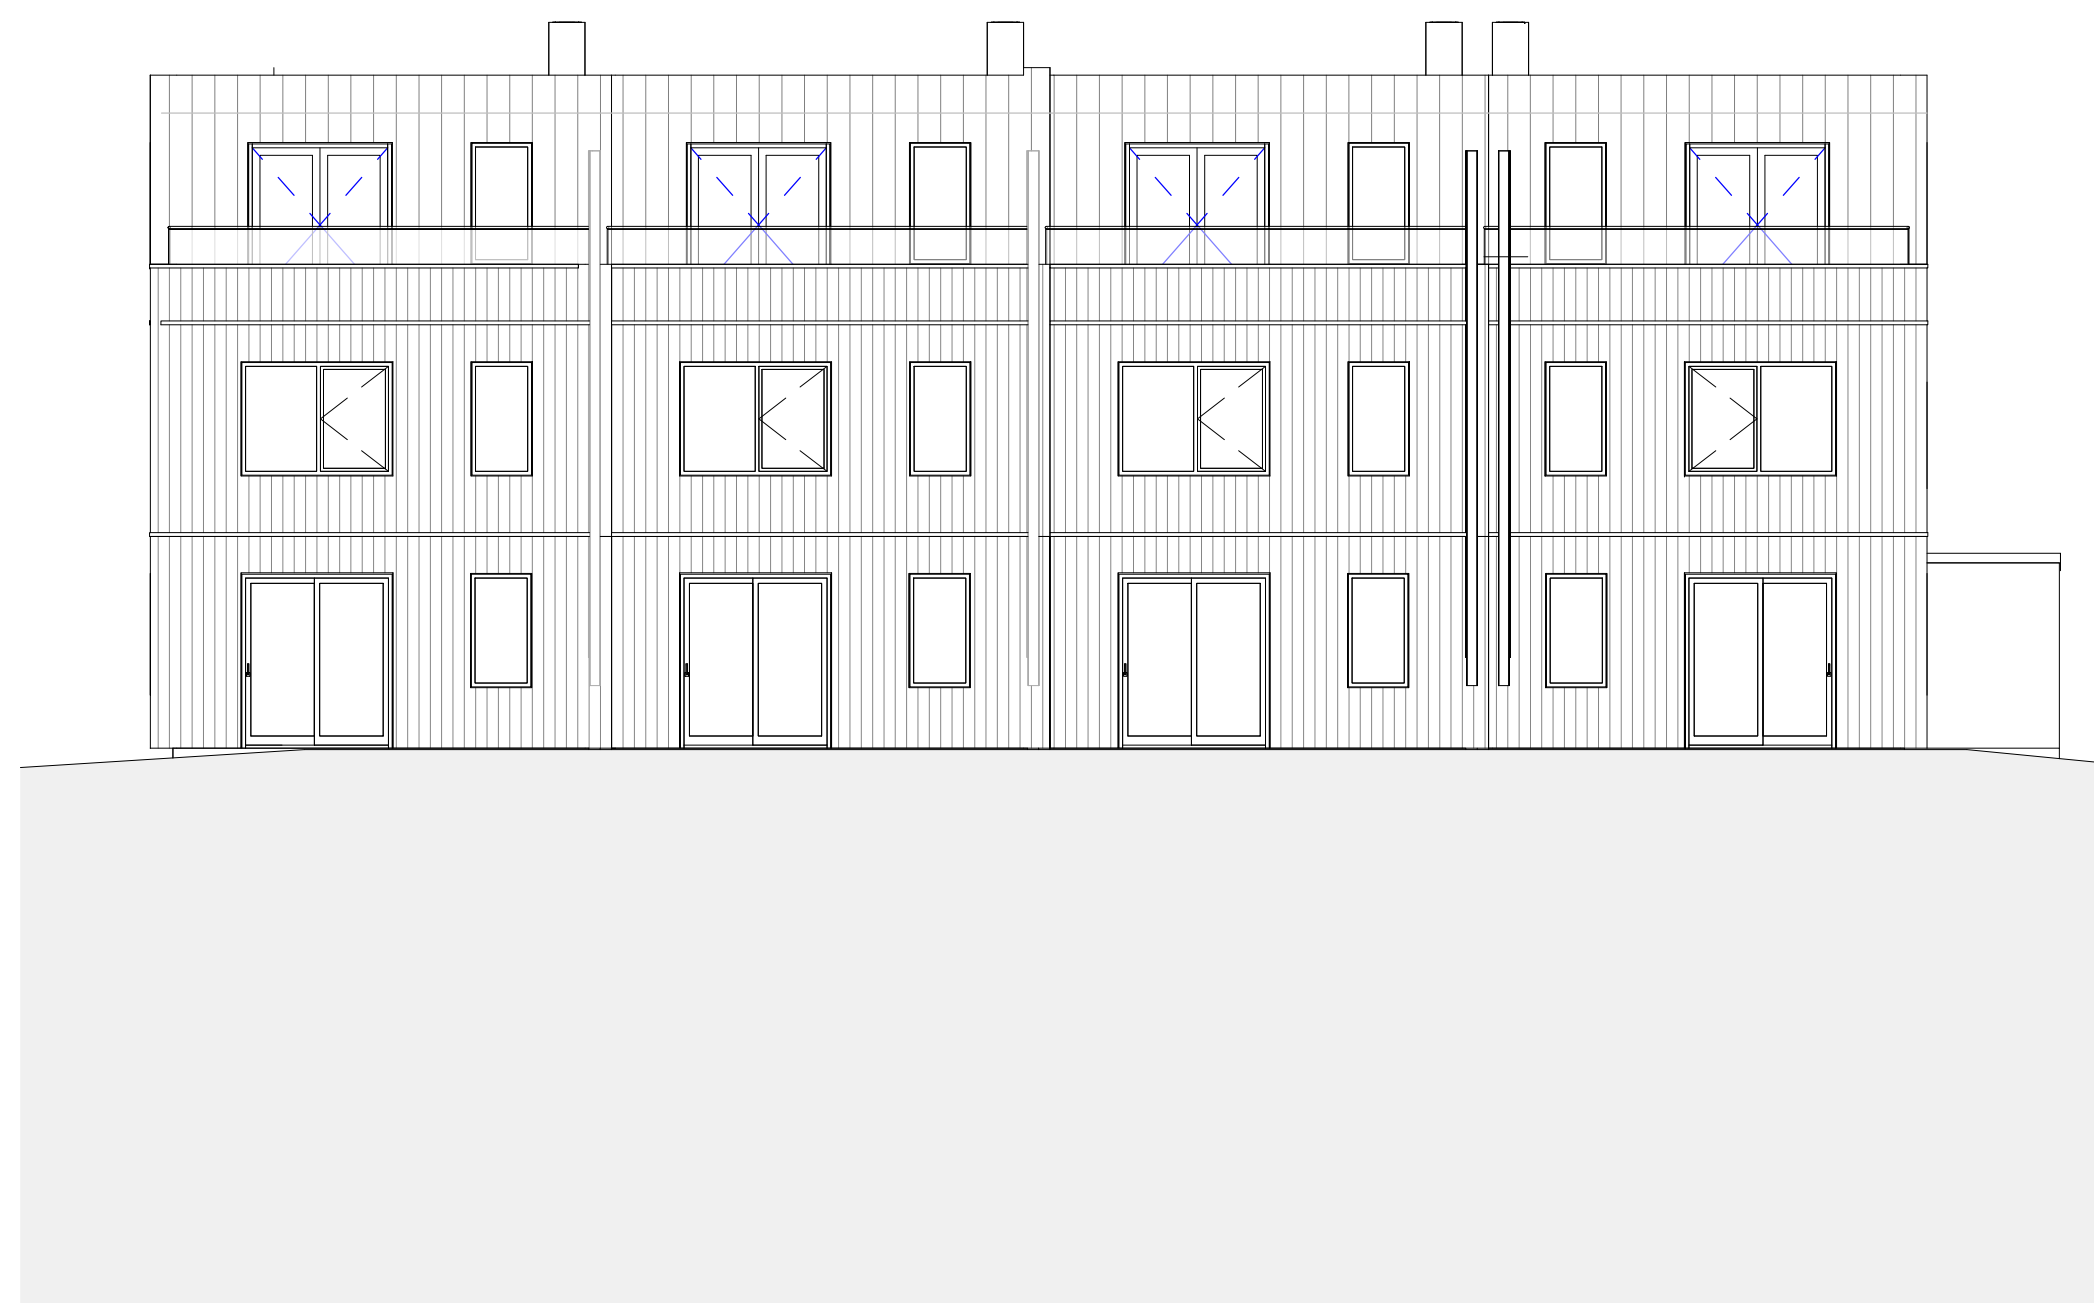

Fasade rekkehus H sør
1 : 100

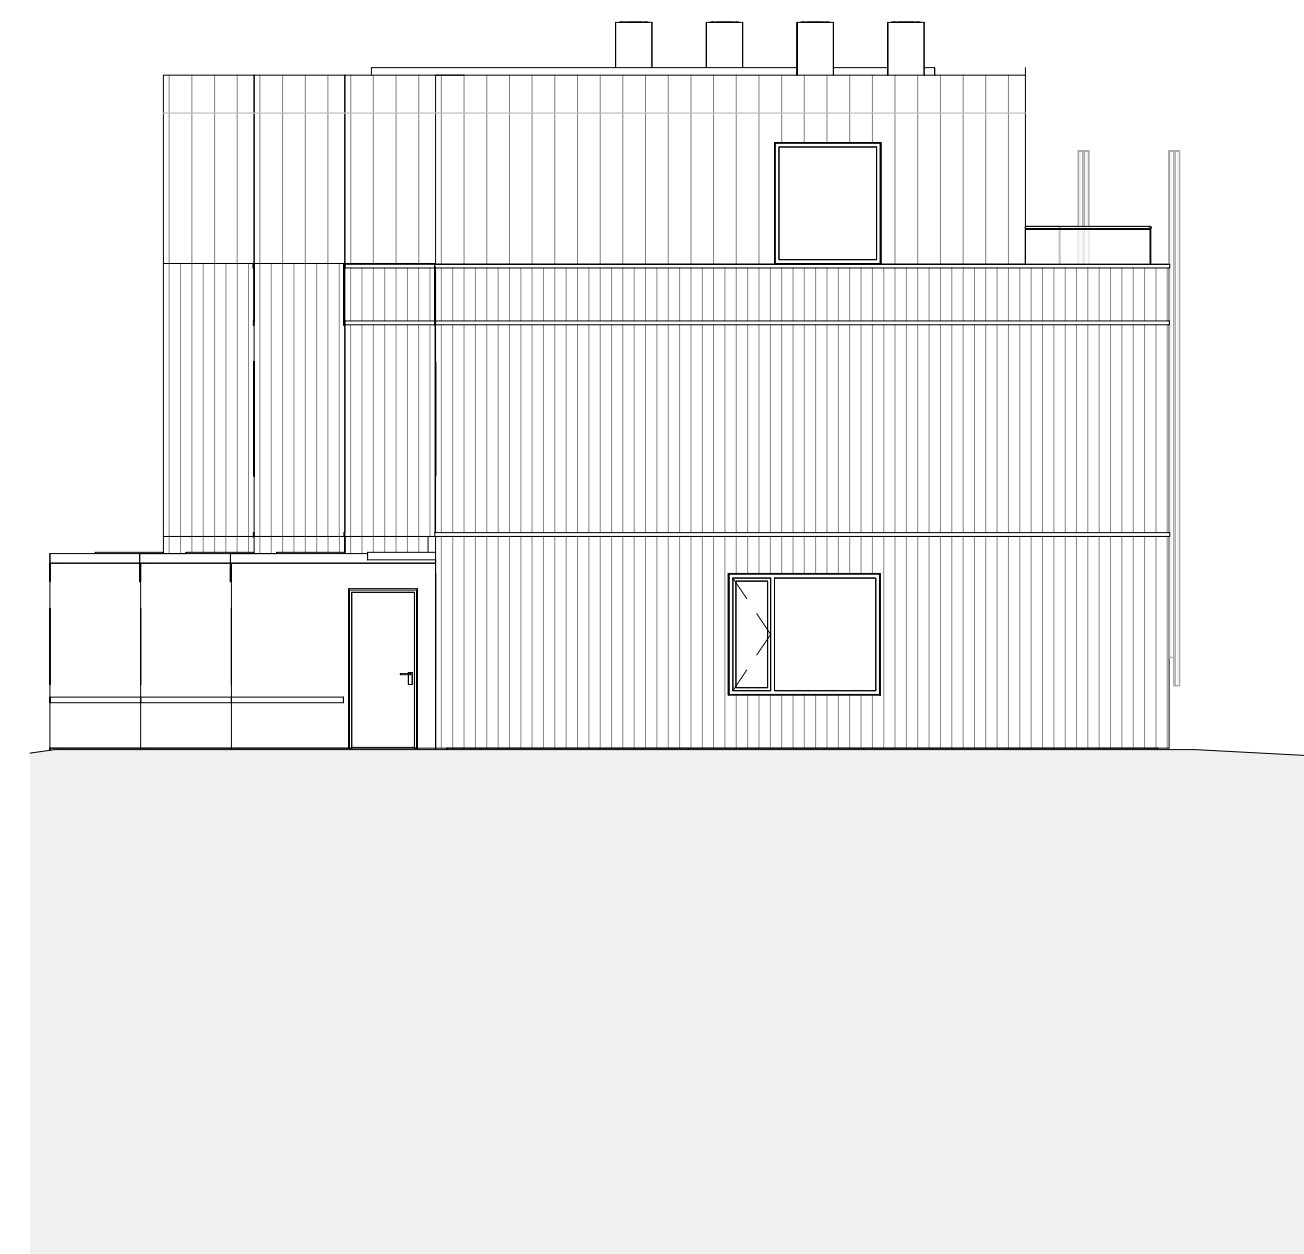

Fasade rekkehus H vest
1 : 100

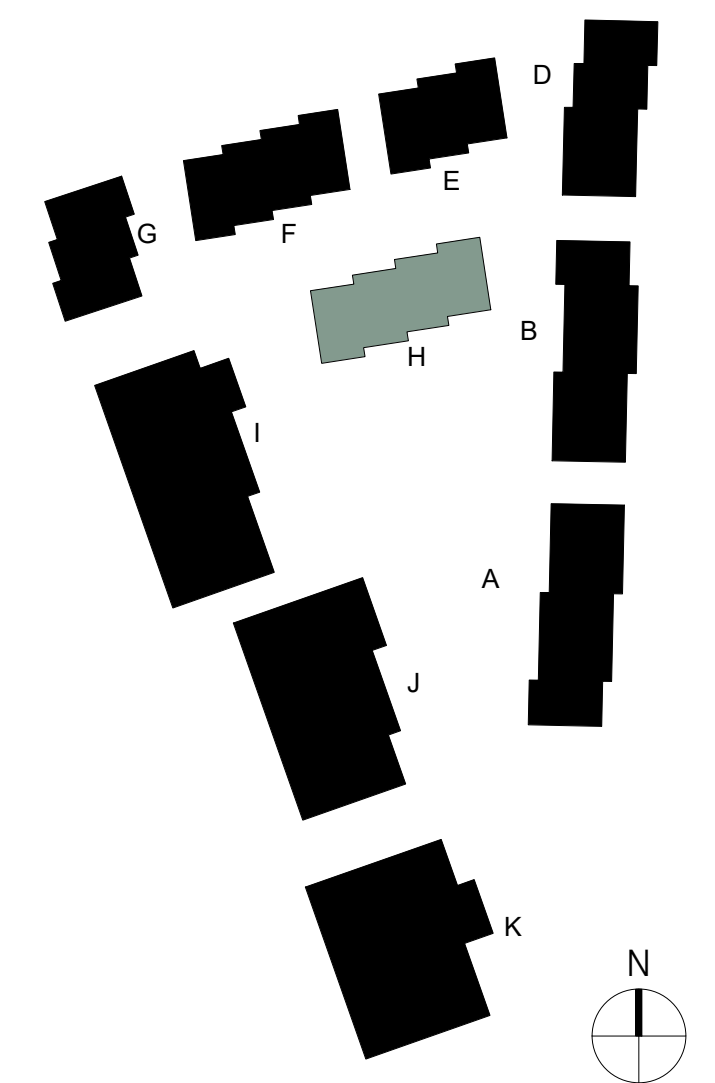

Kirkveien 59 GNR: 8		GNR/BNR: 8/50	
BNR: 50		TEG. DATO: 01. juli 2022	SKALA: 1:100 (A1) 1:200 (A3)
TEG. NAVN: Fasader - Rekkehus H			
STATUS: Forprosjekt	TEG. NUMMER: A40_07	TEG. KONTR. SLN / KMK	REV. NR. C
TILTAKSHAVER: SKANSKA Bygghandling		ARKITEKT: lpo ARKITEKTER	ROSENBERGATA 19C 0350 OSLO 23.32.71.00
		REV. DATO: 25.01.2023	

NØKKELTALL



Leiligheter

Leilighetsnr.	Etasje	Antall rom	Antall soverom	BRA m2	P-Rom m2	Felleskost/mnd.	Kjøpers omkost.
I-101	1	2	1	49,1	49,1	2 577	41 430
I-102	1	3	2	65,5	65,5	3 003	54 880
I-103	1	2	1	47,2	47,2	2 527	39 870
I-104	1	4	3	125,5	123,7	4 563	104 080
I-105	1	4	3	92,7	90,3	3 710	77 180
J-101	1	4	3	103,1	97,5	3 981	85 710
J-102	1	4	3	119,3	111,9	4 402	98 990
J-103	1	2	1	48,5	48,5	2 561	40 940
J-104	1	4	3	104,5	100	4 017	86 860
K-101	1	2	1	49,9	47,7	2 597	42 080
K-102	1	4	3	98,9	97,1	3 871	82 260
K-103	1	4	3	101,8	98,3	3 947	84 640
K-104	1	4	3	80,1	75	3 383	66 850
I-201	2	3	2	70,6	67,7	3 136	59 060
I-202	2	4	3	105,2	104,3	4 035	87 430
I-203	2	4	3	124,1	122,3	4 527	102 930
I-204	2	4	3	92,7	90,3	3 710	77 180
J-201	2	2	1	41,4	41,4	2 376	35 110
J-202	2	3	2	70,7	67,9	3 138	59 140
J-203	2	4	3	104,5	103,6	4 017	86 860
J-204	2	4	3	107,9	104,8	4 105	89 640
J-205	2	2	1	49,1	49,1	2 577	41 430
K-201	2	2	1	49,9	49,9	2 597	42 080
K-202	2	4	3	99	97,2	3 874	82 350
K-203	2	4	3	102,2	98,7	3 957	84 970
K-204	2	4	3	94	92,6	3 744	78 250
I-301	3	3	2	70,4	67,4	3 130	58 890
I-302	3	4	3	105	104,1	4 030	87 270
I-303	3	4	3	124,1	122,2	4 527	102 930
I-304	3	4	3	92,7	90,3	3 710	77 180
J-301	3	2	1	41,4	41,4	2 376	35 110
J-302	3	3	2	70,7	67,9	3 138	59 140
J-303	3	4	3	104,5	103,6	4 017	86 860
J-304	3	4	3	107,7	104,3	4 100	89 480
J-305	3	2	1	49,1	49,1	2 577	41 430
K-301	3	3	2	71,1	67,7	3 149	59 470
K-302	3	4	3	124,6	123,7	4 540	103 340
K-303	3	4	3	101,1	94,9	3 929	84 070
I-401	4	4	3	105,7	102,8	4 048	87 840
I-402	4	4	3	115,7	105,5	4 308	96 040
I-403	4	3	2	82,8	80,4	3 453	69 060
J-401	4	4	3	137,5	133,9	4 875	113 920
J-402	4	4	3	131,6	127,3	4 722	109 080

Rekkehus

Leilighetsnr.	Antall rom	Antall soverom	BRA m2	P-Rom m2	Felleskost / mnd.	Kjøpers omkost.
A1	6	4	144	136,5	3 316	119 250
A2	6	4	144	136,5	3 316	119 250
A3	6	4	144	136,5	3 316	119 250
A4	6	4	144	136,5	3 316	119 250
A5	6	4	144	136,5	3 316	119 250
B1	6	4	139	131,5	3 246	115 150
B2	6	4	139	131,5	3 246	115 150
B3	6	4	139	131,5	3 246	115 150
B4	6	4	139	131,5	3 246	115 150
B5	6	4	144	136,5	3 316	119 250
B6	6	4	144	136,5	3 316	119 250
D1	6	4	139	131,5	3 246	115 150
D2	6	4	139	131,5	3 246	115 150
D3	6	4	139	131,5	3 246	115 150
E1	6	4	127	121,5	3 078	105 310
E2	6	4	127	121,5	3 078	105 310
E3	6	4	127	121,5	3 078	105 310
F1	6	4	127	121,5	3 078	105 310

F2		6	4	127	121,5	3 078	105 310
F3		6	4	127	121,5	3 078	105 310
F4		6	4	127	120,7	3 078	105 310
G1		6	4	127	121,1	3 078	105 310
G2		6	4	127	121,1	3 078	105 310
G3		6	4	127	121,1	3 078	105 310
H1		6	4	136	130,7	3 204	112 690
H2		6	4	136	130,7	3 204	112 690
H3		6	4	136	130,7	3 204	112 690
H4		6	4	136	130,7	3 204	112 690

Kjøpetilbud skal sendes inn elektronisk via BankID i boligvelgeren. Prisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsel og står fritt til å forkaste ethvert bud. Det vil til enhver tid være prisen i boligvelger på nettsiden som er gjeldende.

Betaling:

10 % av kjøpesum, innbetales til meglers klientkonto senest 1 uke etter varsel om forbehold frafalt. Alle innbetalinger forutsetter at selger har stilt tilfredsstillende garanti iht. av buofl. § 12. Der kjøper er å anse som profesjonell (selskap) iht.

Bustadoppføringslova betales forskudd på 20%. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til hjemmel er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti i medhold av buofl. § 47.

Eventuelle tilleggsbestillinger/endringer betales etter nærmere avtale med selger. Resterende del av kjøpesummen betales innen kl. 16.00, 3 dager før overtakelse.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av leilighet som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.

Dokumentavgiften av tomteverdi utgjør ca. kr. 828 pr. kvm. BRA. For tinglysing av skjøte betaler kjøper tinglysningsgebyr med kr 585.-. For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr 585.- i omkostninger pr. pantedokument. Ved kjøp av parkeringsplass kan det påløper dokumentavgift 2,5% av kjøpesum. Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig myndighet.

Felleskostnader:

Kjøper plikter å betale sin andel av fellesutgiftene for Borettslaget fra overtakelse. Budsjett over fellesutgiftene stadfestes av Borettslaget på ekstraordinær generalforsamling forut for overtakelse. Fellesutgiftene består blant annet av kapitalkostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Se utkast til budsjett for borettslaget inntatt som vedlegg.

Parkering:

Det medfølger ikke parkeringsplass til leilighetene eller rekkehusene. Det er mulighet for kjøp av parkeringsplass i garasjeanlegget under leilighetsbyggene. Parkeringsplasser selges separat for kr. 570.000,- per plass. Ved kjøp av parkeringsplass tilkommer det felleskostnadr på kr. 250,- per plass per måned. Selger disponerer til enhver tid usolgte plasser.

Datert 20.02.2023
